

**TecnoRampa**  
SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

DIRECCION:  
AUTOPISTA  
MEXICO-QUERETARO  
KM 175+494 COLONIA  
EL SAUZ BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

**DESCRIPCION DEL EQUIPO:**

ELEVADOR: CREW V2

CARGA 500 KG

RECORRIDO: 6.60M

ESTACIONES: 2

VENDEDOR: ARQ. SALVADOR SILVA

RAZON SOCIAL: JOSÉ ALONSO GARCÍA RÍOS

NO. DE CLIENTE: 33456 - 27457

FECHA: 14/01/2025

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

**CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO**

CABINA: PUNTEADA

COLUMNAS: EN 2 PARTES

DIMENSIONES DE VANO:

**COLOR DEL EQUIPO**

CABINA: NEGRO

COLUMNAS: GRIS PLOMO

ACABADO: SOLITE (NEGRO ACABADO ESPEJO),  
CRISTAL CLARO

**TIPO DE ALIMENTACION**

UNIDAD HIDRÁULICA 7.2HP


TRIFÁSICA 220 VAC

TUBERIA: DELGADA

**COMPLEMENTOS**

- IMSS
- INE
- DC3
- EPP
- EXAMEN MÉDICO
- LLEVAR GENERADOR
- ANCLAJE DE PLACAS CON ESPÁRRAGOS (LLEVAR 5 JUEGOS)
- HOLGURAS REDUCIDAS ENTRE CABINA Y FOSO
- POR SEGURIDAD, EL CLIENTE DEBERÁ TENER CERRADOS LOS 3 LADOS DEL FOSO PARA PRIVAR EL ÁREA DEL ELEVADOR



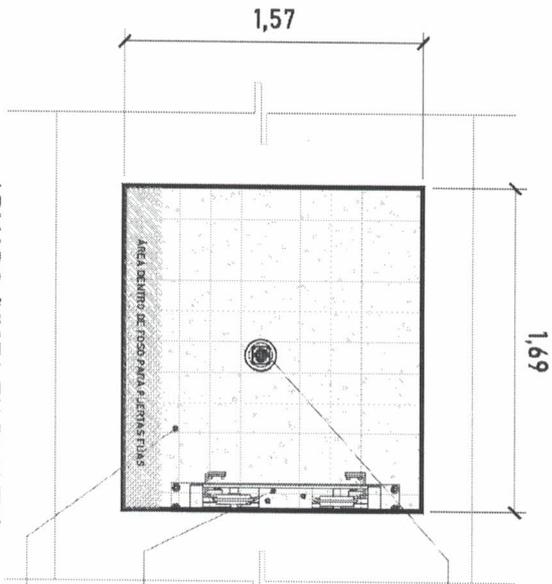


ARMADO (VISTA EN PLANTA)

Firme de concreto armado con una resistencia de  $F'C=250 \text{ kg/cm}^2$ .  
**Espesor de firme de concreto 15cm**  
 Por motivos de seguridad ante posibles acumulaciones de agua se recomienda la instalación de una salida de drenaje (coladera)


ALTURA DE COLUMNAS	
Foso	0.35m
Recorrido	6.60m
Sobre paso	3.00m
Total	9.95m

Las dimensiones del área para el elevador en este caso de 1.69m x 1.57m deberá de ser el mismo en todas las estaciones que tenga el sitio. El cliente deberá tener correctamente plomeados los 4 muros en la totalidad del cubo para la correcta instalación y funcionamiento del elevador, de no ser así, el cliente deberá realizar los ajustes necesarios para lograr los espacios solicitados y la cabina tenga un correcto funcionamiento

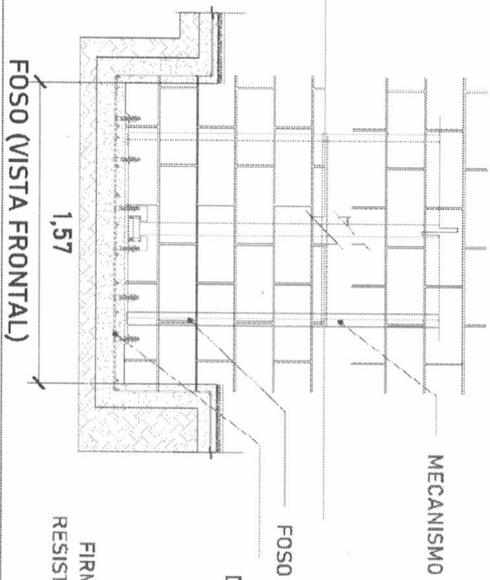

FOSO (VISTA FRONTAL)

ESPESOR DE FIRME DE CONCRETO ARMADO RESISTENCIA DE  $F'C=250 \text{ KG/CM}^2$




FOSO (VISTA LATERAL)

ALTURA MINIMA REQUERIDA EN SOBREPASO DE FOSO PARA INSTALACION

N.P.T. +6.60 m

3.50m



Comisión Federal Ejecutor-Quintana Roo

PROYECTO



NOTAS GENERALES

INSTRUMENTOS


No.	Descripción	Marca	Modelo	Fecha
1	Estación Total	Topcon	RT-102	15/05/2018
2	Teodolito	Topcon	DT-102	15/05/2018
3	Alfiler	Topcon	AL-102	15/05/2018
4	Alfiler	Topcon	AL-102	15/05/2018
5	Alfiler	Topcon	AL-102	15/05/2018
6	Alfiler	Topcon	AL-102	15/05/2018
7	Alfiler	Topcon	AL-102	15/05/2018
8	Alfiler	Topcon	AL-102	15/05/2018
9	Alfiler	Topcon	AL-102	15/05/2018
10	Alfiler	Topcon	AL-102	15/05/2018

Topcon

PROYECTO	FECHA	ESCALA	PROYECTANTE	REVISOR	APROBADO
Instalación de ascensor	15/05/2018	1:50	Juan Carlos	Juan Carlos	Juan Carlos


A-2

*[Handwritten signature]*

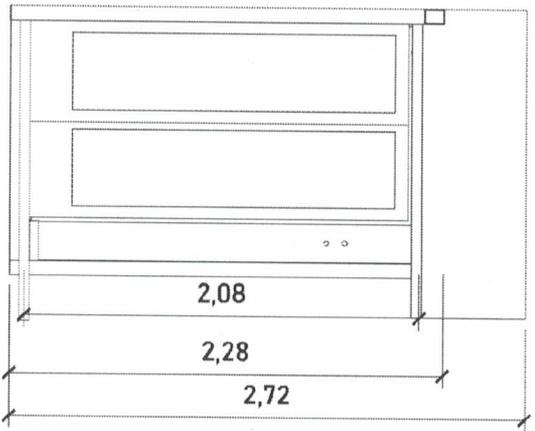


CABINA (VISTA EN FRONTAL)

ALTURAS DEL EQUIPO:	
ALTURA INT. DE CABINA	2.08 M
ALTURA DE CABINA	2.28 M
ALTURA TOTAL DE EQUIPO	2.72 M


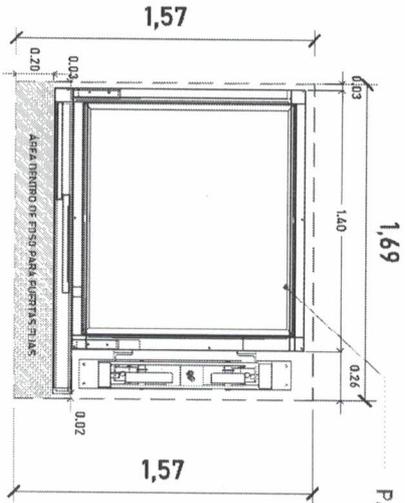


PANTALLA

DIMENSIONES DE ACCESO	
DIMENSION DE PUERTA	1.02 M
DIMENSION DE ACCESO LIBRE	0.99 M

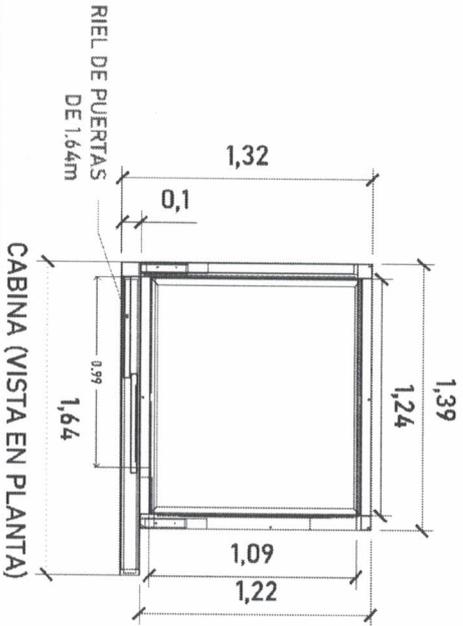


CABINA (VISTA EN PLANTA)

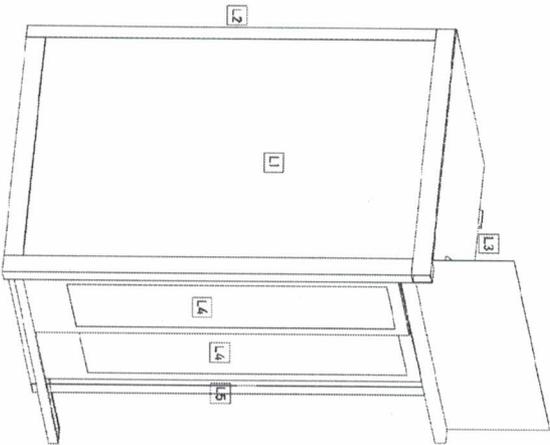

CRISTAL SOLLITE NEGRO (ESPEJO)

ACABADOS DEL EQUIPO:	
L1	CRISTAL SOLLITE NEGRO
L2	CRISTAL SOLLITE NEGRO
L3	CRISTAL SOLLITE NEGRO
L4	CRISTAL CLARO
L5	CRISTAL SOLLITE NEGRO



Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MATERIALES:			
NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD

EMPRESA: **TecnoRampas**

PROYECTO: **INSTITUCION FEDERAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS**

FECHA: **15/03/2011**

ELABORADO POR: **AS-3**

*Handwritten signature and initials in blue ink.*





