

BLVD. HIDALGO #177 A COL. CENTRO  
C.P. 76800 SAN JUAN DEL RIO, QRO.

11749

LADA SIN COSTO:  
01 800 6330 332, 01 800 8380 850  
atencionclientes@tecnorampa.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: ARO LUIS CIMA FECHA: 19 ENERO '18  
 RAZÓN SOCIAL: OMNI CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: LOPE DE VEGA #409 COL POLANCO  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: ENTRE MAZARIK Y CALLE POLANCO  
 TELÉFONO: 1295 3598 CORREO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: EDIFICIO HABITACIONAL

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO  ARMADO   
 COLUMNAS LARGAS  CORTAS   
 No. PARTES   
 EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO   
 OTRO \_\_\_\_\_  
 CONDICIONES PARA INGRESAR: LIBRE HORARIO: 8:00 A 18:00 HRS  
 DOCUMENTOS: IFE OTROS \_\_\_\_\_

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 60 %  
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DOS ACCESOS 5 TON

CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA  
 CARGA  CAMILLAS  MEDIA 1.10 M  ELEVACIÓN 4.00 m  
 DISCAPACITADOS  TIJERA  SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M)  ESTACIONES DOS  
 AUTOS  UNDER RAMP  COMPLETA 2.10 M  CAPACIDAD DE CARGA 5000 K  
 UNIDAD HIDRÁULICA 20 HP

DIMENSIÓN DE FOSO: 5.84m ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM   
 LARGO 3.30 m ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM   
 ANCHO 0.45m ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM   
 PROFUNDIDAD 0.45m DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 5.64 ANCHO 2.50m

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA DOS GUILLOTINAS / DOS ACCESOS EN AMBOS PISOS

TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR:

CLIENTE: SI  NO   
 FOSO    
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA    
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS    
 TECNORAMPA GUÍA MECÁNICA   
 SOLICITUDES ADICIONALES \_\_\_\_\_

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
 TUBERÍA SI  TUBERÍA  PARED DELGADA   
 NO  CANALETA  GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 INSTALADA  NO INSTALADA  OTRO \_\_\_\_\_

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

ARO LUIS CIMA

ACCESORIOS EXTRAS COSTO   
 ACEPTO COSTO ADICIONAL \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_ FECHA DE TÉRMINO \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

ACABADO DEL ELEVADOR

COLORES DE LINEA / NEGRO-GRIS PLOMO CRISTAL  
 BLANCO  SILVER METALLIC  METAL DESPLEGADO  CLARO   
 AZUL / GRIS  PANTONE  CÓDIGO \_\_\_\_\_ LÁMINA PINTRO  TINTEX   
 AZUL / BLANCO  ALUCOBOND COLOR  OTRO \_\_\_\_\_ ESMERILADO

SOLICITUD ADICIONAL: \_\_\_\_\_

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

LUIS F VILLAE.  
 TECNORAMPA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

**NOTA:**

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCION AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.


**NOTA:**

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.


OBSERVACIONES GENERALES: ADJUNTO PLANTA DE FOSO POR ZAPATAS ESTRUCTURALES

**DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN**

110 V  220V  GENERADOR

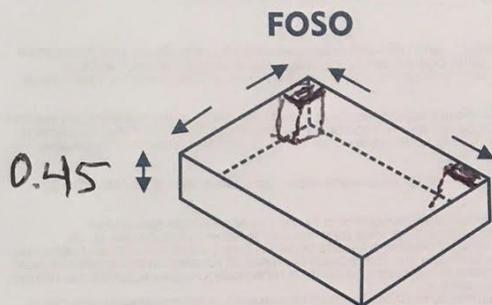

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

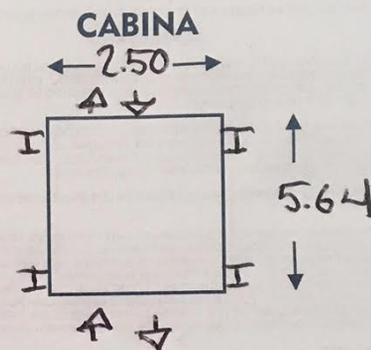

**BOTONERAS**

PEDESTAL


SOBREPUESTAS

DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 5.00m.

EMPOTRADAS

CANALIZADAS POR TECNORAMPA



EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

LUIS F. VILLA F.  
TECNORAMPA

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

