

BLVD. HIDALGO #177 A COL. CENTRO  
C.P. 76800 SAN JUAN DEL RIO, QRO.

LADA SIN COSTO:  
01 800 6330 332, 01 800 8380 850  
atencionclientes@tecnorampa.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: Juan Carlos Yañez FECHA: 14-02-17  
 RAZÓN SOCIAL: Centro de Investigación y desarrollo, Tecnológico  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Parque Tecnológico S/A San Fernando CP. 76703  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: CIDETEG municipio Pedro escobedo QRO  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_ CORREO: 11812

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: \_\_\_\_\_

ACCESO DE EQUIPO  DESARMADO  ARMADO   
 COLUMNAS  LARGAS  CORTAS   
 No. PARTES  EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL  
 ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO   
 OTRO GUANTES.  
 CONDICIONES PARA INGRESAR: Permiso de Trabajo HORARIO: \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTOS: Imss Impresa OTROS \_\_\_\_\_  
 AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 80 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: \_\_\_\_\_

**CLASIFICACIÓN**  CARGA  CAMILLAS   
 DISCAPACITADOS  TIJERA   
 AUTOS  UNDER RAMP   
**TIPO DE CABINA**  MEDIA 1.10 M   
 SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M)   
 COMPLETA 2.10 M   
 ELEVACIÓN 4.23  
 ESTACIONES 2  
 CAPACIDAD DE CARGA 500  
 UNIDAD HIDRÁULICA 5HP  
 DIMENSIÓN DE FOSO: 2.77 LARGO   
2.54 ANCHO   
 PROFUNDIDAD \_\_\_\_\_   
 ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM   
 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM   
 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM   
 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 2.57 ANCHO 1.80

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA \_\_\_\_\_

**TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR:**

**CLIENTE:** SI NO **TECNORAMPA**  
 FOSO   GUÍA MECÁNICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA   SOLICITUDES ADICIONALES \_\_\_\_\_  
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

**ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA**

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
**TUBERÍA** SI  TUBERÍA  PARED DELGADA   
 NO  CANALETA  GRUESA

**ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA**  
 INSTALADA  NO INSTALADA  OTRO \_\_\_\_\_  
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO   
 ACEPTO COSTO ADICIONAL \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_ FECHA DE TÉRMINO \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**ACABADO DEL ELEVADOR**

**COLORES** BLANCO  SILVER METALLIC  METAL DESPLEGADO   
 AZUL / GRIS  PANTONE  CÓDIGO \_\_\_\_\_ LÁMINA PINTRO   
 AZUL / BLANCO  ALUCOBOND COLOR  OTRO \_\_\_\_\_ ESMERILADO   
 SOLICITUD ADICIONAL: \_\_\_\_\_

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

Dr. Salvador Silva S.  
TECNORAMPA

[Firma]  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

**NOTA:**

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCION AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

**NOTA:**

REVISÉ Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICION DEL CLIENTE.

**OBSERVACIONES GENERALES:**

Ligar a estructura de acero del cliente, Realizar nicho de Unidad H. colocar Puertas de cliente (fabricar)


**DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN**

110 V


220V

GENERADOR

**FOSO**

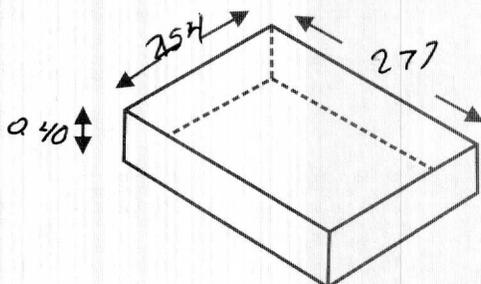

**CABINA**

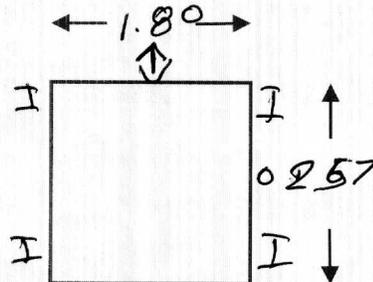

**INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA**

**BOTONERAS**

PEDESTAL


EMPOTRADAS

SOBREPUESTAS

CANALIZADAS POR TECNORAMPA

DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 5 mts.



**EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEдан RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:**

**NOTA:**

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

**ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR**

Arq. Salvador Silva S.  
TECNORAMPA

Juliana Mejía Z.  
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
