

BLVD. HIDALGO #177 A COL. CENTRO  
C.P. 76800 SAN JUAN DEL RIO, QRO.

LADA SIN COSTO:  
01 800 6330 332, 01 800 8380 850  
atencionclientes@tecnorampa.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: Julio Villareal. FECHA: 06/02/2017.  
 RAZÓN SOCIAL: Inversiones Holona del Norte.  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: 5/instalación solo se preparara para exportación.  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_ CORREO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: \_\_\_\_\_

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO  ARMADO  EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL  
 COLUMNAS LARGAS  CORTAS  ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO   
 No. PARTES  OTRO \_\_\_\_\_  
 CONDICIONES PARA INGRESAR: \_\_\_\_\_ HORARIO: \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTOS: \_\_\_\_\_ OTROS \_\_\_\_\_

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: \_\_\_\_\_ %  
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Elevador cabina semicompleta preparado para exportar.

**CLASIFICACIÓN** **TIPO DE CABINA**  
 CARGA  CAMILLAS  MEDIA 1.10 M  ELEVACIÓN 3.47m.  
 DISCAPACITADOS  TIJERA  SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M)  ESTACIONES 2 est.  
 AUTOS  UNDER RAMP  COMPLETA 2.10 M  CAPACIDAD DE CARGA 500kg.  
 UNIDAD HIDRÁULICA 2 Hp.

**DIMENSIÓN DE FOSO:** **ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM**   
 LARGO 1.60m. **ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM**   
 ANCHO 1.85m **ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM**   
 PROFUNDIDAD 0.20m **DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.40m ANCHO 1.40m**

**NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA**

COMPONENTES EXTRA Incluir panel de seguridad amortiguadores y brayle

**TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR:**

**CLIENTE:** SI NO **TECNORAMPA**  
 FOSO   GUÍA MECÁNICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA   SOLICITUDES ADICIONALES \_\_\_\_\_  
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

**ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA**

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
**TUBERÍA** SI  TUBERÍA  PARED DELGADA   
 NO  CANALETA  GRUESA

**ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

INSTALADA  NO INSTALADA  OTRO \_\_\_\_\_  
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO   
 ACEPTO COSTO ADICIONAL \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_ FECHA DE TÉRMINO \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA**

**ACABADO DEL ELEVADOR**

**COLORES** BLANCO  SILVER METALLIC  METAL DESPLEGADO   
 AZUL / GRIS  PANTONE  CÓDIGO \_\_\_\_\_ LÁMINA PINTRO   
 AZUL / BLANCO  ALUCOBOND COLOR  OTRO \_\_\_\_\_  
**CRISTAL** CLARO   
 SOLICITUD ADICIONAL: \_\_\_\_\_ TINTEX   
 ESMERILADO

**ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR**

**NOTA:**

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCION AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

**NOTA:**



REVISÉ Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICION DEL CLIENTE.

**OBSERVACIONES GENERALES:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN**

110 V       220V       GENERADOR

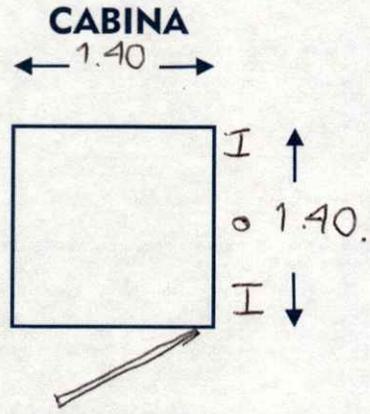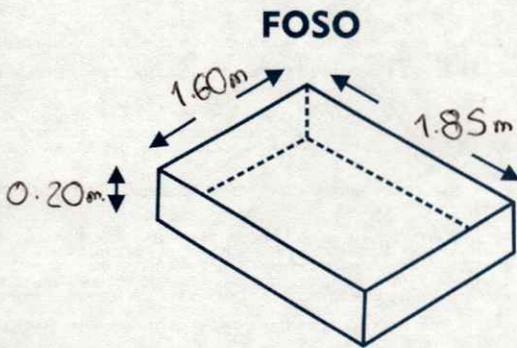

**INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA**


**BOTONERAS**

PEDESTAL  2 pza.       EMPOTRADAS

SOBREPUESTAS        CANALIZADAS POR TECNORAMPA

DISTANCIA APROXIMADA \_\_\_\_\_

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA \_\_\_\_\_



**EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**NOTA:**

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

**ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR**

TECNORAMPA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
