

BLVD. HIDALGO #177 A COL. CENTRO  
C.P. 76800 SAN JUAN DEL RIO, QRO.

LADA SIN COSTO:  
01 800 6330 332, 01 800 8380 850  
atencionclientes@tecnorampa.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: Jolio Cesar Lara FECHA: 09/10/2018  
 RAZÓN SOCIAL: Calificación y ventilación S.A. de C.V.  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Planta Climaflex, Av. Central 283, paradero  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: WTC, La Pila, San Luis Potosí.  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_ CORREO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: Acceso por andamios, Andén 1/2 SS m (Arriba)  
3.05m (alto) Grúa 4.15m ancho x 4.50 Alto

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO  ARMADO  \*Verificar  
 COLUMNAS LARGAS  CORTAS  EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL  
 ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO   
 No. PARTES  OTRO \_\_\_\_\_

CONDICIONES PARA INGRESAR: Acceso complicada HORARIO: 8:00 am - 6:00 pm  
 DOCUMENTOS: IMSS / DC3 trabajos en altura OTROS \_\_\_\_\_

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 0 %  
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Elevador de carga 2000Kg 2 estaciones

CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA  
 CARGA  CAMILLAS  MEDIA 1.10 M   
 DISCAPACITADOS  TIJERA  SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M)   
 AUTOS  UNDER RAMP  COMPLETA 2.10 M   
 ELEVACIÓN 3.76m  
 ESTACIONES 3 est  
 CAPACIDAD DE CARGA 2000Kg  
 UNIDAD HIDRÁULICA 10HP

DIMENSIÓN DE FOSO:  
 LARGO 3.30m  
 ANCHO 4.30m  
 PROFUNDIDAD 0.60m  
 ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM   
 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM   
 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM   
 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 3.10m ANCHO 3.50m

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA \_\_\_\_\_

TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR:

CLIENTE: SI NO  
 FOSO    
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA    
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS    
 TECNORAMPA  
 GUÍA MECÁNICA   
 SOLICITUDES ADICIONALES \_\_\_\_\_

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
 TUBERÍA SI  TUBERÍA  PARED DELGADA   
 NO  CANALETA  GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 INSTALADA  NO INSTALADA  OTRO \_\_\_\_\_  
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO   
 ACEPTO COSTO ADICIONAL \_\_\_\_\_

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_ FECHA DE TÉRMINO \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

ACABADO DEL ELEVADOR\*

COLORES BLANCO  SILVER METALLIC  METAL DESPLEGADO  CRISTAL CLARO   
 AZUL / GRIS  PANTONE  CÓDIGO \_\_\_\_\_ LÁMINA PINTRO  TINTEX   
 AZUL / BLANCO  ALUCOBOND COLOR  OTRO \_\_\_\_\_ ESMERILADO

SOLICITUD ADICIONAL: \_\_\_\_\_

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

Arq. Mariana Olvera  
 TECNORAMPA

JOLIO CESAR LARA  
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

**NOTA:**

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCION AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

**NOTA:**


REVISÉ Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICION DEL CLIENTE.

**OBSERVACIONES GENERALES:** \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN**

110 V       220V       GENERADOR

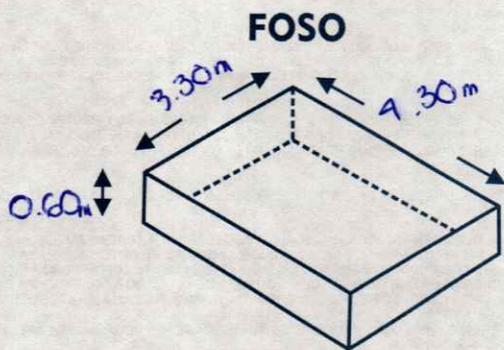

**INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA**

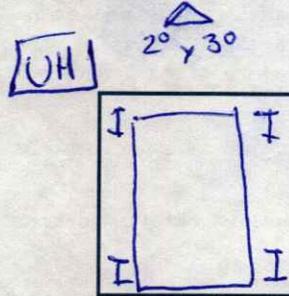

**BOTONERAS**

PEDESTAL        EMPOTRADAS  
 SOBREPUESTAS        CANALIZADAS POR TECNORAMPA  
 DISTANCIA APROXIMADA  
 ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 3.00m

**EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**NOTA:**

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

Arq. Mariana Olvera  
 TECNORAMPA

Julio Cesar Larrea Capuciano  
 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
