

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO
 Km 175 • 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO
 TEC080710M22
 Tels. 01(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecorampa.com.mx
 0142772728119
 LADA SIN COSTO:
 018006230332

NOMBRE DEL CLIENTE: Servicios Constructivos y de Mantenimiento S.A. 12109118
 RAZÓN SOCIAL: Servicios Constructivos y de Mantenimiento S.A. de C.V.
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Carretera a las Lajas Km 1 Col. Fidel Velazquez
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: Matehuala, San Luis Potosí
 TELÉFONO: 4888823132 CORREO: _____

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: Planta Interceptora de México

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO
 COLUMNAS LARGAS CORTAS EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
 No. PARTES ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
 OTRO _____

CONDICIONES PARA INGRESAR: Identificación Empresa
 DOCUMENTOS: Identificación Empresa

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 20 %
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Elevador de Carga, 2,500kg, 2 estaciones

CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA
 CARGA CAMILLAS MEDIDA 1.10M
 DISCAPACITADOS TIJERAS SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10M)
 AUTOS UNDER RAMP COMPLETA 2.10M
 ELEVACIÓN 3.95m 19'6"
 ESTACIONES 2 est
 CAPACIDAD DE CARGA 2,500kg
 UNIDAD HIDRÁULICA 10hp

DIMENSIÓN DE FOSO:
 LARGO 2.66m
 ANCHO 2.40m
 PROFUNDIDAD 0.95m
 ELEVADORES DE TIJERA, 45CM
 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM
 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM
 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.86 ANCHO 2.20

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA _____

TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:

CLIENTE: SI NO
 FOSO
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS
 TECNORAMPA
 GUÍA MECÁNICA
 SOLICITUDES ADICIONALES _____

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 TUBERÍA PARED
 SI TUBERÍA DELGADA
 NO CANALETA GRUESA

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA _____

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA NO INSTALADA
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: _____

*Pendiente NOMBRE Y FIRMA _____ FECHA DE TÉRMINO _____ FIRMA _____

ACABADO DE ELEVADOR
 COLORES: BLANCO SILVER METALLIC METAL DESPLEGADO
 AZUL/GRIS PANTONE LÁMINA PINTOR
 AZUL/BLANCO ALUCOBOND COLOR OTRO _____
 CRISTAL: CLARO
 TINTEX
 ESMERILADO
 SOLICITUD ADICIONAL: _____

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

Luis Artega TECNORAMPA NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE [Firma]



SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO
PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIR LOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE
DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA
REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY
CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE
PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.


OBSERVACIONES GENERALES: _____

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN

110 V 220 V GENERADOR

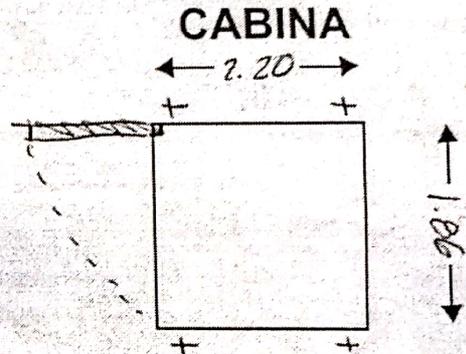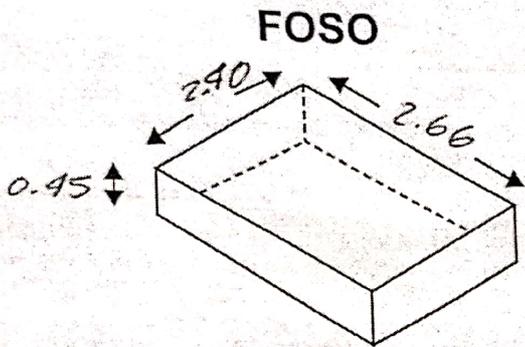

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

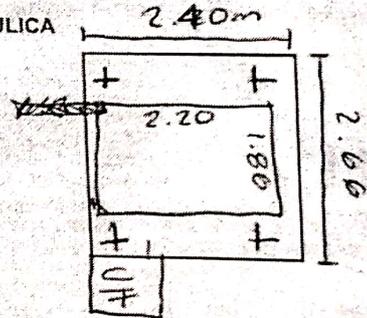

BOTONERAS

- PEDESTAL
- SOBREPUESTAS
- DISTANCIA APROXIMADA
- ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 2m
- EMPOTRADAS
- CANALIZADAS POR TECNORAMPA

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y
TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

Arg. Francisco

NOTA:
PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL
ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE
ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO.
CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: _____ TELÉFONO 1): _____
CONTACTO 2): _____ TELÉFONO 2): _____

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

Los Andes
TECNORAMPA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
