

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO  
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO  
 TEC080710M22  
 Tels.: 01(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecnorampa.com.mx  
 0142772728119  
 LADA SIN COSTO:  
 018006230332

15830/8936

NOMBRE DEL CLIENTE: Ara. bse Alejandro Olvera Rosendiz FECHA: 09-01-18  
 RAZÓN SOCIAL: Grupo Ciyah  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Pueblo Nuevo s/n. San Juan del Rio  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: Queretaro / Oficinas del Panal  
 TELÉFONO: 442 595 8323 CORREO: alejandro.olvera@grupociyah.com

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: Ambos de aproximadamente 1.60

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO  ARMADO  EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL  
 COLUMNAS LARGAS  CORTAS  ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO   
 No. PARTES

CONDICIONES PARA INGRESAR: Un día antes se informara ingreso de TecnoRampa  
 DOCUMENTOS: con horario de 8am a 6pm negociable.

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 10%  
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Elevador cabina semicompleta.

CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA  
 CARGA  CAMILLAS  MEDIDA 1.10M  ELEVACIÓN 3.25  
 DISCAPACITADOS  TIJERAS  SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10M)  ESTACIONES 2  
 AUTOS  UNDER RAMP  COMPLETA 2.10M  CAPACIDAD DE CARGA 500 Kg  
 UNIDAD HIDRÁULICA 2 HP

DIMENSIÓN DE FOSO:  
 LARGO 1.75  
 ANCHO 1.49  
 PROFUNDIDAD \_\_\_\_\_  
 ELEVADORES DE TIJERA, 45CM   
 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM   
 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM   
 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.30 ANCHO 1.29

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA \_\_\_\_\_ TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:

CLIENTE: SI NO  
 FOSO    
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA    
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS    
 TECNORAMPA  
 GUÍA MECÁNICA   
 SOLICITUDES ADICIONALES \_\_\_\_\_

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
 TUBERÍA PARED  
 SI  TUBERÍA  DELGADA   
 NO  CANALETA  GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 INSTALADA  NO INSTALADA   
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO   
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: \_\_\_\_\_  
 RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA  
 NOMBRE Y FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE TÉRMINO: 01-03-19  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

ACABADO DE ELEVADOR  
 COLORES: BLANCO  SILVER METALLIC   
 AZUL/GRIS  PANTONE  CÓDIGO \_\_\_\_\_  
 AZUL/BLANCO  ALUCOBOND COLOR   
 METAL DESPLEGADO  CRISTAL CLARO   
 LÁMINA PINTOR  TINTEX   
 OTRO \_\_\_\_\_ ESMERILADO

SOLICITUD ADICIONAL: \_\_\_\_\_  
 ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR  
 TECNORAMPA  
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE: Jose Alejandro Olvera



DRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO  
EVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIR LOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE  
ALGÚN RECLAMO FUTURO.

**NOTA**  
REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY  
CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE  
PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

**OBSERVACIONES GENERALES:** El cliente ajustara traba de foso a paño  
de losa e informara a tecnorampa si rallano o deja libre la  
distancia de foso. El cliente cubrira espacio o nicho de UH  
Tecnorampa debara cubrir un espacio aproximado de 20m<sup>2</sup>  
ya que se colocara piso vinilico.

**DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN**

- 110 V
- 220 V
- GENERADOR

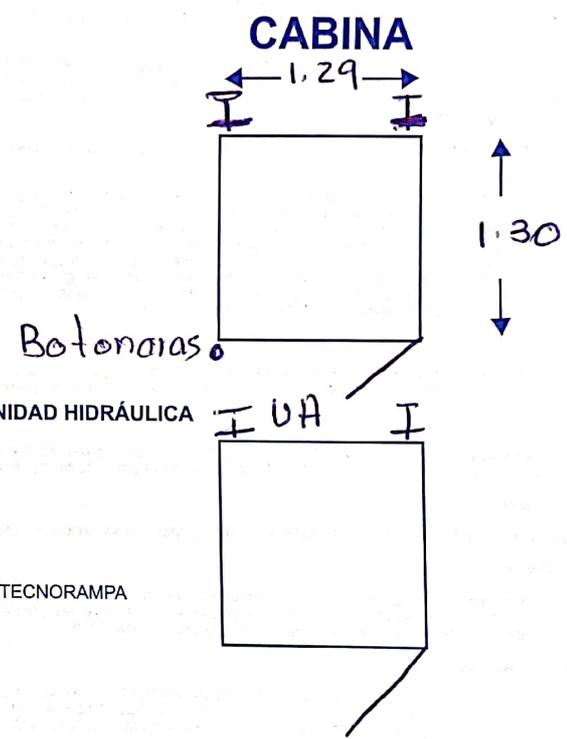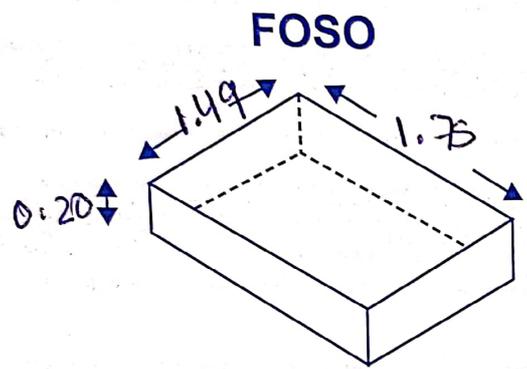

**INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA**

- BOTONERAS**
- PEDESTAL
  - SOBREPUESTAS
  - DISTANCIA APROXIMADA
  - ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 5 m d.
  - EMPOTRADAS
  - CANALIZADAS POR TECNORAMPA

**EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:**

**NOTA:**  
PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL  
ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE  
ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO.  
CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

**PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO**

NOMBRE: Ing. bsc. Alejandro Olvera TELÉFONO 1): 442 595 8323

CONTACTO 2): Ing. Hector Lopez TELÉFONO 2): 442 595 8322

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

[Signature]  
TECNORAMPA

[Signature]  
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
