

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO  
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO  
 TEC080710M22  
 Tels.: (427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecnorampa.com.mx  
 4272728119  
 LADA SIN COSTO:  
 800 623 0332

Nº 20226

NOMBRE DEL CLIENTE: ARQ CAROLINA VILLALBA FECHA: 19. ENF. 2022  
 RAZÓN SOCIAL: ANTONIO BOURS SCHEIDT  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CARRERA DEL CAIBETI SUR, LOTE 12 - MANZANA 6B  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: TREN LOS LANOS RESIDENCIAL, HERMOSILLO SONORA.  
 TELÉFONO: 662 2762414 CORREO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: RESIDENCIAL, FRANCISQUINO PRIVADO.

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO  ARMADO  EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL  
 COLUMNAS LARGAS  CORTAS  ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO   
 No. PARTES  OTRO \_\_\_\_\_  
 CONDICIONES PARA INGRESAR: LINE - HORARIO DE TRABAJO 8:00 a 5:00 pm  
 DOCUMENTOS: \_\_\_\_\_

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 50 %  
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: ELEVADOR DE AUTOS TIPO PLATAFORMA.

CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA  
 CARGA  CAMILLAS  MEDIDA 1.10 M  ELEVACIÓN 3.20  
 DISCAPACITADOS  TIJERAS  SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M)  ESTACIONES 2  
 AUTOS  UNDER RAMP  COMPLETA 2.10 M  CAPACIDAD DE CARGA 3500kg  
 UNIDAD HIDRÁULICA 10 HP.

DIMENSIÓN DE FOSO: ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM   
 LARGO 6.00 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM   
 ANCHO 3.30 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM   
 PROFUNDIDAD .60 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 5.80 ANCHO 2.60

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM<sup>2</sup>. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA  
 COMPONENTES EXTRA BOTONERA CON SENSOR DE TARJETA Y MOTOR 10 HP. BIFÁSICO  
 TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR: \_\_\_\_\_

CLIENTE: SI NO TECNORAMPA  
 FOSO   GUÍA MECÁNICA  EN PROCESO  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA   SOLICITUDES ADICIONALES \_\_\_\_\_  
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

### ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA TUBERÍA PARED  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA EXTRA SI  TUBERÍA  DELGADA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA NO  CANALETA  GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA  
 INSTALADA  NO INSTALADA   
 ACCESORIOS EXTRAS COSTOS   
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA FECHA DE TÉRMINO FIRMA

### ACABADO DE ELEVADOR

COLORES EQUIPO DE LÍNEA. CRISTAL  
 BLANCO  SILVER METALLIC  METAL DESPLEGADO  CLARO   
 AZUL/GRIS  PANTONE  LÁMINA PINTOR  TINTEX   
 AZUL/BLANCO  ALUCOBOND COLOR  OTRO \_\_\_\_\_ ESMERIZADO   
 SOLICITUD ADICIONAL: \_\_\_\_\_

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR  
ARQ CAROLINA VILLALBA TECNORAMPA [Firma] NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOTA

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.



NOTA

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: -EL EQUIPO LLEVÓ MOTOR 220 BIFÁSICO A 10 HP. // CON SENSOR PARA ACTIVACION DE EQUIPO.

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN

110 V  220 V  GENERADOR

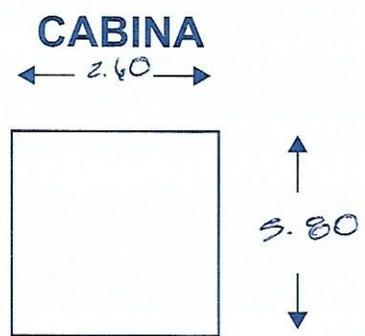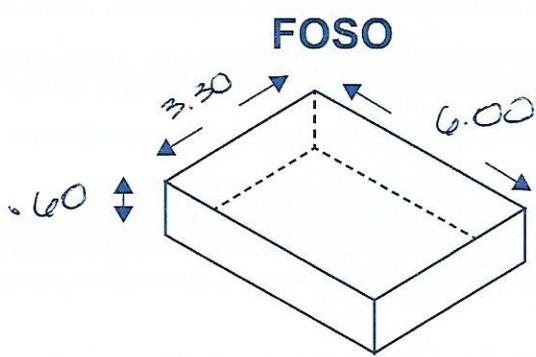


INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

BOTONERAS

PEDESTAL  SOBREPUESTAS  EMPOTRADAS  CANALIZADAS POR TECNORAMPA

DISTANCIA APROXIMADA 4.00.  
ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 10 HP. BIFÁSICO.

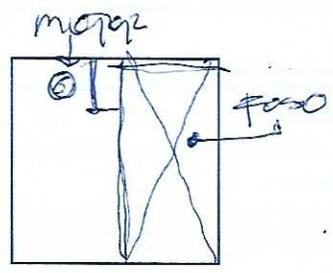

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

APD CAROLINA VILLALBA  
JOEL ZAVALA GUTIERREZ

NOTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: APD CAROLINA VILLALBA TELÉFONO 1): 662 276 24 14.  
CONTACTO 2): JOEL ZAVALA GUTIERREZ TELÉFONO 2): 662 571234

APD JESÚS A. BENÍTEZ.  
TECNORAMPA

[Signature]  
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR
