


 CLIENTE: Oscar Garcia # \_\_\_\_\_

RAZÓN SOCIAL \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_ CORREO \_\_\_\_\_

 DIRECCIÓN: Gro

Accesibilidad a la zona de trabajo \_\_\_\_\_

Requerimientos especiales: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Reglamento de ingreso: \_\_\_\_\_ Horario: \_\_\_\_\_

Documentos: \_\_\_\_\_ Otros: \_\_\_\_\_

 Equipo a suministrar: Rampa \_\_\_\_\_ Elevador ✓ Cantidad 1 Cap. Carga 500kg U. Hidraulica 2 HP

Equipo Especial \_\_\_\_\_

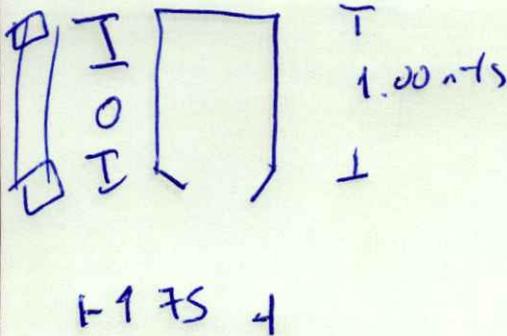

RAMPA CARACTERÍSTICAS				ELEVADOR CARACTERÍSTICAS					
PARKING LIFT	ALT ELEVACIÓN	ANDÉN	CLASIFICACIÓN	TIPO DE CABINA	APERTURA	<u>N</u>	90	180	
TR EVOLUTION		NIV HIDRA / HD	CARGA	MED / SEMI	ESTACIONES	<u>2</u>			
HEAVY DUTY	H. LIBRE	NIV MECÁNICA	DISCA <u>✓</u>	CREW V1/V2	ALT ELEVACIÓN	<u>3.00 m</u>			
TR ONE		RHINO TI / TI HD	AUTOS	FULL VOX / VOX EVO	DIMENSIONES CABINA INTERIOR				
DIMENSIONES DE PLATAFORMA			TALLER	CAMILLAS	VOX PLATAFORMA				
1.9 X 3.75	2.00 X 3.75	2 POST / HD	TIJERAS	FOSO					
2.10 X 3.75	1.90 X 3.50	PORTERIA	UNDERRAMP	0.2	0.3	0.45	0.6		
2.00 X 3.50	2.1 X 3.50	FRENERA	ESPECIAL	L= <u>175</u> A= <u>100</u>		L= <u>130cm</u> A= <u>80cm</u>			
Características especiales: _____									
Condicionantes y dimensiones de acceso: _____									
Requerimiento estructural (Firme o foso) : Firme de concreto de 15 cm de espesor con resistencia de 250Kg/cm2. con malla electrosoldada 6/6,10-10									
Componentes Adicionales: _____									
TRABAJO A REALIZAR									
CLIENTE	SI	NO	TECNO RAMPA						
FIRME			GUÍA MECÁNICA						
INSTALACIÓN ELÉCTRICA:			SOLICITUDES ADICIONALES						
ELEMENTOS DE FIJACIÓN:									
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA									
UNIDAD HIDRÁULICA	<u>2</u>	3	5	10	15	20	ESP <u>2</u>	HP	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFASICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA				<u>✓</u>	INSTALADA	NO INSTALADA	ACCESORIO EXTRA		
INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NETURO Y TIERRA FÍSICA					TIPO	TUBERÍA <u>✓</u>	CANALETA		
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NUETRO Y TIERRA FÍSICA					ESPESOR	DELGADA <u>✓</u>	GRUESA		
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: _____									
ACEPTO COSTO ADICIONAL (NOMBRE Y FIRMA): _____									
RESPONSABLE OBRA ELÉCTRICA (NOMBRE Y FIRMA) _____									
ACABADOS RAMPAS / ELEVADORES									
PINTURA			PINTURA			PAREDES INTERIORES		CRISTAL	
COLORES DE LINEA	ROJO	GRIS	NEGRO	DE LÍNEA	BLANCO <u>✓</u>	CROMO	ALUCOBOND	CLARO <u>✓</u>	
PLATAFORMA				Cod.	SILVER MENT	COLOR ESPECIAL	METAL DESPLAGADO	TINTEX	
COLUMNAS				Cod.	NEGRO		LAMINA PERFORADA	ESMERILADO	
SOLICITUD ADICIONAL _____									
ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR									



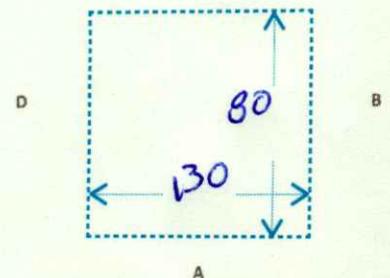

NOTA: SE PODRÁN INSTALAR CONTROLADORES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA: REVISÉ Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

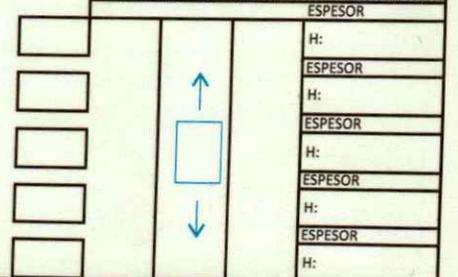
Observaciones generales *Planta baja Pedestal Planta Alta empotrada*  
*Estructura después de los 3.00mts*

**DETALLE GRÁFICO**

**ELEVADORES / RAMPAS NIVELADORAS FOSO**


CABINA	
TIPO DE PTA:	APERTURA:
CABINA	ARMADA      DESARMADA


**ISOMÉTRICO CRISTALES**
**TIPO DE ANCLAJE**


- ESTRUCTURA
- CADENAS
- PLACA
- PLACA CON ESPARRAGOS

**ACCESOS POR NIVEL**


NOTA: ESPECIFICAR APERTURA DE PUERTAS EN ELEVADOR, ESQUEMA DE TRAYECTORIA DE CONEXIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA.

**ISOMÉTRICO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA**
**RAMPA**
**ELEVADOR**

ÁREA	TIPO DE CONEXIÓN	BOTONERAS	
MURO	DISPARO	PEDESTAL	CANALIZADA POR TECNORAMPA
PISO	CLAVIJA (Por Cliente)	SOBREPUESTA	EMPOTRADAS
DIST. DE CABLE 4 X 12		EMPOTRADAS	ELECTRO IMANES

**EXTRAS:**

NOTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y LA ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONA ASIGNADA PARA RECEPCIÓN DEL EQUIPO:	1.-	TEL:
	2.-	TEL:
