


 CLIENTE: **OBH ELCI** # \_\_\_\_\_

 RAZÓN SOCIAL: **30627**

TEL: \_\_\_\_\_ CORREO \_\_\_\_\_

 DIRECCIÓN: **Plant. Bimbo, Puebla**

Accesibilidad a la zona de trabajo \_\_\_\_\_

Requerimientos especiales: \_\_\_\_\_

Reglamento de ingreso: \_\_\_\_\_

Documentos: \_\_\_\_\_

 Equipo a suministrar: Rampa  Elevador  Cantidad **1** Cap. Carga **500kg** U. Hidraulica **7.2HP**

Equipo Especial \_\_\_\_\_

**RAMPA CARACTERÍSTICAS**
**ELEVADOR CARACTERÍSTICAS**

PARKING LIFT	ALT ELEVACIÓN	ANDÉN	CLASIFICACIÓN	TIPO DE CABINA	APERTURA	<input checked="" type="radio"/> N	<input type="radio"/> 90	<input type="radio"/> 180
--------------	---------------	-------	---------------	----------------	----------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------

TR EVOLUTION		NIV HIDRA / HD	CARGA	MED / SEMI	ESTACIONES	<b>2</b>
--------------	--	----------------	-------	------------	------------	----------

HEAVY DUTY	H. LIBRE	NIV MECÁNICA	DISCA <input checked="" type="checkbox"/>	CREW V1/V2	ALT ELEVACIÓN	<b>3.75</b>
------------	----------	--------------	---	------------	---------------	-------------

TR ONE		RHINO TI / TI HD	AUTOS	FULL VOX / VOX EVO	DIMENSIONES CABINA INTERIOR
--------	--	------------------	-------	--------------------	-----------------------------

DIMENSIONES DE PLATAFORMA		TALLER		CAMILLAS	VOX PLATAFORMA
---------------------------	--	--------	--	----------	----------------

1.9 X 3.75	2.00 X 3.75	2 POST / HD	TIJERAS	FOSO			
------------	-------------	-------------	---------	------	--	--	--

2.10 X 3.75	1.90 X 3.50	PORTERIA	UNDERRAMP	0.2	0.35	0.45	0.6
-------------	-------------	----------	-----------	-----	------	------	-----

2.00 X 3.50	2.1 X 3.50	FRENERA	ESPECIAL	L=175	A=175	P=35	L=125	A=125
-------------	------------	---------	----------	-------	-------	------	-------	-------

Características especiales: \_\_\_\_\_

Condicionantes y dimensiones de acceso: \_\_\_\_\_

**Requerimiento estructural (Firme o foso): Firme de concreto de 15 cm de espesor con resistencia de 250Kg/cm2. con malla electrosoldada 6/6,10-10**

Componentes Adicionales: \_\_\_\_\_

**TRABAJOS A REALIZAR**

CLIENTE	SI	NO	TECNO RAMPA
---------	----	----	-------------

FIRME	FOSO	GUÍA MECÁNICA
-------	------	---------------

INSTALACIÓN ELÉCTRICA:	SOLICITUDES ADICIONALES
------------------------	-------------------------

ELEMENTOS DE FIJACIÓN:	
------------------------	--

**ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA**

UNIDAD HIDRÁULICA	2	3	5	10	15	20	ESP <b>7.2</b> HP	ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
-------------------	---	---	---	----	----	----	-------------------	------------------------------------	--	--

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFASICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA	INSTALADA	NO INSTALADA	ACCESORIO EXTRA
---	-----------	--------------	-----------------

INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NETURO Y TIERRA FÍSICA	TIPO	TUBERÍA	CANALETA
---	------	---------	----------

INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NUETRO Y TIERRA FÍSICA	ESPESOR	DELGADA	GRUESA
--	---------	---------	--------

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: \_\_\_\_\_

ACEPTO COSTO ADICIONAL (NOMBRE Y FIRMA): \_\_\_\_\_

RESPONSABLE OBRA ELÉCTRICA (NOMBRE Y FIRMA) \_\_\_\_\_

**ACABADOS RAMPAS / ELEVADORES**

PINTURA				PINTURA				PAREDES INTERIORES		CRISTAL
---------	--	--	--	---------	--	--	--	--------------------	--	---------

COLORES DE LINEA	ROJO	GRIS	NEGRO	DE LÍNEA	BLANCO	CROMO	ALUCOBOND		CLARO
------------------	------	------	-------	----------	--------	-------	-----------	--	-------

PLATAFORMA				Cod. <b>SILVER MENT</b>	COLOR ESPECIAL		METAL DESPLAGADO	TINTEX
------------	--	--	--	-------------------------	----------------	--	------------------	--------

COLUMNAS				Cod. <b>NEGRO</b>	Cod.		LAMINA PERFORADA	ESMERILADO
----------	--	--	--	-------------------	------	--	------------------	------------

SOLICITUD ADICIONAL \_\_\_\_\_

**ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR**

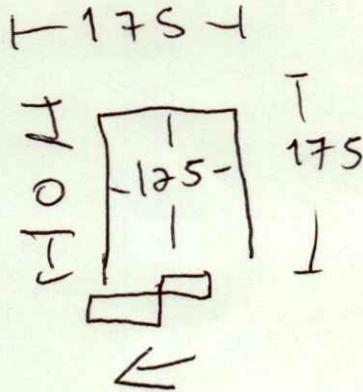

TECNO RAMPA



NOTA: SE PODRÁN INSTALAR CONTROLADORES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

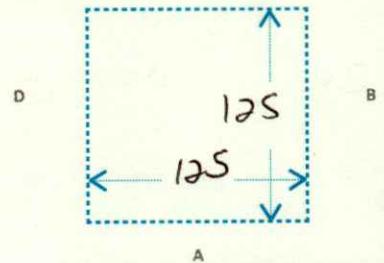

NOTA: REVISÉ Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

Observaciones generales *Seguridad Industrial*  
*Puertas fijas instaladas por TR*

**DETALLE GRÁFICO**

**ELEVADORES / RAMPAS NIVELADORAS FOSO**


CABINA	
TIPO DE PIA:	APERTURA:
CABINA	ARMADA <input type="checkbox"/> DESARMADA <input checked="" type="checkbox"/>

2 partes


**ISOMÉTRICO CRISTALES**

**TIPO DE ANCLAJE**

- ESTRUCTURA
- CADENAS
- PLACA
- PLACA CON ESPARRAGOS

**ACCESOS POR NIVEL**

ACCESOS POR NIVEL	GRÁFICA DE NIVELES
<input type="checkbox"/>	H:
<input type="checkbox"/>	ESPESOR
<input type="checkbox"/>	H:
<input type="checkbox"/>	ESPESOR
<input type="checkbox"/>	H:
<input type="checkbox"/>	ESPESOR
<input type="checkbox"/>	H:
<input type="checkbox"/>	ESPESOR
<input type="checkbox"/>	H:

NOTA: ESPECIFICAR APERTURA DE PUERTAS EN ELEVADOR, ESQUEMA DE TRAYECTORIA DE CONEXIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA.

**ISOMÉTRICO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA**
*Smts*
**RAMPA**

ÁREA	TIPO DE CONEXIÓN
MURO	DISPARO
PISO	CLAVIA (Por Cliente)
DIST. DE CABLE 4 X 12	EMPOTRADAS

**ELEVADOR**

BOTONERAS	
PEDESTAL	CANALIZADA POR TECNORAMPA <input checked="" type="checkbox"/>
SOBREPUESTA	EMPOTRADAS
EMPOTRADAS	ELECTRO IMANES

NOTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y LA ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONA ASIGNADA PARA RECEPCIÓN DEL EQUIPO: 1.-	TEL:
2.-	TEL:

TECNORAMPA

NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE
