

CLIENTE: 33348- Consorcio Constructor ECO del Bajío										#	
RAZÓN SOCIAL											
TEL:						CORREO					
DIRECCIÓN: Cereso de SMA											
Accesibilidad a la zona de trabajo											
Requerimientos especiales:											
Reglamento de ingreso:										Horario:	
Documentos:										Otros:	
Equipo a suministrar:		Rampa		Elevador	✓	Cantidad	1	Cap. Carga	1,000 Kg	U. Hidraulica	5 HP
Equipo Especial											
RAMPA CARACTERÍSTICAS						ELEVADOR CARACTERÍSTICAS					
PARKING LIFT		ALT ELEVACIÓN		ANDÉN		CLASIFICACIÓN		TIPO DE CABINA		APERTURA	N 90 180
TR EVOLUTION				NIV HIDRA / HD	✓	CARGA	✓	MED / SEMI	✓	ESTACIONES	2
HEAVY DUTY		H. LIBRE		NIV MECÁNICA		DISCA		CREW V1/V2	✓	ALT ELEVACIÓN	3-78
TR ONE				RHINO TI / TI HD	✓	AUTOS		FULL VOX / VOX EVO	✓	DIMENSIONES CABINA INTERIOR	
DIMENSIONES DE PLATAFORMA				TALLER		CAMILLAS		VOX PLATAFORMA			
1.9 X 3.75		2.00 X 3.75		2 POST / HD	✓	TIJERAS		FOSO			
2.10 X 3.75		1.90 X 3.50		PORTERIA		UNDERRAMP		0.2	0.3	0.45	0.6
2.00 X 3.50		2.1 X 3.50		FRENERA		ESPECIAL		L=130 A=140 P=60 L=130 A=70			
Características especiales:											
Condicionantes y dimensiones de acceso:											
Requerimiento estructural (Firme o foso) : Firme de concreto de 15 cm de espesor con resistencia de 250Kg/cm2. con malla electrosoldada 6/6,10-10											
Componentes Adicionales:											
TRABAJOS A REALIZAR											
CLIENTE		SI	NO	TECNO RAMPA							
FIRME				GUÍA MECÁNICA							
INSTALACIÓN ELÉCTRICA:				SOLICITUDES ADICIONALES							
ELEMENTOS DE FIJACIÓN:											
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA											
UNIDAD HIDRÁULICA	2	3	5	10	15	20	ESP	HP	ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFASICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA								INSTALADA		NO INSTALADA	ACCESORIO EXTRA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NETURO Y TIERRA FÍSICA								TIPO	TUBERÍA	✓	CANALETA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NUETRO Y TIERRA FÍSICA								ESPESOR	DELGADA		GRUESA
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:											
ACEPTO COSTO ADICIONAL (NOMBRE Y FIRMA):											
RESPONSABLE OBRA ELÉCTRICA (NOMBRE Y FIRMA)											
ACABADOS RAMPAS / ELEVADORES											
PINTURA				PINTURA				PAREDES INTERIORES		CRISTAL	
COLORES DE LINEA	ROJO	GRIS	NEGRO	DE LÍNEA	BLANCO		CROMO		ALUCOBOND		CLARO
PLATAFORMA				Cod.	SILVER MENT		COLOR ESPECIAL		METAL DESPLAGADO		TINTEX
COLUMNAS				Cod.	NEGRO		Cod.		LAMINA PERFORADA		ESMERILADO
SOLICITUD ADICIONAL											

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

TECNORAMPA

VE-FO-01 REV00

NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE

LEVANTAMIENTO


Cotización # **Nº 00399**

NOTA: SE PODRÁN INSTALAR CONTROLADORES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.


NOTA: REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

Observaciones generales

DETALLE GRÁFICO




ELEVADORES / RAMPAS NIVELADORAS FOSO





CABINA
TIPO DE PTA: CABINA
APERTURA: ☒ DESARMADA ☐ ARMADA

2 partes

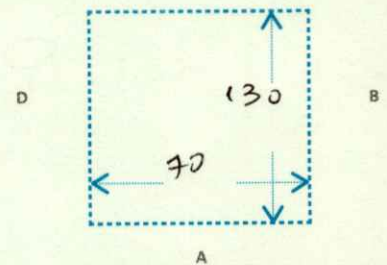

ISOMÉTRICO CRISTALES

TIPO DE ANCLAJE



ESTRUCTURA ☐
CADENAS ☒
PLACA ☐
PLACA CON ESPARRAGOS ☐

ACCESOS POR NIVEL

GRÁFICA DE NIVELES

ESPEJOR
H:
ESPEJOR
H:
ESPEJOR
H:
ESPEJOR
H:
ESPEJOR
H:

NOTA: ESPECIFICAR APERTURA DE PUERTAS EN ELEVADOR, ESQUEMA DE TRAYECTORIA DE CONEXIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA.

ISOMÉTRICO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA

RAMPA

ELEVADOR

SMS

ÁREA	TIPO DE CONEXIÓN	BOTONERAS
MURO	DISPARO	PEDESTAL
PISO	CLAVIJA (Por Cliente)	SOBREPUESTA
DIST. DE CABLE 4 X 12		EMPOTRADAS
EXTRAS:		ELECTRO IMANES

NOTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y LA ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONA ASIGNADA PARA RECEPCIÓN DEL EQUIPO: 1.-

TEL:

2.-

TEL:
