

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO
 TEC080710M22
 Tels.: 01(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecnorampa.com.mx
 014272728119
 LADA SIN COSTO:
 018006230332

NOMBRE DEL CLIENTE: Erick Lara Gardoa FECHA: 04-02-21
 RAZÓN SOCIAL: IQUEO SA DE CV.
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CUAHUTEMOC 326 - COL. TEPISQUILAPAN
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: SAN LUIS POTOSÍ
9395-9282- TELÉFONO: _____ CORREO: _____

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: Descarga San.

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
 COLUMNAS LARGAS CORTAS ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
 No. PARTES 3 OTRO COVID,
 CONDICIONES PARA INGRESAR: 1 mss. 9am - 6pm.

DOCUMENTOS: _____
 AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: _____ %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: _____

CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA

CARGA <input type="checkbox"/>	CAMILLAS <input type="checkbox"/>	MEDIDA 1.10M <input type="checkbox"/>	ELEVACIÓN <u>12.66</u> ✓
DISCAPACITADOS <input type="checkbox"/>	TIJERAS <input type="checkbox"/>	SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10M) <input type="checkbox"/>	ESTACIONES <u>5</u> ✓
AUTOS <input checked="" type="checkbox"/>	UNDER RAMP <input type="checkbox"/>	COMPLETA 2.10M <input type="checkbox"/>	CAPACIDAD DE CARGA <u>3500 kg</u>
			UNIDAD HIDRÁULICA <u>10 HD</u>

DIMENSIÓN DE FOSO: ELEVADORES DE TIJERA, 45CM
 LARGO 6.00 ✓ ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM
 ANCHO 3.26 ✓ ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM
 PROFUNDIDAD 0.40 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 2.80 ANCHO 2.56

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA _____

TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:

CLIENTE: SI NO TECNORAMPA
 FOSO GUÍA MECÁNICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA SOLICITUDES ADICIONALES _____
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA TUBERÍA PARED
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA SI TUBERÍA DELGADA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA NO CANALETA GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA NO INSTALADA RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA _____
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: _____

NOMBRE Y FIRMA FECHA DE TÉRMINO FIRMA

ACABADO DE ELEVADOR

COLORES CRISTAL
 BLANCO SILVER METALLIC METAL DESPLEGADO CLARO
 AZUL GRIS PANTONE LÁMINA PINTOR TINTEX
 AZUL/BLANCO ALUCOBOND COLOR OTRO _____ ESMERILADO
 SOLICITUD ADICIONAL: _____

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

Ang Salgado Silva Erick Lara Gardoa
 TECNORAMPA NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOTA

8677

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIR LOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.




NOTA

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: mandar queso de UH
ligar a columnas metálicas - hacer anillo final
considerar foso menor a 40cm.

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN


110 V 220 V GENERADOR

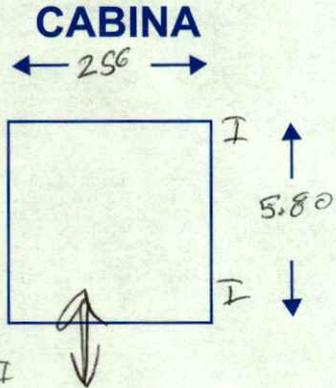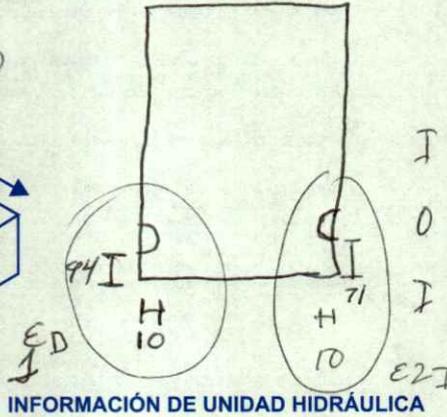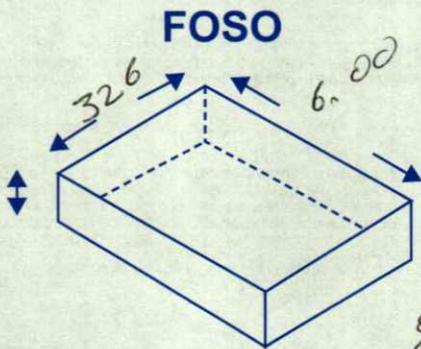

BOTONERAS

PEDESTAL SOBREPUESTAS DISTANCIA APROXIMADA
 EMPOTRADAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA SMTS
Unidad uno altura de 160



EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

NOTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: _____ TELÉFONO 1): _____
CONTACTO 2): _____ TELÉFONO 2): _____

Dr. Salvador Silvas
TECNORAMPA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR
