

TecnoRampa

BLVD. HIDALGO #177 A COL. CENTRO
C.P. 76800 SAN JUAN DEL RIO, QRO.

LEVANTAMIENTO DE ELEVADORES

5999

LADA SIN COSTO:
01 800 6330 332, 01 800 8380 850
atencionclientes@tecnorampa.com.mx

FECHA: 16 Marzo 2017

NOMBRE DEL CLIENTE: Luis Miguel
RAZÓN SOCIAL: Multifunciones y especializadas
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Sabos. Nuevo Valle de Morena, Loon
REFERENCIA DE DIRECCIÓN: Guamajuato (casi pagado a san Felipe)

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: No hay hoteles, se revisara la opción de quedarse en la escuela

ACCESO DE EQUIPO: DESARMADO ARMADO
COLUMNAS: LARGAS CORTAS

EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO

No. PARTES HORARIO: Libre

CONDICIONES PARA INGRESAR: Caminos de taracaria a la
DOCUMENTOS: Ninguno

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 90 %
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Elevador de discapacitados cabina semicompleta

CLASIFICACIÓN: CARGA CAMILLAS
DISCAPACITADOS TIJERA
AUTOS UNDER RAMP

TIPO DE CABINA: MEDIA 1.10 M
SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M)
COMPLETA 2.10 M

ELEVACIÓN: 3.10m
ESTACIONES: 2 ost
CAPACIDAD DE CARGA: 300Kg
UNIDAD HIDRÁULICA: 2 Hp

DIMENSIÓN DE FOSO: LARGO 2.20m
ANCHO 1.492m
PROFUNDIDAD 0.20m

ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM
ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM
ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM
DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.30 ANCHO 1.30

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA: Incluir panel de seguridad, amortiguadores y brayle

TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR:

CLIENTE: SI NO
FOSO
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

TECNORAMPA
GUÍA MECÁNICA
SOLICITUDES ADICIONALES _____

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

TUBERÍA: SI TUBERÍA PARED DELGADA
NO CANALETA GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA: INSTALADA NO INSTALADA OTRO
ACCESORIOS EXTRAS COSTO
ACEPTO COSTO ADICIONAL: sin costo

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA: _____

NOMBRE Y FIRMA: _____ FECHA DE TÉRMINO: _____ FIRMA: _____

ACABADO DEL ELEVADOR

COLORES: BLANCO SILVER METALLIC
AZUL / GRIS PANTONE CÓDIGO _____
AZUL / BLANCO ALUCOBOND COLOR

METAL DESPLEGADO
LÁMINA PINTRO
OTRO _____

CRISTAL: CLARO
TINTEX
ESMERILADO

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

TECNORAMPA: Asa. Mariana Olvera
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE: _____

NOTA:

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCION AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.


NOTA:

REVISÉ Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: -Queda pendiente colocar portabarrido de soporte y mayor tubería sanitaria de foso.

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN

110 V 220V GENERADOR

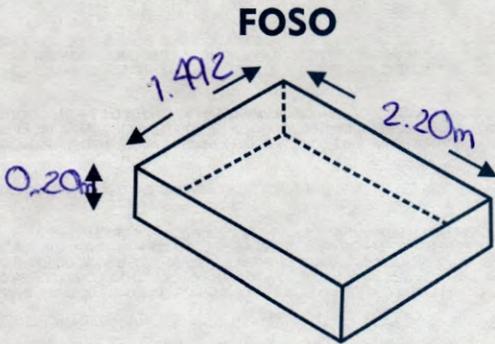

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA



BOTONERAS

PEDESTAL EMPOTRADAS

SOBREPUESTAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 2.00m.

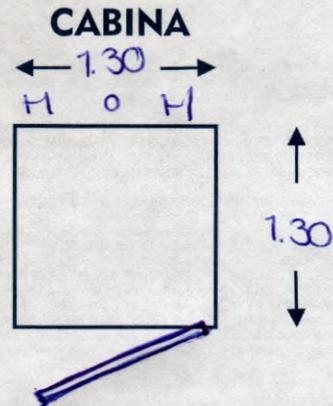

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

Aca Mariana Olvera

TECNORAMPA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
