

BLVD. HIDALGO #177 A COL. CENTRO  
C.P. 76800 SAN JUAN DEL RIO, QRO.

LADA SIN COSTO:  
01 800 6330 332, 01 800 8380 850  
atencionclientes@tecnorampa.com.mx

20 Visita

NOMBRE DEL CLIENTE: Luis Miguel FECHA: 16 Marzo 2017  
 RAZÓN SOCIAL: Multifunciones y especializadas  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Sabos, Barrio de Barrios, San Felipe  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: Guanguate.  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_ CORREO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: Comunidad pequeña.

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO  ARMADO   
 COLUMNAS LARGAS  CORTAS   
 No. PARTES   
 EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO   
 OTRO: \_\_\_\_\_  
 CONDICIONES PARA INGRESAR: Area amplia HORARIO: 8:00 a 6:00 pm.  
 DOCUMENTOS: Ninguno OTROS: \_\_\_\_\_

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 80 %  
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Elevador de discapacitados cabina semicompleta

**CLASIFICACIÓN** CARGA  CAMILLAS  DISCAPACITADOS  TIJERA  AUTOS  UNDER RAMP   
**TIPO DE CABINA** MEDIA 1.10 M  SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M)  COMPLETA 2.10 M   
 ELEVACIÓN 3.12m  
 ESTACIONES 2 est  
 CAPACIDAD DE CARGA 500kg  
 UNIDAD HIDRÁULICA 2 Hp.

DIMENSIÓN DE FOSO: LARGO 2.20m ANCHO 1.502m PROFUNDIDAD 0.20m  
 ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM   
 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM   
 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM   
 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.30 ANCHO 1.30

**NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA**

COMPONENTES EXTRA Panel de seguridad, amortiguadores y brayle.

**TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR:**

**CLIENTE:** SI  NO   
 FOSO  INSTALACIÓN ELÉCTRICA  CANALIZACIÓN DE BOTONERAS   
**TECNORAMPA:** GUÍA MECÁNICA  SOLICITUDES ADICIONALES \_\_\_\_\_

**ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA**

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
**TUBERÍA:** SI  NO   
**TUBERÍA:** TUBERÍA  CANALETA   
**PARED:** DELGADA  GRUESA

**ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA:** INSTALADA  NO INSTALADA  OTRO   
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO   
 ACEPTO COSTO ADICIONAL Sin costo adicional.  
 NOMBRE Y FIRMA: \_\_\_\_\_ FECHA DE TÉRMINO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

**ACABADO DEL ELEVADOR**

**COLORES:** BLANCO  AZUL / GRIS  AZUL / BLANCO   
 SILVER METALLIC  PANTONE  ALUCOBOND COLOR   
**CRISTAL:** METAL DESPLEGADO  LÁMINA PINTRO  OTRO: \_\_\_\_\_  
 CLARO  TINTEX  ESMERILADO

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR  
Arq. Mariana Olvera. TECNORAMPA  
[Firma] NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

**NOTA:**

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCION AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

**NOTA:**



REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

**OBSERVACIONES GENERALES:**

-Queda pendiente alimentación eléctrica,  
pasos ducto para botoneras,

**DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN**

110 V       220V       GENERADOR

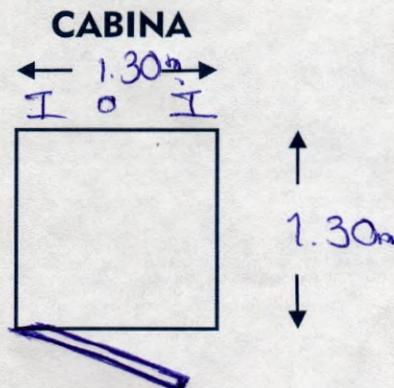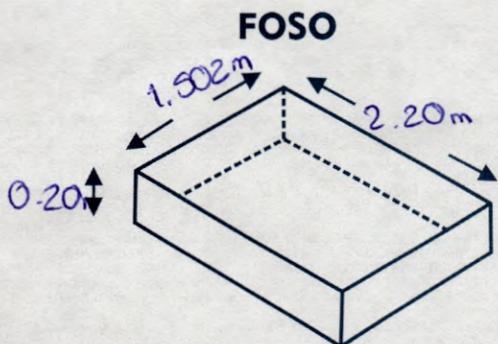


**INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA**

**BOTONERAS**

PEDESTAL        EMPOTRADAS  
SOBREPUESTAS        CANALIZADAS POR TECNORAMPA

DISTANCIA APROXIMADA  
ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 2.00m.



**EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**NOTA:**

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

**ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR**

  
Arq. Mariana Olcese,  
TECNORAMPA

  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
