

BLVD. HIDALGO #177 A COL. CENTRO
C.P. 76800 SAN JUAN DEL RIO, QRO.

LADA SIN COSTO:
01 800 6330 332, 01 800 8380 850
atencionclientes@tecnorampa.com.mx

FECHA: 06/Abril/2018

NOMBRE DEL CLIENTE: _____

RAZÓN SOCIAL: Eloktia Aguascalientes

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Av. Magad Magandhi #352, casi esq. Av. Aguascalientes

REFERENCIA DE DIRECCIÓN: a un costado de Toks Aguascalientes

TELÉFONO: _____ CORREO: _____

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: Acceso a vialidad a 5.00m del elevador.

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO

COLUMNAS LARGAS CORTAS

No. PARTES

EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO

OTRO Años

CONDICIONES PARA INGRESAR: _____ HORARIO: 8:00 am a 5:30pm.

DOCUMENTOS: Presentar ifo y certificaciones. OTROS _____

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 90 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Elevador de carga 2 Ton, 2 estaciones.

CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA

CARGA CAMILLAS MEDIA 1.10 M

DISCAPACITADOS TIJERA SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M)

AUTOS UNDER RAMP COMPLETA 2.10 M

ELEVACIÓN 4.56m.

ESTACIONES 2 est

CAPACIDAD DE CARGA 2000kg

UNIDAD HIDRÁULICA 10 Hp.

DIMENSIÓN DE FOSO:

LARGO 2.80m.

ANCHO 2.20m.

PROFUNDIDAD 0.60m.

ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM

ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM

ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM

DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 2.00 ANCHO 2.00m.

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA Botonera con display, modulo nuevo, puertas exteriores.

TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR:

CLIENTE: SI NO

FOSO

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

TECNORAMPA

GUÍA MECÁNICA

SOLICITUDES ADICIONALES _____

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

TUBERÍA SI TUBERÍA PARED DELGADA

NO CANALETA GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA NO INSTALADA OTRO

ACCESORIOS EXTRAS COSTO

ACEPTO COSTO ADICIONAL Aplico costo a puertos

NOMBRE Y FIRMA _____

FECHA DE TÉRMINO 15/Abril/2018.

FIRMA _____

ACABADO DEL ELEVADOR

COLORES

BLANCO SILVER METALLIC METAL DESPLEGADO

AZUL / GRIS PANTONE LÁMINA PINTRO

AZUL / BLANCO ALUCOBOND COLOR OTRO Laminado perforado.

SOLICITUD ADICIONAL: _____

CRISTAL

CLARO

TINTEX

ESMERILADO

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR TECNO SUPERVISIÓN

Ara Mariana Olvera

TECNORAMPA

6/04/18

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOTA:

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCION AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA:

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICION DEL CLIENTE.


OBSERVACIONES GENERALES:

- 1 Puerta adicional en cada estación
- El elevador no llevara puerta.


DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN

110 V 220V GENERADOR

FOSO

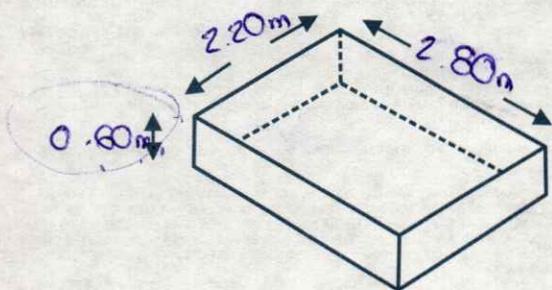

CABINA


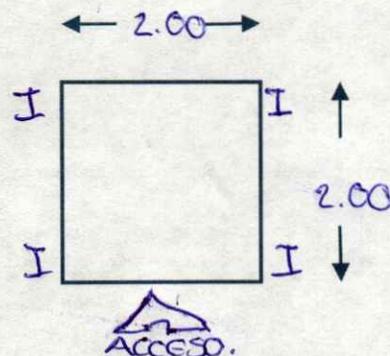


INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

BOTONERAS

PEDESTAL SOBREPUESTAS DISTANCIA APROXIMADA ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 5.00 m

EMPOTRADAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA



[UT]

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR
Ara Mariana Olvera
TECNORAMPA

INCA SUPERVISIÓN
6/04/18
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
