

BLVD. HIDALGO #177 A COL. CENTRO  
C.P. 76800 SAN JUAN DEL RIO, QRO.

LADA SIN COSTO:  
01 800 6330 332, 01 800 8380 850  
atencionclientes@tecnorampa.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: Luis chapina FECHA: 22/Marzo/2017  
 RAZÓN SOCIAL: Terracería  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: UPA Universidad popular de Acatlan  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_ CORREO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: Cerca acceso secundario, terracería para descarga del elevador.

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO  ARMADO   
 COLUMNAS LARGAS  CORTAS   
 No. PARTES   
 EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO   
 OTRO Acabados area de trabajo  
 CONDICIONES PARA INGRESAR: Acceso libre terracería HORARIO: 7:00 am - 7 pm  
 DOCUMENTOS: Id, libreta de personal OTROS: -  
 AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 0 %  
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Elevador crew evolution

**CLASIFICACIÓN** CARGA  CAMILLAS  DISCAPACITADOS  TIJERA  AUTOS  UNDER RAMP   
**TIPO DE CABINA** MEDIA 1.10 M  SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M)  COMPLETA 2.10 M Crew   
 ELEVACIÓN 3.50m  
 ESTACIONES 2 est  
 CAPACIDAD DE CARGA 500 kg  
 UNIDAD HIDRÁULICA 2HP

DIMENSIÓN DE FOSO: LARGO 1.75m ANCHO 1.50m PROFUNDIDAD 0.20m  
 ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM   
 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM   
 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM   
 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.35 ANCHO 1.25m

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA Componentes crew evolutions

TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR:

CLIENTE: SI NO  
 FOSO    
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA    
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS    
 TECNORAMPA GUÍA MECÁNICA   
 SOLICITUDES ADICIONALES \_\_\_\_\_

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
**TUBERÍA** SI  TUBERÍA  NO  CANALETA   
**PARED** DELGADA  GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 INSTALADA  NO INSTALADA  OTRO

ACCESORIOS EXTRAS COSTO   
 ACEPTO COSTO ADICIONAL 3/costo  
 RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA  
 NOMBRE Y FIRMA: \_\_\_\_\_ FECHA DE TÉRMINO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

ACABADO DEL ELEVADOR

COLORES: BLANCO  SILVER METALLIC  AZUL / GRIS  PANTONE  AZUL / BLANCO  ALUCOBOND COLOR   
 METAL DESPLEGADO  LÁMINA PINTRO  OTRO \_\_\_\_\_  
**CRISTAL** CLARO  TINTEX  ESMERILADO

SOLICITUD ADICIONAL: \_\_\_\_\_  
 ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR  
Arq. Mariana Olvera TECNORAMPA  
CP Luis Chapina NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

**NOTA:**

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCION AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

**NOTA:**

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICION DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES:

3/ preparaciones


**DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN**

110 V


220V

GENERADOR

**FOSO**

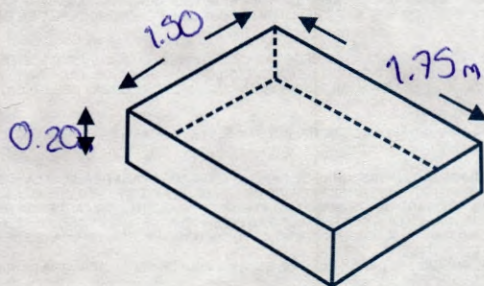

**CABINA**

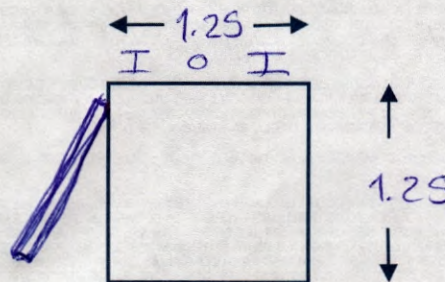

**INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA**

**BOTONERAS**

PEDESTAL


EMPOTRADAS

SOBREPUESTAS

CANALIZADAS POR TECNORAMPA

DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 2.00m,



OH.

**EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:**

**NOTA:**

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

**ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR**

[Signature]  
Ara-Mariana Olvera,  
TECNORAMPA

[Signature]  
CP Luis Chapino  
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
