

BLVD. HIDALGO #177 A COL. CENTRO  
C.P. 76800 SAN JUAN DEL RIO, QRO.

LADA SIN COSTO:  
01 800 6330 332, 01 800 8380 850  
atencionclientes@tecnorampa.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: Raphael Wolk FECHA: 27-01-17

RAZÓN SOCIAL: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Fracc. Las Trojes

REFERENCIA DE DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

TELÉFONO: \_\_\_\_\_ CORREO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: Limitado / casa habitación

ACCESO DE EQUIPO	DESARMADO <input checked="" type="checkbox"/>	ARMADO <input type="checkbox"/>	EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
COLUMNAS	LARGAS <input type="checkbox"/>	CORTAS <input checked="" type="checkbox"/>	ZAPATOS <input checked="" type="checkbox"/> CHALECO <input checked="" type="checkbox"/> LENTES <input checked="" type="checkbox"/> CASCO <input checked="" type="checkbox"/>

No. PARTES  OTRO \_\_\_\_\_

CONDICIONES PARA INGRESAR: Credencial Trabajo HORARIO: 8am a 6pm

DOCUMENTOS: \_\_\_\_\_ OTROS \_\_\_\_\_

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 10 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: elevador cabina ~~semicompleta~~ Media

<b>CLASIFICACIÓN</b>	<b>TIPO DE CABINA</b>	<b>ELEVACIÓN</b> <u>2.88</u>
CARGA <input type="checkbox"/>	MEDIA 1.10 M <input type="checkbox"/>	ESTACIONES <u>2</u>
DISCAPACITADOS <input type="checkbox"/>	SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M) <input type="checkbox"/>	CAPACIDAD DE CARGA <u>500kg</u>
AUTOS <input type="checkbox"/>	COMPLETA 2.10 M <input type="checkbox"/>	UNIDAD HIDRÁULICA <u>2hp</u>

<b>DIMENSIÓN DE FOSO:</b>	<b>ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM</b> <input type="checkbox"/>
LARGO <u>1.30</u>	<b>ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM</b> <input type="checkbox"/>
ANCHO <u>0.88</u>	<b>ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM</b> <input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD <u>sin foso</u>	<b>DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO <u>1.20</u> ANCHO <u>0.80</u></b>

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA \_\_\_\_\_

### TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR:

<b>CLIENTE:</b>	SI	NO
FOSO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CANALIZACIÓN DE BOTONERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**TECNORAMPA**

GUÍA MECÁNICA

SOLICITUDES ADICIONALES \_\_\_\_\_

### ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA \_\_\_\_\_

INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA \_\_\_\_\_

<b>TUBERÍA</b>	<b>PARED</b>
SI <input checked="" type="checkbox"/>	DELGADA <input checked="" type="checkbox"/>
NO <input type="checkbox"/>	GRUESA <input type="checkbox"/>
TUBERÍA <input checked="" type="checkbox"/>	
CANALETA <input type="checkbox"/>	

**ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

INSTALADA  NO INSTALADA  OTRO

ACCESORIOS EXTRAS COSTO

ACEPTO COSTO ADICIONAL \_\_\_\_\_

### RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE TÉRMINO

FIRMA

### ACABADO DEL ELEVADOR

<b>COLORES</b>	<b>CRISTAL</b>
BLANCO <input checked="" type="checkbox"/>	CLARO <input type="checkbox"/>
AZUL / GRIS <input type="checkbox"/>	TINTEX <input type="checkbox"/>
AZUL / BLANCO <input type="checkbox"/>	ESMERILADO <input checked="" type="checkbox"/>
SILVER METALLIC <input type="checkbox"/>	
PANTONE <input type="checkbox"/>	
ALUCOBOND COLOR <input type="checkbox"/>	
METAL DESPLEGADO <input type="checkbox"/>	
LÁMINA PINTRO <input type="checkbox"/>	
OTRO _____	

SOLICITUD ADICIONAL: \_\_\_\_\_

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

TECNORAMPA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

Condiciones 60% anticipo 30% elevador 10% en funcionamiento 5960

**NOTA:**

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCION AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

**NOTA:**



REVISÉ Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

**OBSERVACIONES GENERALES:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN**

110 V  220V  GENERADOR

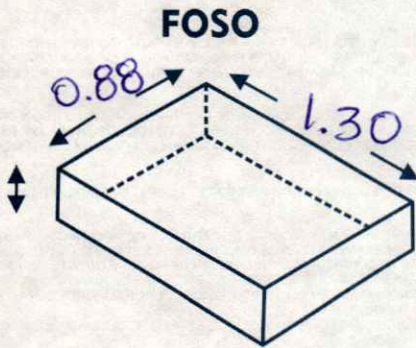

**INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA**

**BOTONERAS**

PEDESTAL  EMPOTRADAS   
SOBREPUESTAS  CANALIZADAS POR TECNORAMPA

DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA \_\_\_\_\_

La unidad hidraulica estara en P.A. 2.88m

**EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**NOTA:**

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

**ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR**

  
TECNORAMPA

  
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
