

BLVD. HIDALGO #177 A COL. CENTRO  
C.P. 76800 SAN JUAN DEL RIO, QRO.

LADA SIN COSTO:  
01 800 6330 332, 01 800 8380 850  
atencionclientes@tecnorampa.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: Ing. Veronica Aliano FECHA: 12-01-18  
 RAZÓN SOCIAL: Especialistas en Papayas SA de CV  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Camino a los Orticos Km 1  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: Colima.  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_ CORREO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: Limitado, Accesos 80cm

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO  ARMADO  EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL  
 COLUMNAS LARGAS  CORTAS  ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO   
 No. PARTES  3 OTRO \_\_\_\_\_  
 CONDICIONES PARA INGRESAR: Cliente Empresa lo Proporciona HORARIO: 7:00am a 3:30pm  
 DOCUMENTOS: Credencial Empresa Tecnorampa OTROS \_\_\_\_\_  
 AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 35 %  
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Elevador para carga 500Kg

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <b>CLASIFICACIÓN</b>  | <b>TIPO DE CABINA</b>   | <b>ELEVACIÓN</b> <u>3.30m</u>   |
| CARGA <input checked="" type="checkbox"/> CAMILLAS <input type="checkbox"/> | MEDIA 1.10 M <input type="checkbox"/>                               | ESTACIONES <u>2</u>             |
| DISCAPACITADOS <input type="checkbox"/> TIJERA <input type="checkbox"/>     | SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M) <input checked="" type="checkbox"/> | CAPACIDAD DE CARGA <u>500Kg</u> |
| AUTOS <input type="checkbox"/> UNDER RAMP <input type="checkbox"/>          | COMPLETA 2.10 M <input type="checkbox"/>                            | UNIDAD HIDRÁULICA <u>2hp.</u>   |

DIMENSIÓN DE FOSO:  
 LARGO 1.75  
 ANCHO 1.50  
 PROFUNDIDAD 20

ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM   
 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM   
 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM   
 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.30 ANCHO 1.30

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA \_\_\_\_\_

**TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR:**

|                           |                                     |                          |   |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|
| <b>CLIENTE:</b>           | SI                                  | NO                       | <b>TECNORAMPA</b>                                 |
| FOSÓ                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | GUÍA MECÁNICA <input checked="" type="checkbox"/> |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | SOLICITUDES ADICIONALES _____                     |
| CANALIZACIÓN DE BOTONERAS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____   |

**ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA**

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

|   |  |
|---|--|
| <b>TUBERÍA</b>  | <b>PARED</b>                               |
| SI <input type="checkbox"/> TUBERÍA <input checked="" type="checkbox"/> | DELGADA <input type="checkbox"/>           |
| NO <input type="checkbox"/> CANALETA <input type="checkbox"/>           | GRUESA <input checked="" type="checkbox"/> |

**ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA**  
 INSTALADA  NO INSTALADA  OTRO   
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO   
 ACEPTO COSTO ADICIONAL \_\_\_\_\_

**RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA**  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_ FECHA DE TÉRMINO \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**ACABADO DEL ELEVADOR**

|   |  |
|---|--|
| <b>COLORES</b>  | <b>CRISTAL</b>                                       |
| BLANCO <input checked="" type="checkbox"/> SILVER METALLIC <input type="checkbox"/> | METAL DESPLEGADO <input checked="" type="checkbox"/> |
| AZUL / GRIS <input type="checkbox"/> PANTONE <input type="checkbox"/>               | LÁMINA PINTRO <input type="checkbox"/>               |
| AZUL / BLANCO <input type="checkbox"/> ALUCOBOND COLOR <input type="checkbox"/>     | OTRO _____   |
| SOLICITUD ADICIONAL: _____  | CLARO <input checked="" type="checkbox"/>            |
|   | TINTEX <input type="checkbox"/>                      |
|   | ESMERILADO <input type="checkbox"/>                  |

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

[Signature] **TECNORAMPA**

[Signature] **Veronica Aliano**  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE Evaristo.

**NOTA:**

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCION AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

**NOTA:**



REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

**OBSERVACIONES GENERALES:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN**

110 V       220V       GENERADOR

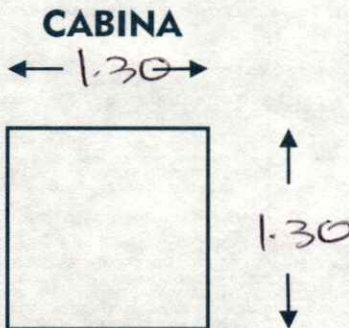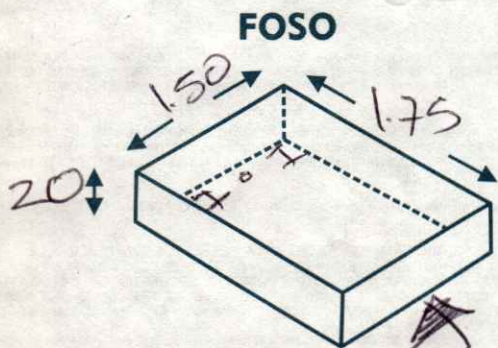

**INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA**



**BOTONERAS**

PEDESTAL

SOBREPUESTAS


DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA

EMPOTRADAS

CANALIZADAS POR TECNORAMPA

5m

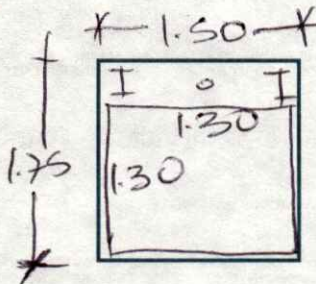

**EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**NOTA:**

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

**ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR**

TECNORAMPA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
