

BLVD. HIDALGO #177 A COL. CENTRO  
C.P. 76800 SAN JUAN DEL RIO, QRO.

LADA SIN COSTO:  
01 800 6330 332, 01 800 8380 850  
atencionclientes@tecnorampa.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: Nacional Monte de Piedad      FECHA: 7º Dicº 16  
 RAZÓN SOCIAL: Socorsal Alcalde  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: \_\_\_\_\_  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: Av. Alcalde #808 esquina Jesús García  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_      CORREO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: Libre

ACCESO DE EQUIPO      DESARMADO  ARMADO       EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL  
 COLUMNAS      LARGAS  CORTAS       ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO   
 No. PARTES       OTRO \_\_\_\_\_  
 CONDICIONES PARA INGRESAR: Credencial Trabajo      HORARIO: 8am a 5pm  
 DOCUMENTOS: \_\_\_\_\_      OTROS \_\_\_\_\_

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 0 %  
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Elevador Cabina Media

<b>CLASIFICACIÓN</b>		<b>TIPO DE CABINA</b>		<b>ELEVACIÓN</b> <u>1.50</u>	
CARGA	<input type="checkbox"/> CAMILLAS <input type="checkbox"/>	MEDIA 1.10 M	<input checked="" type="checkbox"/>	ESTACIONES	<u>2</u>
DISCAPACITADOS	<input checked="" type="checkbox"/> TIJERA <input type="checkbox"/>	SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M)	<input type="checkbox"/>	CAPACIDAD DE CARGA	<u>500kg</u>
AUTOS	<input type="checkbox"/> UNDER RAMP <input type="checkbox"/>	COMPLETA 2.10 M	<input type="checkbox"/>	UNIDAD HIDRÁULICA	<u>2hp</u>

DIMENSIÓN DE FOSO:  
 LARGO 1.75      ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM   
 ANCHO 1.50      ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM   
 PROFUNDIDAD 20cm      ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM   
 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.30 ANCHO 1.30

**NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA**

COMPONENTES EXTRA Panel de Seguridad

**TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR:**

<b>CLIENTE:</b>	SI	NO	<b>TECNORAMPA</b>
FOSO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GUÍA MECÁNICA <input checked="" type="checkbox"/>
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SOLICITUDES ADICIONALES _____
CANALIZACIÓN DE BOTONERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA**

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

<b>TUBERÍA</b>	<b>PARED</b>
SI <input checked="" type="checkbox"/> TUBERÍA <input checked="" type="checkbox"/>	DELGADA <input checked="" type="checkbox"/>
NO <input type="checkbox"/> CANALETA <input type="checkbox"/>	GRUESA <input type="checkbox"/>

**ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA**  
 INSTALADA  NO INSTALADA  OTRO   
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO

ACEPTO COSTO ADICIONAL \_\_\_\_\_

_____ NOMBRE Y FIRMA	_____ FECHA DE TÉRMINO	_____ FIRMA
-------------------------	---------------------------	----------------

**ACABADO DEL ELEVADOR**

Pendiente

<b>COLORES</b>	<b>ACABADO DEL ELEVADOR</b>	<b>CRISTAL</b>
BLANCO <input type="checkbox"/>	SILVER METALLIC <input checked="" type="checkbox"/>	CLARO <input type="checkbox"/>
AZUL / GRIS <input type="checkbox"/>	PANTONE <input type="checkbox"/>	TINTEX <input type="checkbox"/>
AZUL / BLANCO <input type="checkbox"/>	ALUCOBOND COLOR <input type="checkbox"/>	ESMERILADO <input type="checkbox"/>

METAL DESPLEGADO       LÁMINA PINTRO       OTRO \_\_\_\_\_

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

[Firma]      Hugo A. Jimenez Perez  
 TECNORAMPA      NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

**NOTA:**

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCION AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

**NOTA:**

REVISÉ Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

**OBSERVACIONES GENERALES:** \_\_\_\_\_



**DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN**

110 V

220V

GENERADOR

*Considerar Generador* 

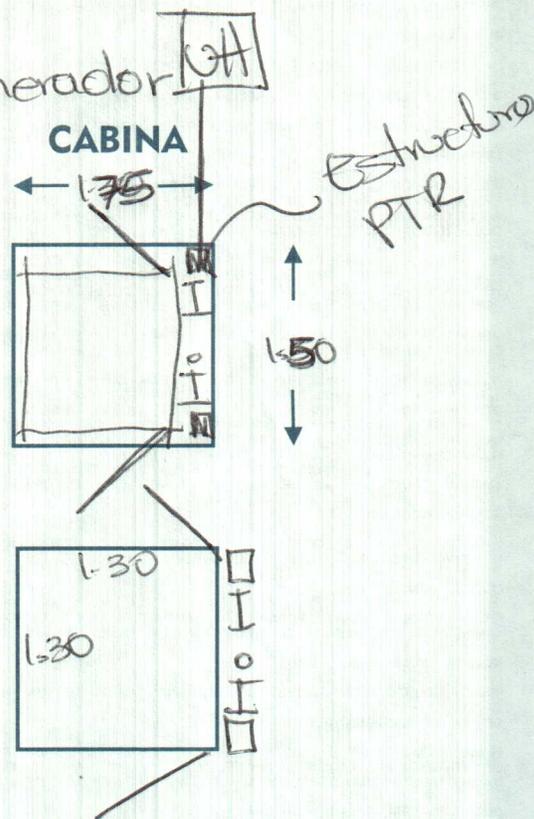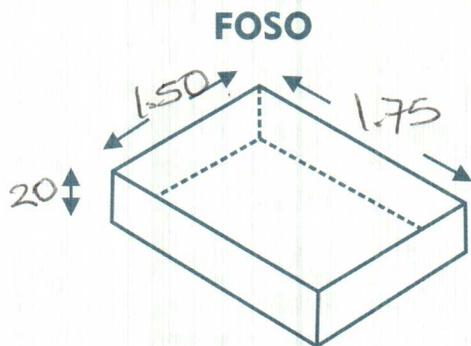

**INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA**

**BOTONERAS**

*PENDIENTE*

PEDESTAL

EMPOTRADAS

SOBREPUESTAS

CANALIZADAS POR TECNORAMPA

DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 2m

**EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:**


**NOTA:**

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

  
TECNORAMPA

  
Hugo A. Juarez Perez  
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
