

BLVD. HIDALGO #177 A COL. CENTRO  
C.P. 76800 SAN JUAN DEL RIO, QRO.

LADA SIN COSTO:  
01 800 6330 332, 01 800 8380 850  
atencionclientes@tecnorampa.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: LUIS ROBERTO CEJUDO RUIZ FECHA: 04-04-17  
 RAZÓN SOCIAL: Maxan Construcciones  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Laguna 63 col. ampliacion los alpes  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: delq. Alvaro Obregon.  
13098 TELÉFONO: \_\_\_\_\_ CORREO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: \_\_\_\_\_

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO  ARMADO   
 COLUMNAS LARGAS  CORTAS   
 No. PARTES   
 CONDICIONES PARA INGRESAR: \_\_\_\_\_ HORARIO: 8am - 6pm  
 DOCUMENTOS: \_\_\_\_\_ OTROS: \_\_\_\_\_  
 AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 60 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: \_\_\_\_\_

**CLASIFICACIÓN**

CARGA  CAMILLAS   
 DISCAPACITADOS  TIJERA   
 AUTOS  UNDER RAMP

**TIPO DE CABINA**

MEDIA 1.10 M   
 SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M)   
 COMPLETA 2.10 M

**EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL**

ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO

OTRO: \_\_\_\_\_

HORARIO: 8am - 6pm

OTROS: \_\_\_\_\_

DIMENSIÓN DE FOSO:

LARGO 1.20  
 ANCHO 1.30  
 PROFUNDIDAD 0.20

ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM   
 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM   
 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM   
 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.00 ANCHO 0.85

ELEVACIÓN 262  
 ESTACIONES 2  
 CAPACIDAD DE CARGA 500  
 UNIDAD HIDRÁULICA 2HP

**NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA**

COMPONENTES EXTRA \_\_\_\_\_

**TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR:**

CLIENTE: SI NO  
 FOSO    
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA    
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

TECNORAMPA  
 GUÍA MECÁNICA   
 SOLICITUDES ADICIONALES \_\_\_\_\_

**ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA**

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

TUBERÍA SI  TUBERÍA  PARED DELGADA   
 NO  CANALETA  GRUESA

**ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

INSTALADA  NO INSTALADA  OTRO   
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO   
 ACEPTO COSTO ADICIONAL \_\_\_\_\_

**RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA**

NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE TÉRMINO

FIRMA

**ACABADO DEL ELEVADOR**

**COLORES**

BLANCO  SILVER METALLIC   
 AZUL / GRIS  PANTONE  CÓDIGO 30  
 AZUL / BLANCO  ALUCOBOND COLOR

METAL DESPLEGADO   
 LÁMINA PINTRO   
 OTRO: \_\_\_\_\_

**CRISTAL**

CLARO  ?  
 TINTEX  ?  
 ESMERILADO

SOLICITUD ADICIONAL: \_\_\_\_\_

**ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR**

Ing. Salvador Silva S.  
 TECNORAMPA

Luis Roberto Cejudo Ruiz  
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

**NOTA:**

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCION AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.



**NOTA:**

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

**OBSERVACIONES GENERALES:** Ligar a cadenas, Panel de seguridad d  
Nicho de unidad H. 110mts. q170  
90x80 mts.

**DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN**

110 V  220V  GENERADOR

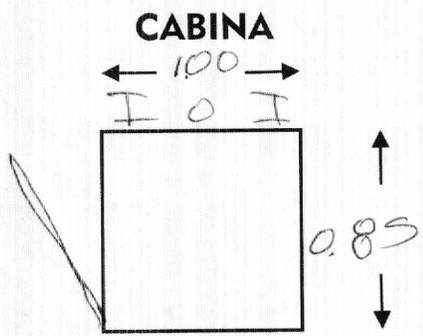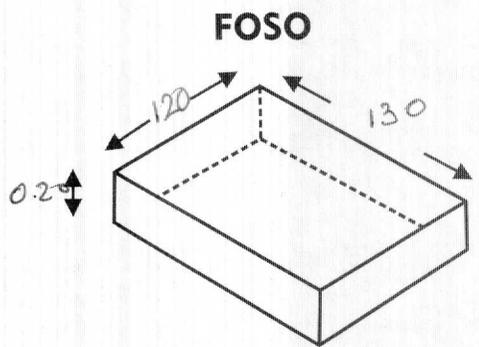


**INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA**

**BOTONERAS**

PEDESTAL  SOBREPUESTAS  DISTANCIA APROXIMADA ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 5 mts.

EMPOTRADAS  CANALIZADAS POR TECNORAMPA



**EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**NOTA:**

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

**ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR**

Arg. Salvador Silva S.  
TECNORAMPA

[Signature]  
NOMBRE Y FIRMA DEL CLÍENTE
