

BLVD. HIDALGO #177 A COL. CENTRO
C.P. 76800 SAN JUAN DEL RIO, GRO.

LADA SIN COSTO:
01 800 6330 332, 01 800 8380 850
atencionclientes@tecnorampa.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: Arg. Jazo Manuel Lopez FECHA: 22/Jun/2018
 RAZÓN SOCIAL: Elekta Tehuacan
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: _____
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: _____
 TELÉFONO: _____ CORREO: _____

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: Acceso estrecho por pasillo a bodega.

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO
 COLUMNAS LARGAS CORTAS *Verificar con proxecto.
 No. PARTES EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
 ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
 OTRO - Años
 HORARIO: 8:00 am - 8:00 pm

CONDICIONES PARA INGRESAR: _____
 DOCUMENTOS: Pagos del seguro OTROS _____
 AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 40 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Elevador de carga modelo nuevo

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|--|
| CLASIFICACIÓN | | TIPO DE CABINA | | ELEVACIÓN <u>4.55m</u> | |
| CARGA <input checked="" type="checkbox"/> | CAMILLAS <input type="checkbox"/> | MEDIA 1.10 M <input type="checkbox"/> | | ESTACIONES <u>2 est</u> | |
| DISCAPACITADOS <input type="checkbox"/> | TIJERA <input type="checkbox"/> | SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M) <input checked="" type="checkbox"/> | | CAPACIDAD DE CARGA <u>2000kg</u> | |
| AUTOS <input type="checkbox"/> | UNDER RAMP <input type="checkbox"/> | COMPLETA 2.10 M <input type="checkbox"/> | | UNIDAD HIDRÁULICA <u>10HP</u> | |

DIMENSIÓN DE FOSO:
 LARGO 2.20m
 ANCHO 2.80m
 PROFUNDIDAD 0.60m

ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM
 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM
 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, ~~20cm~~ 60cm
 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 2.00 ANCHO 2.00m

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA Botonera con display, puertas exteriores.

TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR:

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| CLIENTE: | SI | NO | TECNORAMPA |
| FOSO | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | GUÍA MECÁNICA <input checked="" type="checkbox"/> |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | SOLICITUDES ADICIONALES _____ |
| CANALIZACIÓN DE BOTONERAS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

| | |
|--|--|
| TUBERÍA | PARED |
| SI <input checked="" type="checkbox"/> TUBERÍA <input checked="" type="checkbox"/> | DELGADA <input type="checkbox"/> |
| NO <input type="checkbox"/> CANALETA <input type="checkbox"/> | GRUESA <input checked="" type="checkbox"/> |

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 INSTALADA NO INSTALADA OTRO
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO
 ACEPTO COSTO ADICIONAL _____

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA _____

NOMBRE Y FIRMA _____ FECHA DE TÉRMINO _____ FIRMA _____

ACABADO DEL ELEVADOR

| | |
|---|--|
| COLORES | CRISTAL |
| BLANCO <input type="checkbox"/> SILVER METALLIC <input type="checkbox"/> | METAL DESPLEGADO <input type="checkbox"/> CLARO <input type="checkbox"/> |
| AZUL / GRIS <input type="checkbox"/> PANTONE <input type="checkbox"/> CÓDIGO <u>Negro</u> | LÁMINA PINTRO <input type="checkbox"/> TINTEX <input type="checkbox"/> |
| AZUL / BLANCO <input type="checkbox"/> ALUCOBOND COLOR <input type="checkbox"/> <u>Lami Cromada</u> | OTRO <u>Lamina perforada</u> ESMERILADO <input type="checkbox"/> |

SOLICITUD ADICIONAL: _____

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

Arg Mariana Obora TECNORAMPA
J. Manuel Lopez M. NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOTA:

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCION AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA:

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICION DEL CLIENTE.


OBSERVACIONES GENERALES:

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN


110 V

220V

GENERADOR

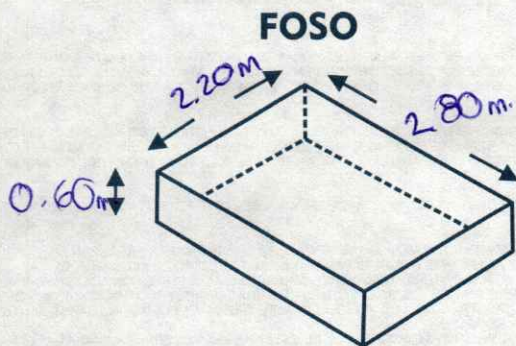

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

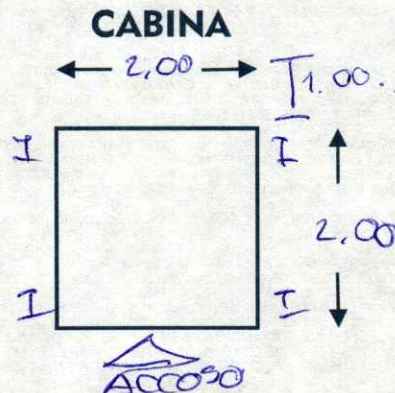

BOTONERAS

PEDESTAL


EMPOTRADAS

SOBREPUESTAS

CANALIZADAS POR TECNORAMPA

DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 3.00m



EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

Arq. Mariana Olvera.
TECNORAMPA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
