

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO  
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO  
 TEC080710M22  
 Tels.: 01(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecorampa.com.mx  
 0142772728119  
 LADA SIN COSTO:  
 018006230332

MD.  
 NOMBRE DEL CLIENTE: BARBARA CALZADA FECHA: 11 JUNIO 2020  
 RAZÓN SOCIAL: \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: NOVAEL BUSINESS PARK TORRELA B-2.  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: NAVE INDUSTRIAL DENTRO DEL COMPLEJO.  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_ CORREO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: COSELA DE SEMINAS

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO  ARMADO  EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL  
 COLUMNAS LARGAS  CORTAS  ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO   
 No. PARTES  OTRO COVID

CONDICIONES PARA INGRESAR: HORNO DE BAMBOLAS

DOCUMENTOS: \_\_\_\_\_

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 70% %  
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: CRUYA 1.00 1TON. (SE VERIFICA CADA SI FUERA ~~1.350 kg~~)

CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA  
 CARGA  CAMILLAS  MEDIDA 1.10M  ELEVACIÓN 1.50 METROS  
 DISCAPACITADOS  TIJERAS  SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10M)  ESTACIONES PARA DE ENERGÍA 2 ESTO  
 AUTOS  UNDER RAMP  COMPLETA 2.10M  CAPACIDAD DE CARGA 1000 kg 1,350 kg  
 UNIDAD HIDRÁULICA 5HP  
SEGUI GUÍA TÉCNICA AJERA.

DIMENSIÓN DE FOSO: ELEVADORES DE TIJERA, 45CM   
 LARGO 3.09 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM   
 ANCHO 2.16 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM   
 PROFUNDIDAD 0.53 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO \_\_\_\_\_ ANCHO \_\_\_\_\_

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA \_\_\_\_\_

TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:

CLIENTE: SI NO  
 FOSO    
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA    
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

TECNORAMPA  
 GUÍA MECÁNICA   
 SOLICITUDES ADICIONALES \_\_\_\_\_

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

TUBERÍA PARED  
 SI  TUBERÍA  DELGADA   
 NO  CANALETA  GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA  NO INSTALADA   
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO   
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: \_\_\_\_\_

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA FECHA DE TÉRMINO FIRMA

COLORES

BLANCO  SILVER METALLIC   
 AZUL/GRIS  PANTONE   
 AZUL/BLANCO  ALUCOBOND COLOR

ACABADO DE ELEVADOR

NECRO SATINADO  
 CÓDIGO UNFA

METAL DESPLEGADO  CRISTAL BARANON  
 LÁMINA PINTOR  CLARO   
 OTRO \_\_\_\_\_ TINTEX  UNFA  
 ESMERILADO

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

TECNORAMPA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

Barbara Calzada



SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIR LOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

**NOTA**  
REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: ELEVADOR DE CILCA TIPO "TIJERA" TIJERA ANDEN  
NO MUROS, SI BARANDAL  
SOLO BOTONERA EN CABINA.  
NO TUSING CASIBO POR MALXERA

**DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN**

110 V  220 V  GENERADOR

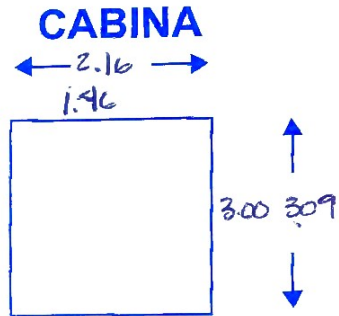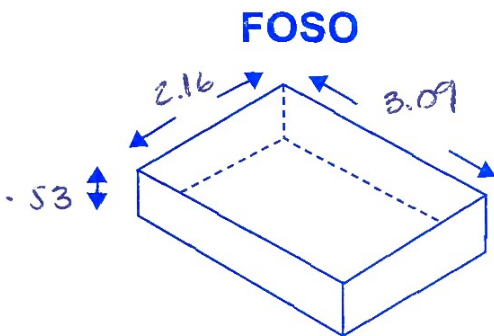

**INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA**



**BOTONERAS**

PEDESTAL   
SOBREPUESTAS

SOLO EN INTERIORE DE CABINA

EMPOTRADAS  
 CANALIZADAS POR TECNORAMPA

DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 3.0 Mts.

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDE RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

**NOTA:**  
PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

**PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO**

NOMBRE: \_\_\_\_\_ TELÉFONO 1): \_\_\_\_\_  
CONTACTO 2): \_\_\_\_\_ TELÉFONO 2): \_\_\_\_\_

[Signature]  
TECNORAMPA

[Signature]  
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE  
Barbara Calzada

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR
