

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO
Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO
TEC080710M22
Tels.:(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@teconrampa.com.mx
4272728119
LADA SIN COSTO:
800 623 0332

Nº 20229
LOT-23635

#C - 24380 - 15443

NOMBRE DEL CLIENTE: ING GUSTAVO CARDENAS FECHA: MAYO 11, 2022
 RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS MAPEO
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ #429 COL. BARRIO DE SAN VICENTE
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: APARATO, CTO. CP. 36588
 TELÉFONO: 462 170 5391 CORREO: gustavocardenas.mapeo@gmail.com
 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: ESPACIO ABIERTO.

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
 COLUMNAS LARGAS CORTAS ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
 No. PARTES OTRO: HORARIO ABIERTO.
 CONDICIONES PARA INGRESAR: ESPACIO DE 2.88 METRO 4 MTS AUTO.
 DOCUMENTOS: IMSS
 AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 75 %
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: ELEVADOR CARGA 500 KG

CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA
 CARGA CAMILLAS MEDIDA 1.10 M ELEVACIÓN 9.29
 DISCAPACITADOS TIJERAS SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M) ESTACIONES 2
 AUTOS UNDER RAMP COMPLETA 2.10 M CAPACIDAD DE CARGA 500 KG
 UNIDAD HIDRÁULICA 3 HP.

DIMENSIÓN DE FOSO:
 LARGO 1.75 ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM
 ANCHO 1.50 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 30 CM
 PROFUNDIDAD 0.30 ← ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM
 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.30 ANCHO 1.30

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM². ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA _____

TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:

CLIENTE: SI NO
 FOSO
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS
 TECNORAMPA
 GUÍA MECÁNICA EN PROCESO.
 SOLICITUDES ADICIONALES _____

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 TUBERÍA PARED
 SI TUBERÍA DELGADA
 NO CANALETA GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 INSTALADA NO INSTALADA
 ACCESORIOS EXTRAS COSTOS
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: _____
 RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

 NOMBRE Y FIRMA FECHA DE TÉRMINO FIRMA

ACABADO DE ELEVADOR

COLORES CRISTAL
 BLANCO SILVER METALLIC GRIS OSURO.
 AZUL/GRIS PANTONE RHINO.
 AZUL/BLANCO ALUCOBOND COLOR CÓDIGO _____
 SOLICITUD ADICIONAL: DE LARGAS. METAL DESPLEGADO CLARO
 LÁMINA PINTOR TINTEX
 OTRO _____ ESMERILADO

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

ARQ VERUS A. BENITEZ TECNORAMPA GUSTAVO CARDENAS FLORES NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

CUENTAS
NOTA — 24380 - 13443

COT-23635 N° 20229

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA


REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: — SE CUENTA CON ESPACIOS AMPLIOS PARA TRABAJAR


DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN 4.00 mts.

110 V 220 V GENERADOR

↳ POR GENERADOR

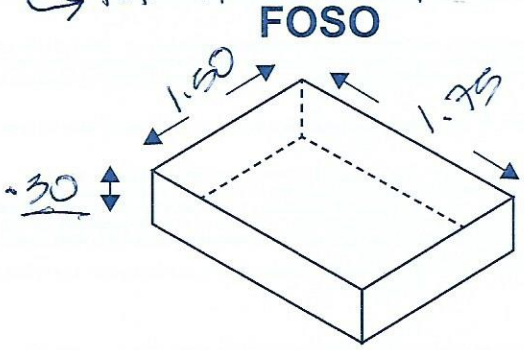

CABINA
← 1.30 →

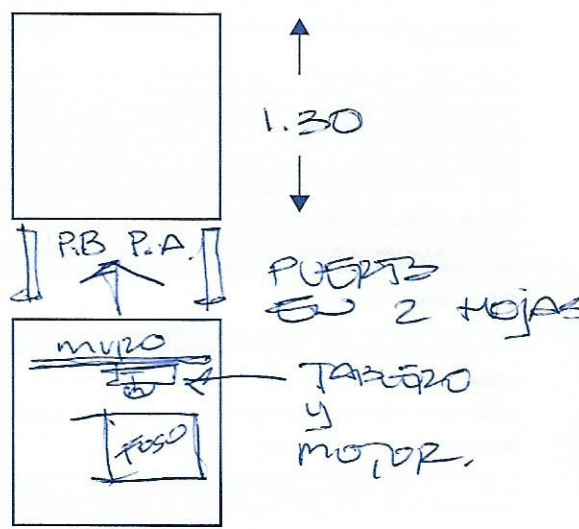

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

BOTONERAS

PEDESTAL EMPOTRADAS
SOBREPUESTAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

DISTANCIA APROXIMADA ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 3.00 mts.

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

— PACIANO SERRANO OLIVERA
— GUSTAVO CÁRDENAS FLORES

NOTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: PACIANO SERRANO OLIVERA TELÉFONO 1): 462 121 5807
CONTACTO 2): GUSTAVO CÁRDENAS FLORES TELÉFONO 2): 462 170 5391

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR
ARD JESÚS A. BENÍTEZ CRUZ TECNORAMPA
GUSTAVO CÁRDENAS FLORES NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
