

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO
Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO
TEC080710M22
Tels.: (427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecnorampa.com.mx
4272728119
LADA SIN COSTO:
800 623 0332

Nº 20235

CLIENTE - 27202

AUC - 19171

NOMBRE DEL CLIENTE: ARQ MARIA CRISTINA TREJO ISLAS FECHA: 02-06-2022

RAZÓN SOCIAL:

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: BLVD. EVERARDO MARQUEZ NO. 324 FRACC LOMAS

REFERENCIA DE DIRECCIÓN: RESIDENCIAL PACHUCA, CP 42094 PACHUCA HGO.

EDIFICIO MEDILITE TELÉFONO: 771 2214109 CORREO: cristina.trejo@iosoi.com.mx

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: ES A BORDO DE UNA AVENIDA.

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
COLUMNAS LARGAS CORTAS ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
No. PARTES OTRO _____

CONDICIONES PARA INGRESAR: - PIDEEN REALIZAR EL TRABAJO EN SEPARO

DOCUMENTOS: INE / SEGURO

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 10 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: ELEV DISAPARECIDOS TIPO TIJERA SIN FOSO

CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA
CARGA CAMILLAS MEDIDA 1.10 M ELEVACIÓN 1.45
DISCAPACITADOS TIJERAS SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M) ESTACIONES 2
AUTOS UNDER RAMP COMPLETA 2.10 M CAPACIDAD DE CARGA 500 kg
UNIDAD HIDRÁULICA 2 HP

DIMENSIÓN DE FOSO: LARGO 1.75 ANCHO 1.30 PROFUNDIDAD _____
ELEVADORES DE TIJERA ^{SIN FOSO} 45 CM
ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM
ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM
DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.70 ANCHO 0.75

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM². ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA _____

TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:

CLIENTE: SI NO
FOSO
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

TECNORAMPA
GUÍA MECÁNICA EN PROCESO
SOLICITUDES ADICIONALES _____

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

TUBERÍA PARED
SI TUBERÍA DELGADA
NO CANALETA GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA NO INSTALADA
ACCESORIOS EXTRAS COSTOS
ACEPTO COSTO ADICIONAL: _____

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE TÉRMINO

FIRMA

ACABADO DE ELEVADOR

COLORES
BLANCO SILVER METALLIC
AZUL/GRIS PANTONE CÓDIGO _____
AZUL/BLANCO ALUODORNO COLOR _____

CRISTAL
METAL DESPLEGADO CLARO
LÁMINA PINTOR TINTEX VERDE
OTRO _____ ESMERILADO

SOLICITUD ADICIONAL: _____

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR
ARQ MARIA CRISTINA TREJO ISLAS Benitez Cerv

TECNORAMPA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

#CLIENTE 27202 SOC 19171

Nº 20235

NOTA

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: EL CLIENTE PODR TRABAJAR EN SOBADO PORQUE ESTE DIA NO TRABAJA EL PERIFICO



DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN

10 mts.

110 V

220 V

GENERADOR

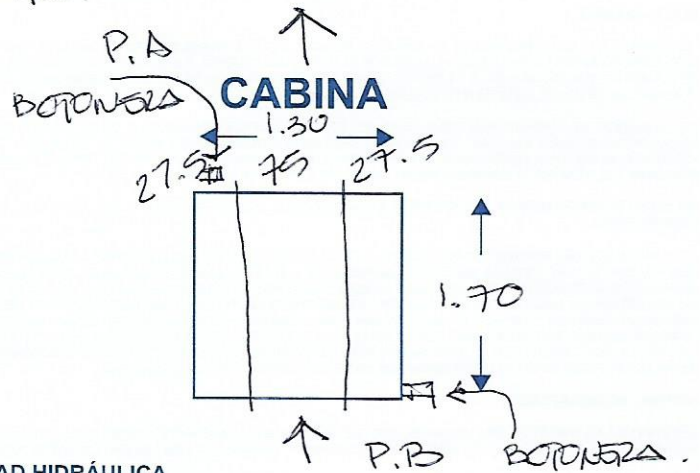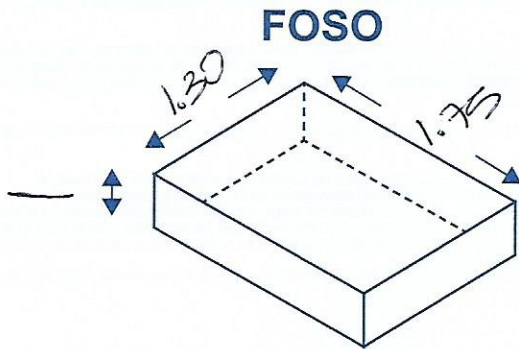

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

BOTONERAS

PEDESTAL


SOBREPUESTAS

DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 3.00 mts.

EMPOTRADAS

CANALIZADAS POR TECNORAMPA

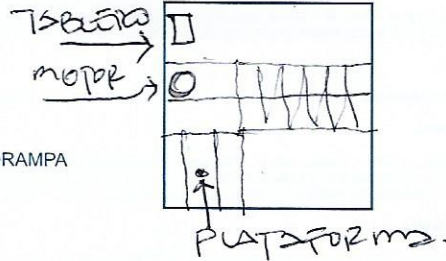

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

- MARIA CRISTINA TREJO ISLAS
- EDER RAMIREZ HERNANDEZ

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: MARIA CRISTINA TREJO ISLAS

TELÉFONO 1): 7712214169

CONTACTO 2): EDER RAMIREZ HERNANDEZ

TELÉFONO 2): 7712453262

ARQ LEÓN A. BENÍTEZ
TECNORAMPA

MARIA CRISTINA TREJO ISLAS
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
