

BLVD. HIDALGO #177 A COL. CENTRO  
C.P. 76800 SAN JUAN DEL RIO, QRO.

LADA SIN COSTO:  
01 800 6330 332, 01 800 8380 850  
atencionclientes@tecnorampa.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: Yolanda Velozquez FECHA: 15-Mzo-17  
 RAZÓN SOCIAL: \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Rancho Santa Maria Salamanca, Gto.  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: Casa frente al Lago  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_ CORREO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: \_\_\_\_\_

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO  ARMADO  EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL  
 COLUMNAS LARGAS  CORTAS  ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO   
 No. PARTES  OTRO \_\_\_\_\_  
 CONDICIONES PARA INGRESAR: Credencial Empresa HORARIO: 8am a 6pm  
 DOCUMENTOS: \_\_\_\_\_ OTROS \_\_\_\_\_

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 20 %  
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Elevador Cabina Medico

CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA  
 CARGA  CAMILLAS  MEDIA 1.10 M  ELEVACIÓN 2.80m  
 DISCAPACITADOS  TIJERA  SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M)  ESTACIONES 2  
 AUTOS  UNDER RAMP  COMPLETA 2.10 M  CAPACIDAD DE CARGA 500kg  
 UNIDAD HIDRÁULICA 2hp

DIMENSIÓN DE FOSO:  
 LARGO 1.45 ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM   
 ANCHO 1.25 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM   
 PROFUNDIDAD 20cm ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM   
 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 0.85 ANCHO 1.25

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA Panel de Seguridad

TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR:

CLIENTE: SI NO  
 FOSO    
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA    
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS    
 TECNORAMPA  
 GUÍA MECÁNICA   
 SOLICITUDES ADICIONALES \_\_\_\_\_

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
 TUBERÍA SI  TUBERÍA  PARED DELGADA   
 NO  CANALETA  GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 INSTALADA  NO INSTALADA  OTRO \_\_\_\_\_

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

ACCESORIOS EXTRAS COSTO   
 ACEPTO COSTO ADICIONAL \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_ FECHA DE TÉRMINO \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

ACABADO DEL ELEVADOR

COLORES Pendiente  
 BLANCO  SILVER METALLIC  METAL DESPLEGADO   
 AZUL / GRIS  PANTONE  CÓDIGO \_\_\_\_\_ LÁMINA PINTRO   
 AZUL / BLANCO  ALUCOBOND COLOR  OTRO \_\_\_\_\_  
 CRISTAL CLARO   
 TINTEX   
 ESMERILADO

SOLICITUD ADICIONAL: \_\_\_\_\_  
 ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR  
 TECNORAMPA \_\_\_\_\_ NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE Yolanda Velozquez



**NOTA:**

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCION AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

**NOTA:**

REVISÉ Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

**OBSERVACIONES GENERALES:**

Braille  
Paro de emergencia con llave

estructura acero


firme de concreto existente

10cm VERIFICAR

**DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN**

110 V  220V  GENERADOR


**FOSO**

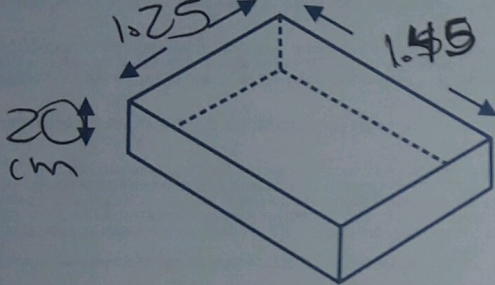

Muro

**CABINA**

0.85




1.25

**INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA**

**BOTONERAS**

PEDESTAL  SOBREPUESTAS  DISTANCIA APROXIMADA  ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA  EMPOTRADAS  CANALIZADAS POR TECNORAMPA  3m



1.45

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

sawirazo gto@hotmail.com. OH

**NOTA:**

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

*[Signature]*  
TECNORAMPA

*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE  
Ysaura Velázquez
