

BLVD. HIDALGO #177 A COL. CENTRO
C.P. 76800 SAN JUAN DEL RIO, QRO.

LADA SIN COSTO:
01 800 6330 332, 01 800 8380 850
atencionclientes@tecnorampa.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: Robin Milward FECHA: 3- Abril-17
 RAZÓN SOCIAL: _____
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Calle Cenada, #8 Barza col Centro
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: San Miguel de Alende
Frente a Parque Benito TELÉFONO: _____ CORREO: _____
Juarez Limitado

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: _____

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
 COLUMNAS LARGAS CORTAS ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
 No. PARTES 2 OTRO _____
 CONDICIONES PARA INGRESAR: Credencial Empresa HORARIO: 8am a 6pm
 DOCUMENTOS: _____ OTROS _____

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 90 %
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Elevadores discapacitados Cab. semicompleta

CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA
 CARGA CAMILLAS MEDIA 1.10 M ELEVACIÓN 3.90
 DISCAPACITADOS TIJERA SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M) ESTACIONES 2
 AUTOS UNDER RAMP COMPLETA 2.10 M CAPACIDAD DE CARGA 500 Kg
 UNIDAD HIDRÁULICA 2hp

DIMENSIÓN DE FOSO:
 LARGO 1.40 ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM
 ANCHO 1.05 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM
 PROFUNDIDAD 20 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM
 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.00 ANCHO 0.85

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA Pa

TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR:

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|
| CLIENTE: | SI | NO | TECNORAMPA |
| FOSO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | GUÍA MECÁNICA <input checked="" type="checkbox"/> |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | SOLICITUDES ADICIONALES _____ |
| CANALIZACIÓN DE BOTONERAS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

| | |
|--|---|
| TUBERÍA | PARED |
| SI <input checked="" type="checkbox"/> TUBERÍA <input checked="" type="checkbox"/> | DELGADA <input checked="" type="checkbox"/> |
| NO <input type="checkbox"/> CANALETA <input type="checkbox"/> | GRUESA <input type="checkbox"/> |

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA NO INSTALADA OTRO
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO
 ACEPTO COSTO ADICIONAL _____

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

FECHA DE TÉRMINO _____ FIRMA _____

NOMBRE Y FIRMA _____

ACABADO DEL ELEVADOR

| | | |
|---|---|--|
| COLORES | CÓDIGO | CRISTAL |
| BLANCO <input type="checkbox"/> SILVER METALLIC <input checked="" type="checkbox"/> | METAL DESPLEGADO <input type="checkbox"/> | CLARO <input type="checkbox"/> |
| AZUL / GRIS <input type="checkbox"/> PANTONE <input type="checkbox"/> | LÁMINA PINTRO <input type="checkbox"/> | TINTEX <input type="checkbox"/> |
| AZUL / BLANCO <input type="checkbox"/> ALUCOBOND COLOR <input type="checkbox"/> | OTRO _____ | ESMERILADO <input checked="" type="checkbox"/> |

SOLICITUD ADICIONAL: _____

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

[Signature]
TECNORAMPA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOTA:

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCION AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA:

REVISÉ Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.


OBSERVACIONES GENERALES:

*Para Emergencias con llave
3 chapas magnéticas (1 cabina, 2 pta cliente)
Braille*


DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN

110 V 220V GENERADOR

FOSO

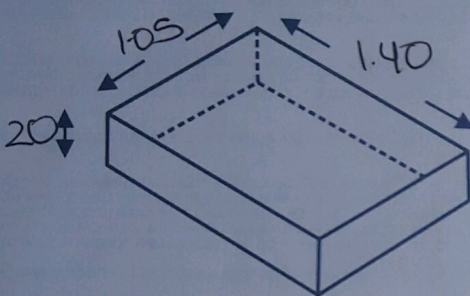

CABINA

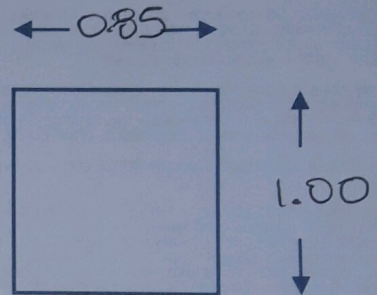


INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

BOTONERAS

PEDESTAL EMPOTRADAS
SOBREPUESTAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 4m

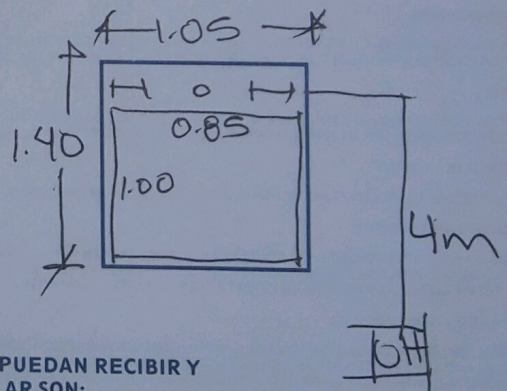

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

[Handwritten signature]
TECNORAMPA

[Handwritten signature]
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
