

BLVD. HIDALGO #177 A COL. CENTRO  
C.P. 76800 SAN JUAN DEL RIO, QRO.

LADA SIN COSTO:  
01 800 6330 332, 01 800 8380 850  
atencionclientes@tecnorampa.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: ROBERTO MIRANDA FECHA: 16/MAY/2018  
RAZÓN SOCIAL: 292 PISCIS S.A DE C.V.  
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: NARCISO MENDOZA #1 COL LOMAS AVILA CAMACHO, NAUCALPAN  
REFERENCIA DE DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_  
TELÉFONO: \_\_\_\_\_ CORREO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: \_\_\_\_\_

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ☐ ARMADO ☒ EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL  
COLUMNAS LARGAS ☒ CORTAS ☐ ZAPATOS ☒ CHALECO ☒ LENTES ☒ CASCO ☒  
No. PARTES: ☐ OTRO \_\_\_\_\_  
CONDICIONES PARA INGRESAR: \_\_\_\_\_ HORARIO: \_\_\_\_\_  
DOCUMENTOS: \_\_\_\_\_ OTROS \_\_\_\_\_

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 80 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: ELEVADOR DE PLATAFORMA / ESPECIAL

CLASIFICACIÓN

CARGA ☐ CAMILLAS ☐  
DISCAPACITADOS ☐ TIJERA ☐  
AUTOS ☒ UNDER RAMP ☐

TIPO DE CABINA

MEDIA 1.10 M ☐  
SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M) ☐  
COMPLETA 2.10 M ☐

ELEVACIÓN 5.25  
ESTACIONES 3 TIRES  
CAPACIDAD DE CARGA 3500 KG  
UNIDAD HIDRÁULICA 10 HP

DIMENSIÓN DE FOSO:

LARGO 5.82 m  
ANCHO 3.60 m  
PROFUNDIDAD 0.97 m

ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM ☐  
ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM ☐  
ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM ☒  
DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 5.62 ANCHO 2.90

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM<sup>2</sup>. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA \_\_\_\_\_

TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR:

CLIENTE:

FOSO ☒ SI ☐ NO  
INSTALACIÓN ELÉCTRICA ☐ ☒  
CANALIZACIÓN DE BOTONERAS ☐ ☒

TECNORAMPA

GUÍA MECÁNICA ☒  
SOLICITUDES ADICIONALES \_\_\_\_\_

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA ☒

TUBERÍA SI ☒ TUBERÍA ☐ DELGADA ☒  
NO ☐ CANALETA ☐ GRUESA ☐

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA ☐ NO INSTALADA ☒ OTRO ☐  
ACCESORIOS EXTRAS COSTO ☐  
ACEPTO COSTO ADICIONAL \_\_\_\_\_

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

FECHA DE TÉRMINO \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

COLORES

BLANCO ☐ SILVER METALLIC ☐  
AZUL / GRIS ☐ PANTONE ☐  
AZUL / BLANCO ☐ ALUCOBOND COLOR ☐  
SOLICITUD ADICIONAL: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA

METAL DESPLEGADO ☐  
LÁMINA PINTO ☐  
OTRO \_\_\_\_\_

CRISTAL

CLARO ☐  
TINTEX ☐  
ESMERILADO ☐

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

ROBERTO MIRANDA  
TECNORAMPA



**NOTA:**

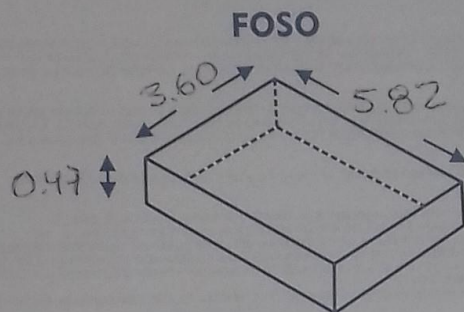

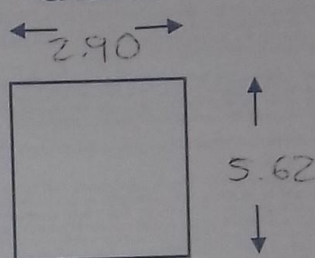
SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCION AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

**NOTA:**

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

**OBSERVACIONES GENERALES:**

3 ACCESOS, 3 TORRETAS, 3 LLAMADORAS,  
3 SENSORES, PROYECTO ESPECIAL, NO INCLUYE GUILLOTINAS


**DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN**110 V ☐220V ☐GENERADOR ☐**FOSO****INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA****CABINA****BOTONERAS**PEDESTAL ☐SOBREPUESTAS ☐

DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA

☐ EMPOTRADAS☒ CANALIZADAS POR TECNORAMPA5 M

80%  
SOTANO 2



↑↓ = SOTANO 1  
↑↓ = SOTANO 2

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

**NOTA:**  
PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO.  
CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

ANDRÉS EVELIN ALVARADO  
TECNORAMPA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
