

BLVD. HIDALGO #177 A COL. CENTRO
C.P. 76800 SAN JUAN DEL RIO, QRO.

LADA SIN COSTO:
01 800 6330 332, 01 800 8380 850
atencionclientes@tecnorampa.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: Tere Castro FECHA: 06-jul-18
RAZÓN SOCIAL: Productos y Servicios del Centro S.A. de C.V.
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Av. Venustiano Carranza #1815 Col. Jardín
REFERENCIA DE DIRECCIÓN: Museo Francisco Carrasco (Casa de la cultura San Luis Potosí) TELÉFONO: 4441733967 CORREO: tcastro@pysc.com.mx

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: Lugar Histórico en San Luis Potosí
acceso amplio. Llegar por calle Juan de Oñate

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ☐ ARMADO ☒ EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
COLUMNAS LARGAS ☒ CORTAS ☐ ZAPATOS ☒ CHALECO ☒ LENTES ☐ CASCO ☒
No. PARTES 1 OTRO _____

CONDICIONES PARA INGRESAR: Identificación Empresa HORARIO: 11am - 5pm

DOCUMENTOS: INE OTROS _____

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 0 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Cabina media altura de recorrido menor a 3m, 1.30 x 1.30

CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA
CARGA ☐ CAMILLAS ☐ MEDIA 1.10 M ☒ ELEVACIÓN 2.33
DISCAPACITADOS ☒ TIJERA ☐ SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M) ☐ ESTACIONES 2
AUTOS ☐ UNDER RAMP ☐ COMPLETA 2.10 M ☐ CAPACIDAD DE CARGA 500kg
UNIDAD HIDRÁULICA 2HP

DIMENSIÓN DE FOSO: ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM ☐
LARGO 1.50m ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM ☐
ANCHO 1.75m ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM ☐
PROFUNDIDAD 20cm DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.30m ANCHO 1.30m

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA Panel Seguridad, Amortiguadores (cotizar)

TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR:

CLIENTE: SI NO TECNORAMPA
FOSO ☒ ☐ GUÍA MECÁNICA ☒
INSTALACIÓN ELÉCTRICA ☒ ☐ SOLICITUDES ADICIONALES _____
CANALIZACIÓN DE BOTONERAS ☒ ☐

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA ☒
INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

TUBERÍA PARED
SI ☒ TUBERÍA ☒ DELGADA ☒
NO ☐ CANALETA ☐ GRUESA ☐

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA ☐ NO INSTALADA ☒ OTRO
ACCESORIOS EXTRAS COSTO ☐
ACEPTO COSTO ADICIONAL _____

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

Ing. Tere Castro

NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE TÉRMINO

FIRMA

ACABADO DEL ELEVADOR

COLORES CRISTAL
BLANCO ☐ SILVER METALLIC ☒ METAL DESPLEGADO ☐ CLARO ☒
AZUL / GRIS ☐ PANTONE ☐ CÓDIGO _____ LÁMINA PINTRO ☐ TINTEX ☐
AZUL / BLANCO ☐ ALUCOBOND COLOR ☐ OTRO _____ ESMERILADO ☐
SOLICITUD ADICIONAL: _____

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

TECNORAMPA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOTA:

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCION AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

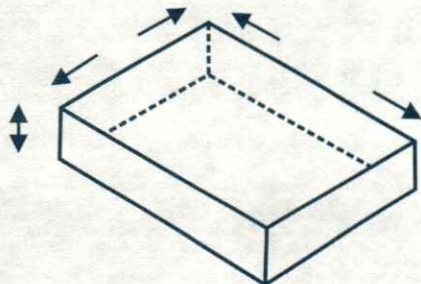
NOTA:

REVISÉ Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.


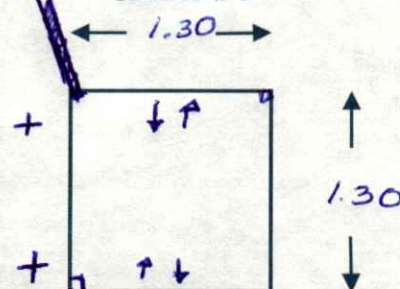
OBSERVACIONES GENERALES:**DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN**110 V ☒220V ☒GENERADOR ☒

* si hay

corriente a 220V

FOSO**INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA****BOTONERAS**PEDESTAL ☐SOBREPUESTAS ☐

DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 1.50m - 2.00m☒ EMPOTRADAS☐ CANALIZADAS POR TECNORAMPA**CABINA**

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

Aug. Teie Castro

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

NOMBRE:

MARIA TERESA CASTRO RAMIREZ

FIRMA:

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

LUIS ALTEAGA
TECNORAMPA

MARIA TERESA CASTRO RAMIREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
