

BLVD. HIDALGO #177 A COL. CENTRO
C.P. 76800 SAN JUAN DEL RIO, QRO.

LADA SIN COSTO:
01 800 6330 332, 01 800 8380 850
atencionclientes@tecnorampa.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: Irono Modina FECHA: 28/Junio/2018
RAZÓN SOCIAL: Constructora y desarrolladora de inmuebles
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Desarrollo grupo Vidanta, Nuevo Vallarta, Jalisco.
REFERENCIA DE DIRECCIÓN: _____

TELÉFONO: _____

CORREO: _____

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: Acceso complicado, traer rodín para descarga, área interior por lo que el camión dejará abajo.

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ☒ ARMADO ☐

COLUMNAS LARGAS ☒ CORTAS ☐

No. PARTES ☐ se recomienda 2 partes.

EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL

ZAPATOS ☒ CHALECO ☒ LENTES ☒ CASCO ☒

OTRO ☐

CONDICIONES PARA INGRESAR: _____

HORARIO: 8:00 pm - 6:00 pm

DOCUMENTOS: Altas del seguro

OTROS: haz extras en caso de ser necesario.

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 40 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Elevador de carga

CLASIFICACIÓN

CARGA ☒ CAMILLAS ☐
DISCAPACITADOS ☐ TIJERA ☐
AUTOS ☐ UNDER RAMP ☐

TIPO DE CABINA

MEDIA 1.10 M ☐
SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M) ☒
COMPLETA 2.10 M ☐

ELEVACIÓN 4.50 m
ESTACIONES 2 est.
CAPACIDAD DE CARGA 2000 kg
UNIDAD HIDRÁULICA 10 Hp.

DIMENSIÓN DE FOSO:

LARGO 3.60 m

ANCHO 3.60 m

PROFUNDIDAD 0.40 m.

ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM ☐

ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM ☐

ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM ☒

DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 3.40 ANCHO 2.80

*Verificar si es posible.

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA El cliente solicita notificar puertos exteriores con sensores y chapas.

TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR:

CLIENTE:

SI NO
FOSO ☒ ☐
INSTALACIÓN ELÉCTRICA ☒ ☐
CANALIZACIÓN DE BOTONERAS ☒ ☐

TECNORAMPA

GUÍA MECÁNICA ☒
SOLICITUDES ADICIONALES Adaptar a notificar.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA ☒

INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

TUBERÍA

SI ☒ TUBERÍA ☒ PARED DELGADA ☐
NO ☐ CANALETA ☐ GRUESA ☒

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA ☐ NO INSTALADA ☒ OTRO ☐

ACCESORIOS EXTRAS COSTO ☐

ACEPTO COSTO ADICIONAL se revisara costo.

NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE TÉRMINO

FIRMA

ACABADO DEL ELEVADOR PTC.

COLORES

BLANCO ☐ SILVER METALLIC ☐
AZUL / GRIS ☐ PANTONE ☐ CÓDIGO _____
AZUL / BLANCO ☐ ALUCOBOND COLOR ☐

METAL DESPLEGADO ☐
LÁMINA PINTRO ☐
OTRO ☐

CRISTAL

CLARO ☐
TINTEX ☐
ESMERILADO ☐

SOLICITUD ADICIONAL: _____

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

TECNORAMPA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

28.06.2018.

NOTA:

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCION AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO
PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE
DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA:

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.


OBSERVACIONES GENERALES:

OBSERVACIONES GENERALES: - El cliente ajustara accesos a 2.30m de altura.
- Demolir sobresalientes en cubo para dejar 3.60x3.60m. libre

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN

110 V ☐220V ☒

GENERADOR ☐

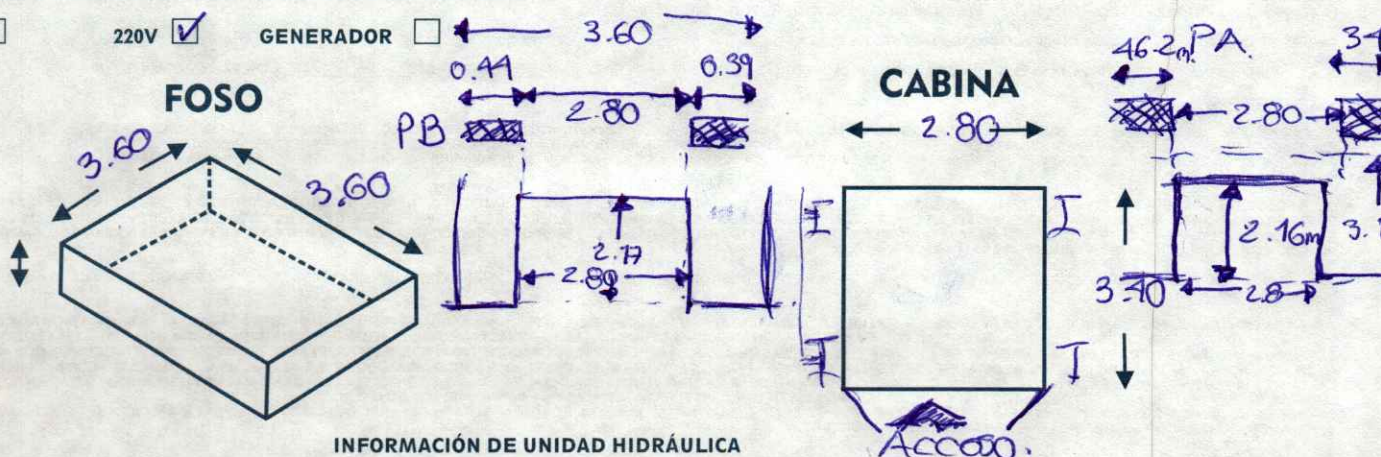

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

BOTONERAS

PEDESTAL

SOBREPUESTAS

DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA

☐ EMPOTRADAS

 CANALIZADAS POR TECNORAMPA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 5.00m

Considerar armazens despojados de um espaço de 3.80m X 3.00m.

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO.

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

28.06.2018

TECNORAMPA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
