

BLVD. HIDALGO #177 A COL. CENTRO  
C.P. 76800 SAN JUAN DEL RIO, QRO.

LADA SIN COSTO:  
01 800 6330 332, 01 800 8380 850  
atencionclientes@tecnorampa.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: Irone Modina FECHA: 27/ Junio/2018  
RAZÓN SOCIAL: Constructora y desarrolladora de inmuebles  
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Desarrollo grupo Vidanta, Nuevo Vallarta, Jalisco.  
REFERENCIA DE DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_  
TELÉFONO: \_\_\_\_\_ CORREO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: Acceso estrecho, zona de bodega con anaqueles.

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ☒ ARMADO ☐  
COLUMNAS LARGAS ☒ CORTAS ☐  
EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL  
ZAPATOS ☒ CHALECO ☒ LENTES ☒ CASCO ☒  
No. PARTES ☐ OTRO ☐

CONDICIONES PARA INGRESAR: Trapo patin para descarga HORARIO: 8:00am - 6:00pm.

DOCUMENTOS: Altos del IMSS anticipados. OTROS hr. extras en caso de ser necesario

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 80 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Elevador de carga 500 Kg de capacidad.

CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA  
CARGA ☒ CAMILLAS ☐ MEDIA 1.10 M ☐  
DISCAPACITADOS ☐ TIJERA ☐ SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M) ☒  
AUTOS ☐ UNDER RAMP ☐ COMPLETA 2.10 M ☐  
ELEVACIÓN 2.90m  
ESTACIONES 2 est  
CAPACIDAD DE CARGA 500Kg  
UNIDAD HIDRÁULICA 2Hp.

DIMENSIÓN DE FOSO:  
LARGO 1.47m  
ANCHO 1.72m  
PROFUNDIDAD 0.30m.  
ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM ☐  
ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM ☒ 30cm.  
ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM ☐  
DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.25m ANCHO 1.25m.

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA Incluir panel de seguridad, amortiguadores.

## TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR:

CLIENTE: SI NO  
FOSO ☒ ☐  
INSTALACIÓN ELÉCTRICA ☒ ☐  
CANALIZACIÓN DE BOTONERAS ☒ ☐

TECNORAMPA  
GUÍA MECÁNICA ☒  
SOLICITUDES ADICIONALES \_\_\_\_\_

## ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA ☒  
INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

TUBERÍA SI ☒ TUBERÍA ☐  
NO ☐ CANALETA ☐  
PARED DELGADA ☐  
GRUESA ☒

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
INSTALADA ☐ NO INSTALADA ☒ OTRO  
ACCESORIOS EXTRAS COSTO ☐  
ACEPTO COSTO ADICIONAL \_\_\_\_\_

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE TÉRMINO

FIRMA

## ACABADO DEL ELEVADOR PTG.

COLORES  
BLANCO ☐ SILVER METALLIC ☐ METAL DESPLEGADO ☐  
AZUL / GRIS ☐ PANTONE ☐ LÁMINA PINTRO ☐  
AZUL / BLANCO ☐ ALUCOBOND COLOR ☐ OTRO ☐  
CRISTAL  
CLARO ☐  
TINTEX ☐  
ESMERILADO ☐

SOLICITUD ADICIONAL: \_\_\_\_\_

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

Ara Mariana Olvera.  
TECNORAMPA

28.06.2018  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

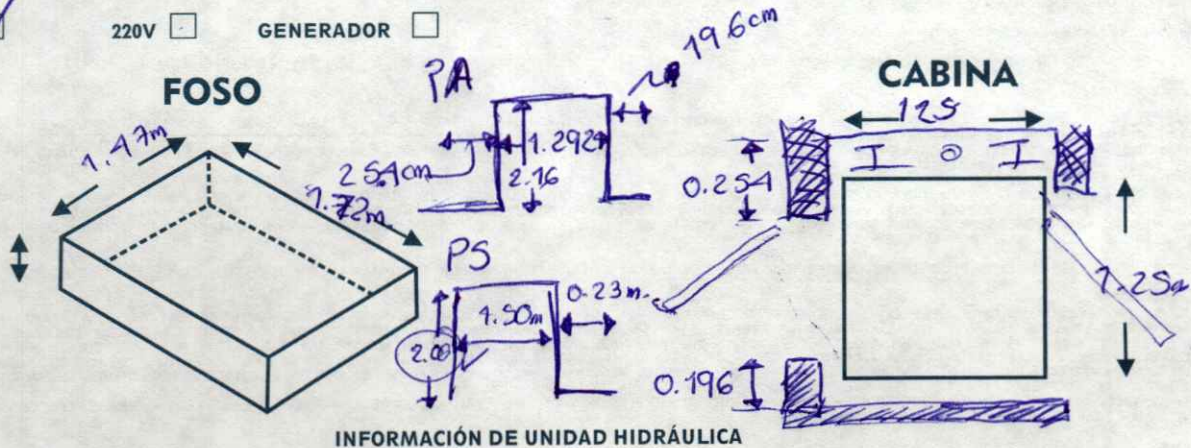


**NOTA:**

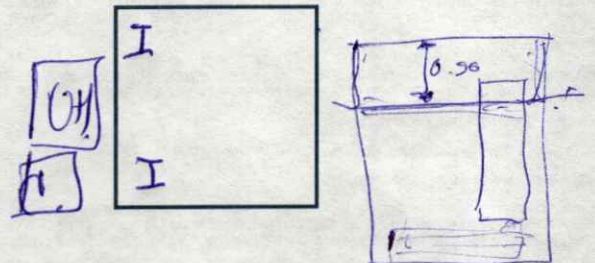
SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCION AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

**NOTA:**

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

**OBSERVACIONES GENERALES:****DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN**110 V ☒220V ☐GENERADOR ☐**BOTONERAS**PEDESTAL ☐SOBREPUESTAS ☒

DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 5.00m.☐ EMPOTRADAS☒ CANALIZADAS POR TECNORAMPA

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

**NOTA:**

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

Arq. Mariana Olvera  
TECNORAMPA

28.06.2018  
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
