

BLVD. HIDALGO #177 A COL. CENTRO  
C.P. 76800 SAN JUAN DEL RIO, QRO.

LADA SIN COSTO:  
01 800 6330 332, 01 800 8380 850  
atencionclientes@tecnorampa.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: Jaime Alejandro Cepado Olivares FECHA: 25-jun-18  
RAZÓN SOCIAL: Colectivo D+A S. de RL de CV  
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Avenida Avenida 5551 Interior 41A, Ponterredia  
REFERENCIA DE DIRECCIÓN: Detras del Hotel Hyatt Andares  
TELÉFONO: 3310433494 CORREO: jaimcegado@colectivodearquitecturas.com

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: Fraccionamiento Residencial  
acceso reducido

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ☒ ARMADO ☐ EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL  
COLUMNAS LARGAS ☐ CORTAS ☒ ZAPATOS ☒ CHALECO ☒ LENTES ☒ CASCO ☒  
No. PARTES 2 OTRO \_\_\_\_\_

CONDICIONES PARA INGRESAR: Licencia de Conducir Chofev HORARIO: 9am - 5pm

DOCUMENTOS: Identificación OTROS \_\_\_\_\_

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 70 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Elevador Cabina Crew estandar 2 estaciones

CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA  
CARGA ☐ CAMILLAS ☐ MEDIA 1.10 M ☐ ELEVACIÓN 3.70m  
DISCAPACITADOS ☒ TIJERA ☐ SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M) ☐ ESTACIONES 2 estaciones  
AUTOS ☐ UNDER RAMP ☐ COMPLETA 2.10 M ☒ CAPACIDAD DE CARGA 500kg  
UNIDAD HIDRÁULICA 2HP

DIMENSIÓN DE FOSO:  
LARGO 1.30m ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM ☐  
ANCHO 1.75m ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM ☐  
PROFUNDIDAD 0.20m ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM ☐  
DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.25 ANCHO 1.25

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA \_\_\_\_\_

## TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR:

CLIENTE: SI NO TECNORAMPA  
FOSO ☐ ☒ GUÍA MECÁNICA ☒  
INSTALACIÓN ELÉCTRICA ☐ ☒ SOLICITUDES ADICIONALES \_\_\_\_\_  
CANALIZACIÓN DE BOTONERAS ☐ ☒

## ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA ☒  
INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
TUBERÍA SI ☒ TUBERÍA ☒ PARED  
NO ☐ CANALETA ☐ DELGADA ☒  
GRUESA ☐

## ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA ☐ NO INSTALADA ☒ OTRO  
ACCESORIOS EXTRAS COSTO ☐  
ACEPTO COSTO ADICIONAL \_\_\_\_\_

## RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

Arg. Jaime Cepado

NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE TÉRMINO

FIRMA

## ACABADO DEL ELEVADOR

COLORES BLANCO ☐ SILVER METALLIC ☒ METAL DESPLEGADO ☐ CRISTAL  
AZUL / GRIS ☐ PANTONE ☐ CÓDIGO \_\_\_\_\_ LÁMINA PINTRO ☐ CLARO ☒  
AZUL / BLANCO ☐ ALUCOBOND COLOR ☐ OTRO \_\_\_\_\_ ESMERILADO ☐  
SOLICITUD ADICIONAL: \_\_\_\_\_

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

Jaime Cepado  
TECNORAMPA

Jaime Alejandro Cepado Olivares  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE



**NOTA:**

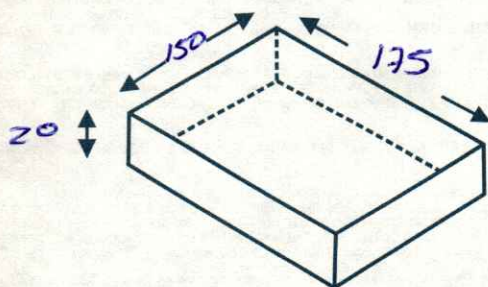
SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCION AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

**NOTA:**



REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

**OBSERVACIONES GENERALES:**


*Aplanados de mero, canalización de botoneras, instalar centro de carga. Fume para OH por parte del cliente*

**DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN**110 V ☒220V ☒GENERADOR ☐**FOSO****CABINA**

← 1.25 →

**INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA****BOTONERAS**PEDESTAL ☐SOBREPUESTAS ☐

DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 1 metro☒ EMPOTRADAS☐ CANALIZADAS POR TECNORAMPA

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

*Ismael Orozco Avila y/o Juan Sanchez*

**NOTA:**

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

NOMBRE: JAIME ALEJANDRO COPADO OLIVARES

FIRMA:

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

TECNORAMPA

JAIME A. COPADO OLIVARES

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
