

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO
 TEC080710M22
 Tels.: 01(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecnorampa.com.mx
 0142772728119
 LADA SIN COSTO:
 018006230332

NOMBRE DEL CLIENTE: Leopoldo Almaraz Cuellar FECHA: _____
 RAZÓN SOCIAL: GRUPO Aguacateño Mexicano S de RL de CV.
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: K I Carr. Perihan - Oruapan S/A
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: Perihan Mich.
17374-6636 TELÉFONO: _____ CORREO: _____

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: _____

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
 COLUMNAS LARGAS CORTAS ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
 No. PARTES OTRO 8 am - 6 pm
 CONDICIONES PARA INGRESAR: INE.
 DOCUMENTOS: IMS
 AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 70 %
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: _____

CLASIFICACIÓN CARGA CAMILLAS
 DISCAPACITADOS TIJERAS
 AUTOS UNDER RAMP

TIPO DE CABINA MEDIDA 1.10M ELEVACIÓN 6.20
 SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10M) ESTACIONES 3
 COMPLETA 2.10M CAPACIDAD DE CARGA 5000 KG
 UNIDAD HIDRÁULICA 13HP
20 HP

DIMENSIÓN DE FOSO: ELEVADORES DE TIJERA, 45CM
 LARGO 4.95 - ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM
 ANCHO 4.50 - ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM
 PROFUNDIDAD 0.60 - DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 4.75 ANCHO 3.70

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA _____

TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:

CLIENTE: SI NO
 FOSO
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

TECNORAMPA
 GUÍA MECÁNICA
 SOLICITUDES ADICIONALES _____

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

TUBERÍA PARED
 SI TUBERÍA DELGADA
 NO CANALETA GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA NO INSTALADA
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: _____

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

 NOMBRE Y FIRMA FECHA DE TÉRMINO FIRMA

ACABADO DE ELEVADOR

COLORES BLANCO SILVER METALLIC
 AZUL/GRIS PANTONE CÓDIGO _____
 AZUL/BLANCO ALUCOBOND COLOR

CRISTAL METAL DESPLEGADO CLARO
 LÁMINA PINTOR TINTEX
 OTRO _____ ESMERILADO

SOLICITUD ADICIONAL: _____
 ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR
Arg Salvador Silve
 TECNORAMPA NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOTA

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIR LOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES:



Ativa minima de cabina 2.80m Libre
3.00m Ideal

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN

110 V

220 V

GENERADOR

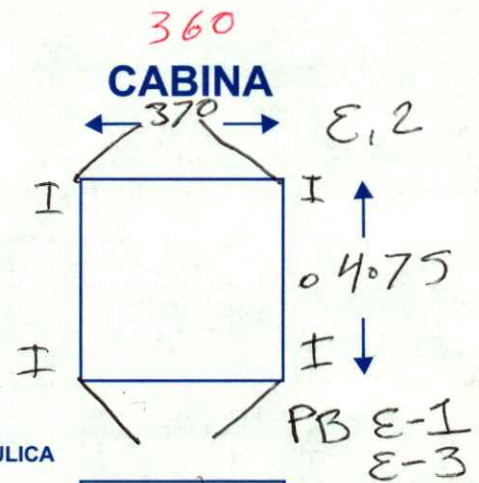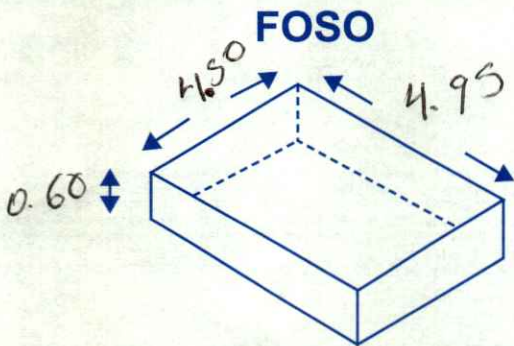

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

BOTONERAS


PEDESTAL de los dos

SOBREPUESTAS TIPOS

DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 5 mts.

EMPOTRADAS
 CANALIZADAS POR TECNORAMPA



EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

NOTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: _____

TELÉFONO 1): _____

CONTACTO 2): _____

TELÉFONO 2): _____

J. Salvador Silva
TECNORAMPA

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
