

AUTOPISTA MEXICO - QUERÉTARO  
 Km. 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO  
 TEC080710M22  
 Tels.: 01(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecorampa.com.mx  
 0142772728119  
 LADA SIN COSTO:  
 018006230332

COT. 15588

NOMBRE DEL CLIENTE: Acq. Oscar Leal FECHA: 19 JUNIO 2020  
 RAZÓN SOCIAL: DE LA PIEDRA INGENIEROS MEXICO SA DE CV.  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CALLE PELEANDI S/N, COL. EL MEDANO CABO SAN LUCAS CP. 23453  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: CTE. 1644 TELÉFONO: 624-171-6096 CORREO: O. LEAL @ DE LA PIEDRA INGENIEROS .COM

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN:

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO  ARMADO   
 COLUMNAS LARGAS  CORTAS   
 No. PARTES  2 PARTES  
 EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO   
 OTRO  
 CONDICIONES PARA INGRESAR: AVANAR AL Acq. Oscar Leal  
 DOCUMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 70 %  
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: PLATAFORMA DE AUTOS

CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA  
 CARGA  CAMILLAS  MEDIDA 1.10M   
 DISCAPACITADOS  TIJERAS  SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10M)   
 AUTOS  UNDER RAMP  COMPLETA 2.10M   
 ELEVACIÓN 23' 10" 5/16 (7.30mts)  
 ESTACIONES 3  
 CAPACIDAD DE CARGA 3500kg.  
 UNIDAD HIDRÁULICA 10HP

DIMENSIÓN DE FOSO: ELEVADORES DE TIJERA, 45CM   
 LARGO 5.99 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM   
 ANCHO 3.30 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM   
 PROFUNDIDAD 51-60 TIENE RECORRETE  DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO ANCHO

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA

TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:

CLIENTE: SI NO  
 FOSO    
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA    
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS    
 TECNORAMPA  
 GUÍA MECÁNICA   
 SOLICITUDES ADICIONALES

742-113-47-47 Ing. Julio Cesar (CARR) ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

TUBERÍA PARED  
 SI  TUBERÍA  DELGADA   
 NO  CANALETA  GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 INSTALADA  NO INSTALADA   
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO   
 ACEPTO COSTO ADICIONAL:  
 RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

NOMBRE Y FIRMA FECHA DE TÉRMINO FIRMA

ACABADO DE ELEVADOR  
 COLORES POL DEFINID  
 BLANCO  SILVER METALLIC   
 AZUL/GRIS  PANTONE  CÓDIGO  
 AZUL/BLANCO  ALUCOBOND COLOR   
 SOLICITUD ADICIONAL:  
 METAL DESPLEGADO  CRISTAL CLARO   
 LÁMINA PINTOR  TINTEX   
 OTRO  ESMERILADO

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICA Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

TECNORAMPA  
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE  
 Acq. Oscar Leal DLPIM



8734

NOTA

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIR LOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: -- Levijios de foso altura 55cm - con p.p. 60cm.





\* CORTAR PUERTA PLEGADIZA DE ROTAFORMA.

\* PERSONAL AFECTADO Y EQUIPO


MANUAL USUARIA DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN

110 V  220 V  GENERADOR

Columna 170 de concreto entra al foso 23cm.

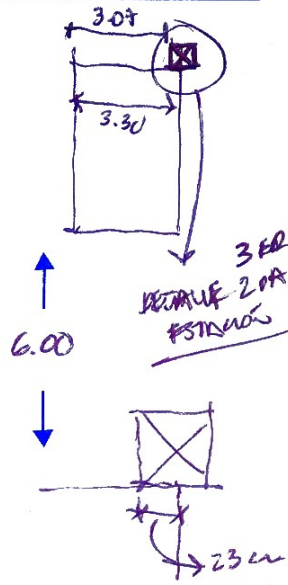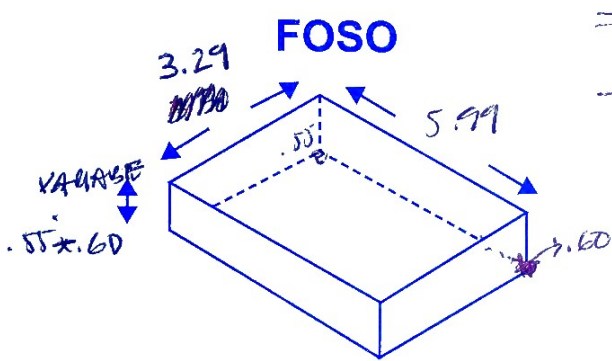

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA



BOTONERAS

- PEDESTAL  EMPOTRADAS 
SOBREPUESTAS  CANALIZADAS POR TECNORAMPA

DISTANCIA APROXIMADA ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 3.00 m

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDE RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

\_\_\_\_\_

NOTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: \_\_\_\_\_ TELÉFONO 1): \_\_\_\_\_
CONTACTO 2): \_\_\_\_\_ TELÉFONO 2): \_\_\_\_\_

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

TECNORAMPA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
Arq. Oscar Leal DLPIM
