

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO
 TEC080710M22
 Tels.:(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecorampa.com.mx
 4272728119
 LADA SIN COSTO:
 800 623 0332

Nº 20201

NOMBRE DEL CLIENTE: ARQ GERSON MORALES FECHA: 21 JUNIO 2021
 RAZÓN SOCIAL: _____
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: ANDADOR EL CARMEN, ESQUINA CON CALLE
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: CUAYTEMOC PAJA. 29200 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
CHIAPAS TELÉFONO: 967 6725800 CORREO: _____

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: ACCESO LIMITADO A HORARIO DE 6 a 8 am.

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
 COLUMNAS LARGAS CORTAS ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
 No. PARTES OTRO _____

CONDICIONES PARA INGRESAR: HORARIO DE DESARMA 6 am a 8 am.
 DOCUMENTOS: _____

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 50 %
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: ELEVADOR CABINA GEM COMPLETA

CLASIFICACIÓN		TIPO DE CABINA			
CARGA <input type="checkbox"/>	CAMILLAS <input type="checkbox"/>	MEDIDA 1.10 M <input type="checkbox"/>	ELEVACIÓN <u>4.20</u>		
DISCAPACITADOS <input checked="" type="checkbox"/>	TIJERAS <input type="checkbox"/>	SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M) <input checked="" type="checkbox"/>	ESTACIONES <u>2</u>		
AUTOS <input type="checkbox"/>	UNDER RAMP <input type="checkbox"/>	COMPLETA 2.10 M <input type="checkbox"/>	CAPACIDAD DE CARGA <u>500 kg</u>		
			UNIDAD HIDRÁULICA <u>2 HP.</u>		

DIMENSIÓN DE FOSO: ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM
 LARGO 2.00 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM
 ANCHO 1.05 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM
 PROFUNDIDAD 60 cm DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.55 ANCHO .85

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM². ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
 COMPONENTES EXTRA COJINAR ELECTROIMANES. Y SENSOR CABINA.

TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:

CLIENTE:	SI NO	TECNORAMPA
FOSO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	GUÍA MECÁNICA <input type="checkbox"/> - PENDIENTE
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	SOLICITUDES ADICIONALES <u>EMPUJAR</u>
CANALIZACIÓN DE BOTONERAS	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<u>BOTONERA A SU ESTRUCTURA EXISTENTE.</u>

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA TUBERÍA PARED
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA SI TUBERÍA DELGADA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA NO CANALETA GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA
 INSTALADA NO INSTALADA
 ACCESORIOS EXTRAS COSTOS
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: _____

 NOMBRE Y FIRMA FECHA DE TÉRMINO FIRMA

ACABADO DE ELEVADOR

COLORES	NEGR0 <input checked="" type="checkbox"/>	CRISTAL
BLANCO <input type="checkbox"/>	SILVER METALLIC <input type="checkbox"/>	CLARO <input checked="" type="checkbox"/> <u>NO AL POSTO DEL EQUIPO.</u>
AZUL/GRIS <input type="checkbox"/>	PANTONE <input type="checkbox"/>	TINTEX <input type="checkbox"/>
AZUL/BLANCO <input type="checkbox"/>	ALUCOBOND COLOR <input type="checkbox"/>	ESMERILADO <input checked="" type="checkbox"/> <u>EN PARTE</u>

SOLICITUD ADICIONAL: _____
 ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR
ARQ GERSON MORALES 21 JUNIO 2021
 TECNORAMPA IVAN DE JESUS LOPEZ REVER
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOTA

Nº 20201

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

-A CLIENTE SE COMPROMETE A PETICIÓN EL

OBSERVACIONES GENERALES:


EQUIPO ANTERIOR, ASÍ COMO DELAR ACCESO DE JARCA DE ELEVADOR DE 2mts ATO x .83 ANCHO COPIAR ELECTROIMANES U OPCIÓN SENSORES OPTICOS EN CABINA.

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN


110 V 220 V GENERADOR POR CONFIRMAR

CRISTALES ESM I / CUBO / CUBO / CUBO PUERTAS 180°

FOSO

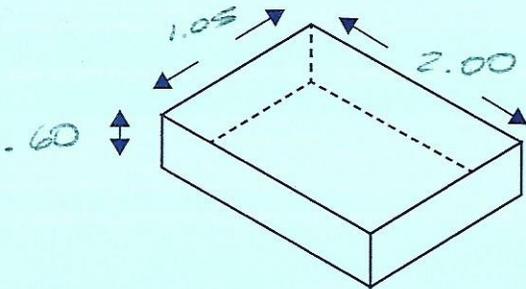


CABINA

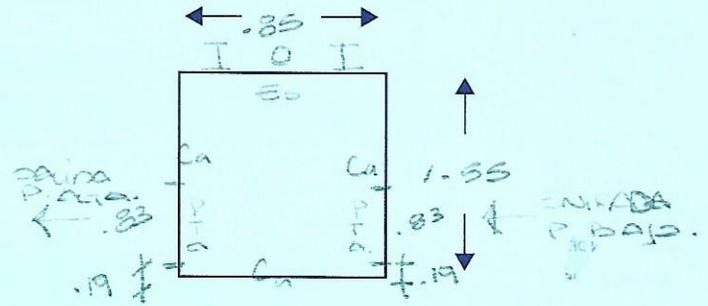

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

BOTONERAS

PEDESTAL SOBREPUESTAS DISTANCIA APROXIMADA 3.00 CABINA SEMI CERRADA. ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 2 HP. EMPOTRADAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

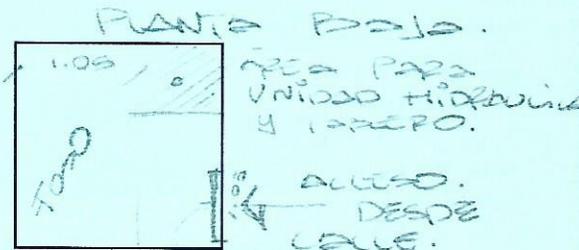

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

JUAN DE JESUS LOPEZ PEREZ - ANA LILIA MORALES SOLRIZ

NOTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: JUAN DE JESUS LOPEZ PEREZ TELÉFONO 1): 967 672 5800 CONTACTO 2): ANA LILIA MORALES SOLRIZ TELÉFONO 2): 967 180 21 61

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

APD Juan Antonio Benitez Cruz TECNORAMPA

JUAN DE JESUS LOPEZ PEREZ NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
