

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO  
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO  
 TEC080710M22  
 Tels.:(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecnorampa.com.mx  
 4272728119  
 LADA SIN COSTO:  
 800 623 0332

Nº 20244

NOMBRE DEL CLIENTE: RAMON CHACON FECHA: 05-07-2022  
 RAZÓN SOCIAL: GRUPO CORPORATIVO PATRIMONIAL  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CALLE REAL DE VALE #10 LOTE 6 SEC 10  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: FRACCIONAMIENTO VISTA REAL, VILLA VERDE, EN PROXIMO, QRO QRO TELÉFONO: 442 322 5030 CORREO: ramon.chacon@grupocorporativopatrimonial.com.mx

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: DOMICILIO PARTICULAR, EN RESIDENCIA PRIVADA, VISTA REAL

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO  ARMADO  EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL  
 COLUMNAS LARGAS  CORTAS  ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO   
 No. PARTES  2 OTRO \_\_\_\_\_

CONDICIONES PARA INGRESAR: CRSA EN CRSA

DOCUMENTOS: DNE DMS

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 90 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: ELEVADOR CABINA SEMICOMPLETA

<b>CLASIFICACIÓN</b>		<b>TIPO DE CABINA</b>			
CARGA <input type="checkbox"/>	CAMILLAS <input type="checkbox"/>	MEDIDA 1.10 M <input type="checkbox"/>	ELEVACIÓN <u>3.15</u>		
DISCAPACITADOS <input checked="" type="checkbox"/>	TIJERAS <input type="checkbox"/>	SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M) <input checked="" type="checkbox"/>	ESTACIONES <u>2</u>		
AUTOS <input type="checkbox"/>	UNDER RAMP <input type="checkbox"/>	COMPLETA 2.10 M <input type="checkbox"/>	CAPACIDAD DE CARGA <u>500kg</u>		
			UNIDAD HIDRÁULICA <u>2 HP.</u>		

DIMENSIÓN DE FOSO:  
 LARGO 1.45 ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM   
 ANCHO 1.39 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM   
 PROFUNDIDAD 0.20 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM   
 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.00 ANCHO 1.19

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM². ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA ELEVADOR 1 MANA PAPA DESPUES DE INSTALACION

**TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:**

CLIENTE: SI NO  
 FOSO    
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA    
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

TECNORAMPA  
 GUÍA MECÁNICA  EN PROCESO  
 SOLICITUDES ADICIONALES \_\_\_\_\_

**ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA**

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

TUBERÍA PARED  
 SI  TUBERÍA  DELGADA   
 NO  CANALETA  GRUESA

**ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

INSTALADA  NO INSTALADA   
 ACCESORIOS EXTRAS COSTOS   
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: \_\_\_\_\_

**RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA**

NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE TÉRMINO

FIRMA

**ACABADO DE ELEVADOR**

COLORES  
 BLANCO  SILVER METALLIC   
 AZUL/GRIS  RANTONE  CÓDIGO \_\_\_\_\_  
 AZUL/BLANCO  ALUCOBOND COLOR

CRISTAL  
 METAL DESPLEGADO  CLARO   
 LÁMINA PINTOR  TINTEX   
 OTRO \_\_\_\_\_ ESMERILADO  TOPOS

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

ARJ JESÚS ANTONIO BENÍTEZ  
 TECNORAMPA

PA  
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE



NOTA

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

- CASA EN CONSTRUCCIÓN, TRAZO MATEMÁTICO

OBSERVACIONES GENERALES: PARA PROFESOR Pisos y PUERTAS.

- DEJAR PREPARACIÓN PARA ELECTRO-IMANES.

- ESPACIO REDUCIDO EN CUBO. - CONTEMPLAR TODAS LAS MEDIDAS PARA LA UNIDAD DE ELEVADOR.



- GENERAR PROPUESTA SIN PUERTAS.

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN


110 V

220 V

GENERADOR

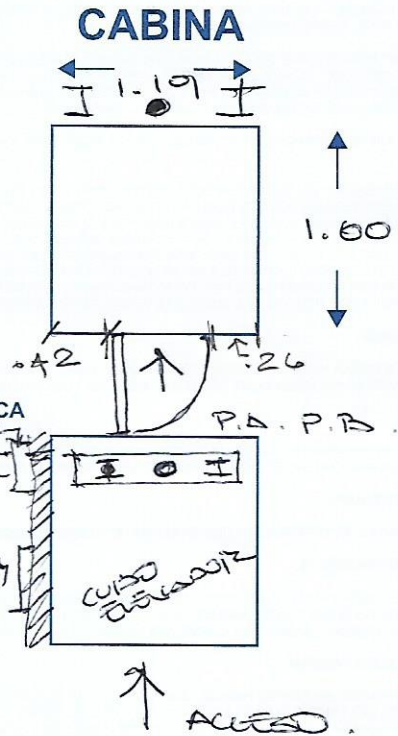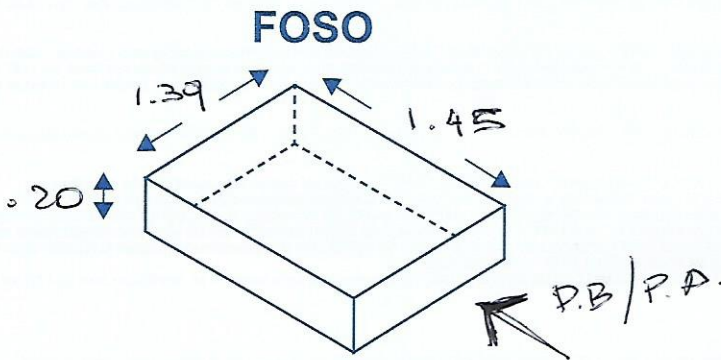

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA



BOTONERAS

PEDESTAL

SOBREPUESTAS

DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 3.00 MTS.

EMPOTRADAS  
 CANALIZADAS POR TECNORAMPA

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: LIC. RAMON CHACON MENDOZA - TELÉFONO 1): 442 322 5030.

CONTACTO 2): ALEJANDRO RAMIREZ. TELÉFONO 2): 442 202 0627.

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

ING. JESÚS A. BENÍTEZ CRUZ. TECNORAMPA

ING. JAVIER SEPULVEDA V.M. NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
