

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO  
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO  
 TEC080710M22  
 Tels.:(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecnorampa.com.mx  
 4272728119  
 LADA SIN COSTO:  
 800 623 0332

Nº 20239

CLIENTE N: 27249

SOL - 19235

NOMBRE DEL CLIENTE: Lic KARME LARA FECHA: 15-06-2022

RAZÓN SOCIAL: ACCO CONSTRUCCIONES

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: BURO JOSE MARIA MORELOS 2055, SAN PABLO 37207 LEON, GTO

REFERENCIA DE DIRECCIÓN: COMITE DIRECTIVO ESTADIA CUANAVAJATO

TELÉFONO: 477 5986989 CORREO: karmelara@accoconstruye.com

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: SE ACCESA POR UN ESTACIONAMIENTO. ES UN EDIFICIO EN USO, LA INSTALACIÓN ES UN SEGUNDO PISO.

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO  ARMADO  EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL  
 COLUMNAS LARGAS  CORTAS  ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO   
 No. PARTES  2 P2 OTRO \_\_\_\_\_

CONDICIONES PARA INGRESAR: HORARIO 8:00AM A 4:00PM

DOCUMENTOS: IMSS, LOS BÁSICOS.

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 0 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: ELEVADOR CABINA SEMI COMPLETA

<b>CLASIFICACIÓN</b>	<b>TIPO DE CABINA</b>	
CARGA <input type="checkbox"/> CAMILLAS <input type="checkbox"/>	MEDIDA 1.10 M <input type="checkbox"/>	ELEVACIÓN 2.03
DISCAPACITADOS <input checked="" type="checkbox"/> TIJERAS <input type="checkbox"/>	SEMI COMPLETA (SIN TECHO 2.10 M) <input checked="" type="checkbox"/>	ESTACIONES 2
AUTOS <input type="checkbox"/> UNDER RAMP <input type="checkbox"/>	COMPLETA 2.10 M <input type="checkbox"/>	CAPACIDAD DE CARGA 500 kg
		UNIDAD HIDRÁULICA 2 HP.

DIMENSIÓN DE FOSO: ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM   
 LARGO 1.75 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM   
 ANCHO 1.50 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM   
 PROFUNDIDAD 0.20 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.30 ANCHO 1.30

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM². ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA  
 COMPONENTES EXTRA PE CONZAR EN ELECTRO MANOS.

**TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:**

CLIENTE: SI NO  
 FOSO    
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA    
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

TECNORAMPA  
 GUÍA MECÁNICA  EN PROCESO  
 SOLICITUDES ADICIONALES \_\_\_\_\_

**ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA**

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

TUBERÍA PARED  
 SI  TUBERÍA  DELGADA   
 NO  CANALETA  GRUESA

**ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

INSTALADA  NO INSTALADA   
 ACCESORIOS EXTRAS COSTOS   
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: \_\_\_\_\_

**RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA**

NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE TÉRMINO

FIRMA

**ACABADO DE ELEVADOR**

COLORES  
 BLANCO  SILVER METALLIC   
 AZUL/GRIS  PANTONE  CÓDIGO \_\_\_\_\_  
 AZUL/BLANCO  ALUCOBOND COLOR   
 SOLICITUD ADICIONAL: \_\_\_\_\_

CRISTAL  
 METAL DESPLEGADO  CLARO  (3)  
 LÁMINA PINTOR  TINTEX   
 OTRO \_\_\_\_\_ ESMERILADO  (1)

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

APD JESUS A. BOUTER  
 TECNORAMPA

J. BOUTER  
 KARME LARA  
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE



NOTA

# 27 249 - 19235.

Nº 20239

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA



REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

- EL ESPACIO APENAS SE VA ADECUAR


OBSERVACIONES GENERALES: - SE TIENE QUE CONFIRMAR YA QUE EL TIPO DE ACCESO PASARIA DE NOROCCIDENTE A 180°. - SE TIENE QUE CONFIRMAR EL AREA DE INSTALACION DE LA UNIDAD.

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN

110 V  220 V  GENERADOR

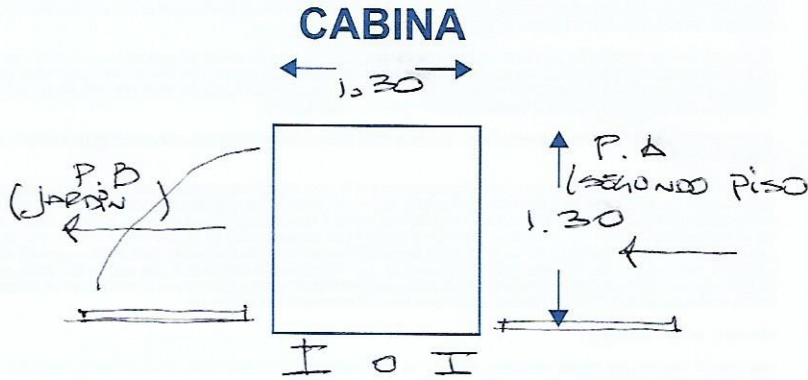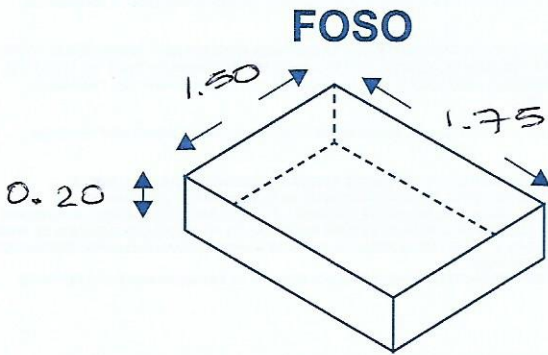

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA



BOTONERAS

PEDESTAL  SOBREPUESTAS  EMPOTRADAS  CANALIZADAS POR TECNORAMPA

DISTANCIA APROXIMADA ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 3.5mts

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

Aq. Jose Luis Gutierrez Martin

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: Jose Luis Gutierrez Martin TELÉFONO 1): 477 724 2089 CONTACTO 2): TELÉFONO 2):

APRO. JESUS A. DENÍZ GONZALEZ TECNORAMPA

APRO. Karlyme Lara Karlyme Lara NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
