

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO  
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO  
 TEC080710M22  
 Tels.: (427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecnorampa.com.mx  
 4272728119  
 LADA SIN COSTO:  
 800 623 0332

Nº 20246

#CLIENTE 26739

SOL - 18584

NOMBRE DEL CLIENTE: INA RAFAEL DUARTE FECHA: 20-07-2022

RAZÓN SOCIAL: IK CONSULTING

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: BLVD GUSTAVO DIAZ ORDAZ #1500, ZONA IND, 66210

REFERENCIA DE DIRECCIÓN: SAN PEDRO CAPA CAPA, NL. INDUSTRIAS JOHN DEERE

TELÉFONO: 826 160 0998 CORREO: rafaelduarte@ikconsulting.com.mx

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: PLANTA DE PRODUCCIÓN DE JOHN DEERE, AVISO CONTROLADO

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO  ARMADO  EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL  
 COLUMNAS LARGAS  CORTAS  ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO   
 No. PARTES  OTRO SE ESTABLECEN POR CONVENIO

CONDICIONES PARA INGRESAR: SE ESTABLECEN POR CONVENIO

DOCUMENTOS: SE ESTABLECEN POR CONVENIO

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 50 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: ELEVADOR DE GRUA.

<b>CLASIFICACIÓN</b>	<b>TIPO DE CABINA</b>		
CARGA <input checked="" type="checkbox"/> CAMILLAS <input type="checkbox"/>	MEDIDA 1.10 M <input type="checkbox"/>	ELEVACIÓN <u>8.00 mts</u>	
DISCAPACITADOS <input type="checkbox"/> TIJERAS <input type="checkbox"/>	SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M) <input checked="" type="checkbox"/>	ESTACIONES <u>4 PARADAS.</u>	
AUTOS <input type="checkbox"/> UNDER RAMP <input type="checkbox"/>	COMPLETA 2.10 M <input type="checkbox"/>	CAPACIDAD DE CARGA <u>1000kg</u>	
		UNIDAD HIDRÁULICA <u>5HP.</u>	

DIMENSIÓN DE FOSO: ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM   
 LARGO 2.00 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM   
 ANCHO 1.70 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM   
 PROFUNDIDAD 0.60 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.80 ANCHO 1.00

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM². ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA \_\_\_\_\_

**TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:**

CLIENTE: SI NO  
 FOSO    
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA    
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

TECNORAMPA  
 GUÍA MECÁNICA  EN PROCESO.  
 SOLICITUDES ADICIONALES \_\_\_\_\_

**ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA**

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

TUBERÍA PARED  
 SI  TUBERÍA  DELGADA   
 NO  CANALETA  GRUESA

**ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

INSTALADA  NO INSTALADA   
 ACCESORIOS EXTRAS COSTOS   
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: \_\_\_\_\_

**RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA**

NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE TÉRMINO

FIRMA

**COLORES**

BLANCO  SILVER METALLIC   
 AZUL/GRIS  PANTONE   
 AZUL/BLANCO  ALUCOBOND COLOR

**ACABADO DE ELEVADOR**

CÓDIGO \_\_\_\_\_

**CRISTAL**

METAL DESPLEGADO  CLARO   
 LÁMINA PINTOR  TINTEX   
 OTRO \_\_\_\_\_ ESMERILADO

SOLICITUD ADICIONAL \_\_\_\_\_

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

APD Jesús A. Benítez Cruz.  
 TECNORAMPA

Rafael Duarte  
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE



NOTA

# 26739

SUC - 18584

Nº 20246

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

• CONTEMPLAR ESPACIO DE 35 cm PARA COLUMNAS

OBSERVACIONES GENERALES: EN UNO DE 40 cm. PARA LIBRAR CABINA A 1 MT. • ALREDEDOR EN GUIA ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE PARA ELEVADOR CON PTR 4 x 4 con 7 TABLERO CON PEDESTAL.

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN




110 V

220 V


GENERADOR

15 mts.

TABLERO CON PEDESTAL.

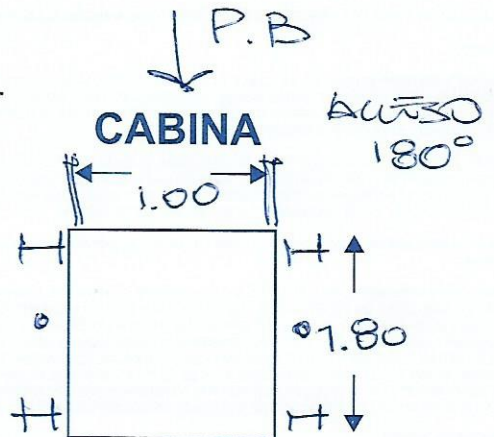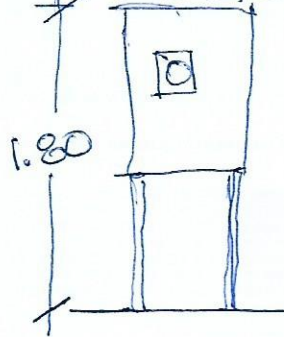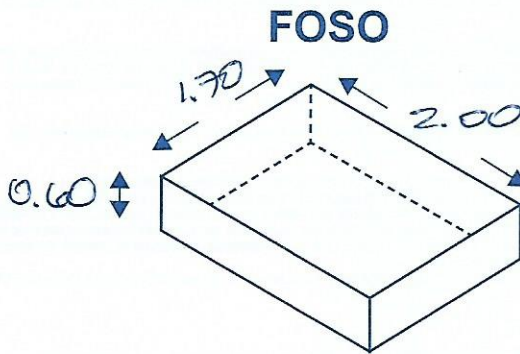

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

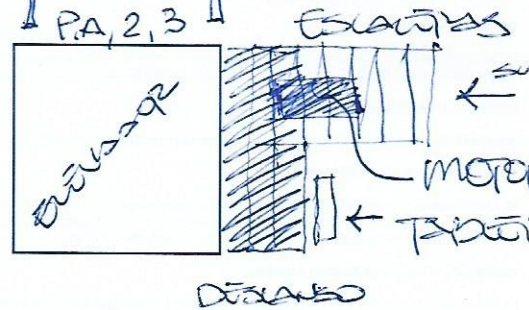

BOTONERAS

PEDESTAL

SOBREPUESTAS

DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA \_\_\_\_\_

EMPOTRADAS

CANALIZADAS POR TECNORAMPA

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

NOTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: Sergio Villanueva

TELÉFONO 1): 8180556900

CONTACTO 2): Victor Flores

TELÉFONO 2): 5590490707

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR  
AZP JESÚ A. BENÍTEZ CRUZ  
TECNORAMPA

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR  
AZP Rafael Duarte Martínez  
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
