



LEVANTAMIENTO DE ELEVADORES

8861

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO
Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO
TEC080710M22
Tels.: 01(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecnorampa.com.mx
0142772728119
LADA SIN COSTO:
018006230332

SUC. 5121.
SOC. 12502.

NOMBRE DEL CLIENTE: Ing. Marco Antonio Marinel FECHA: 29 JULIO 2020
 RAZÓN SOCIAL: MANDO SA DE CV.
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CALLE AGUA H321 PARQUE INDUSTRIAL SERVER, ACTEPA COAHUILA.
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: ELEVADOR LADO A LADO B1 LOS EQUIPOS SON (QUALIP)
OTE. 16088 TELÉFONO: _____ CORREO: _____

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: FUERA AUTO PARTES.

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
 COLUMNAS LARGAS CORTAS ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
 No. PARTES 2 cos. OTRO COVID.
 CONDICIONES PARA INGRESAR: DL3 ARIAS, DL3 SANCOS, ANCAMIOL, PUERTAS CON SÉPULO Y BARRON.
 DOCUMENTOS: SUA.
 AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 50 %
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: CARGA

CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA
 CARGA CAMILLAS MEDIDA 1.10M
 DISCAPACITADOS TIJERAS SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10M)
 AUTOS UNDER RAMP COMPLETA 2.10M
 ELEVACIÓN 4.36
 ESTACIONES 2
 CAPACIDAD DE CARGA 3000 Kg
 UNIDAD HIDRÁULICA 10 HP.

DIMENSIÓN DE FOSO: ELEVADORES DE TIJERA, 45CM
 LARGO 3.30 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM
 ANCHO 2.20 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45CM
 PROFUNDIDAD 1.60 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 2.50 ANCHO 2.00

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA _____ TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR: _____

CLIENTE: SI NO
 FOSO
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS
 TECNORAMPA
 GUÍA MECÁNICA
 SOLICITUDES ADICIONALES _____

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 TUBERÍA PARED
 SI TUBERÍA DELGADA
 NO CANALETA GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA
 INSTALADA NO INSTALADA
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: _____

NOMBRE Y FIRMA _____ FECHA DE TÉRMINO _____ FIRMA _____

ACABADO DE ELEVADOR

COLORES ACABADO DE ELEVADOR CRISTAL
 BLANCO SILVER METALLIC METAL DESPLEGADO
 AZUL/GRIS PANTONE LÁMINA PINTOR
 AZUL/BLANCO ALUCOBOND COLOR OTRO _____ ESMERILADO
 SOLICITUD ADICIONAL: _____

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICA Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

TECNORAMPA _____ NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE _____

LÁMINA PERFORADA
LÁMINA
USA

EL LIC. JORGE SUPERIOR
TERMINADA CUYOS DATOS SE V
APO (S) DE ESTE CONTRATO

SE DEBE INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO
SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIR LOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE
DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.



NOTA

REVISAR Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY
CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE
PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: - NO LLEVA BOTONERA EN INTERIOR. ENTRADA 20 ALTO
- REVISAR UTILIZADO YA QUE EL DUEÑO ACCESO.
- SE ANUNDA A ESTILOVA
- LAS PUERTAS SE ANUNDA EN ESTILOVA DE CLIENTE, SERAN FUERA

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN

110 V 220 V GENERADOR

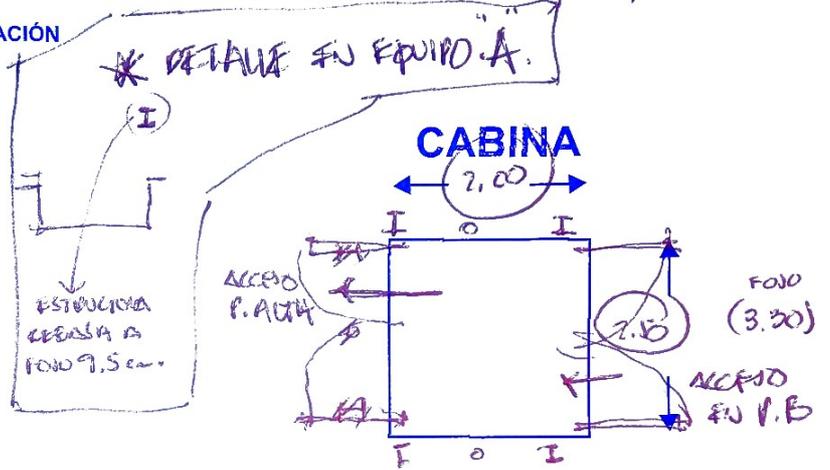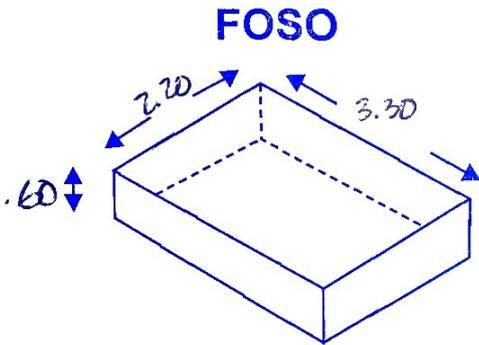


INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

BOTONERAS

PEDESTAL EMPOTRADAS
SOBREPUESTAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

DISTANCIA APROXIMADA
ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 5.00 mts



EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y
TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

ACCESO POR CASILLERÍA 2.

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL
ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE
ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO.
CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: _____ TELÉFONO 1): _____
CONTACTO 2): _____ TELÉFONO 2): _____

ACEPTO Y CONZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

TECNORAMPA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
