

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO  
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO  
 TEC080710M22  
 Tels.: 01(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecnorampa.com.mx  
 0142772728119  
 LADA SIN COSTO:  
 018006230332

COT. 18333

NOMBRE DEL CLIENTE: Ing. JOSE DE JESUS ASSAF CARDESA FECHA: 26 Junio 2020  
 RAZÓN SOCIAL: \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: COMUNIDAD AVAKAW # 709 IQUIA 9TA. SECCION, S.L.P.  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: COLEGIO  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_ CORREO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: COLEGIO CASTILLO

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO  ARMADO   
 COLUMNAS LARGAS  CORTAS   
 No. PARTES  200  
 EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL  
 ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO   
 OTRO CONVO.

CONDICIONES PARA INGRESAR: AVUAL A CLIENTE.

DOCUMENTOS: \_\_\_\_\_

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: \_\_\_\_\_ %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: NO CURVA FOSO

CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA  
 CARGA  CAMILLAS  MEDIDA 1.10M   
 DISCAPACITADOS  TIJERAS  SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10M)   
 AUTOS  UNDER RAMP  COMPLETA 2.10M   
 ELEVACIÓN 10.45 m. - MENOR FOSO  
 ESTACIONES 4  
 CAPACIDAD DE CARGA 500 Kg.  
 UNIDAD HIDRÁULICA 3 HP.

DIMENSIÓN DE FOSO:  
 LARGO 1.80  
 ANCHO 1.355  
 PROFUNDIDAD NO HAY FOSO  
 ELEVADORES DE TIJERA, 45CM   
 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM  NO CURVA FOSO  
 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM   
 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.40 ANCHO 1.15

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA \_\_\_\_\_

TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:

CLIENTE: SI NO  
 FOSO    
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA    
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

TECNORAMPA  
 GUÍA MECÁNICA   
 SOLICITUDES ADICIONALES \_\_\_\_\_

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

TUBERÍA PARED  
 SI  TUBERÍA  DELGADA   
 NO  CANALETA  GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA  NO INSTALADA   
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO   
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: \_\_\_\_\_

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE TÉRMINO

FIRMA

ACABADO DE ELEVADOR

COLORES  
 BLANCO  SILVER METALLIC   
 AZUL/GRIS  PANTONE  ROJO TECACOTA  
 AZUL/BLANCO  ALUCOBOND COLOR  CÓDIGO POR DEFINIR

METAL DESPLEGADO  CRISTAL  
 LÁMINA PINTOR  CLARO  PARETE SUPERIOR  
 OTRO \_\_\_\_\_ TINTEX  ABAO  
 ESMERILADO

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERISTICA Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

TECNORAMPA

Ing. J. Jesús Assaf C.  
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

**NOTA**

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIR LOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.



**NOTA**

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: - NO HAY FOSO. Y REVISAR LA ALTURA, PORQUE SE RESTAN LOS 15 o 20 cm DE FOSO.

**DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN**

110 V     220 V     GENERADOR

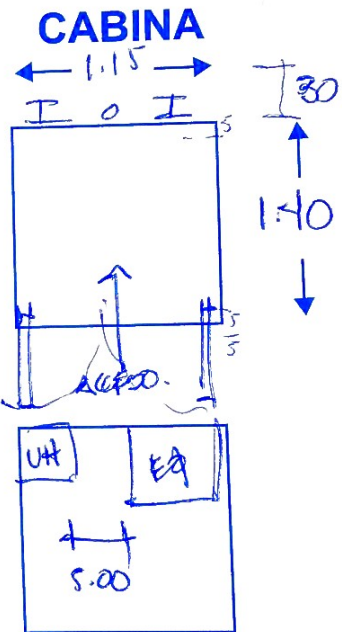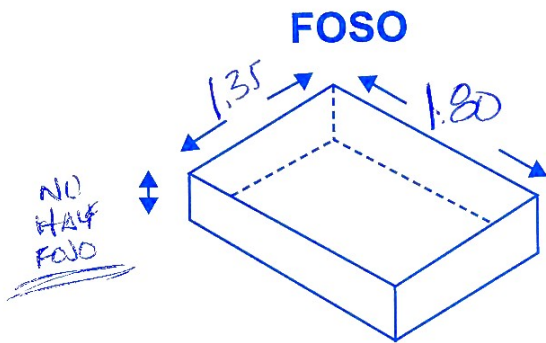

**INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA**

**BOTONERAS**

PEDESTAL     SOBREPUESTAS     EMPOTRADAS     CANALIZADAS POR TECNORAMPA

DISTANCIA APROXIMADA ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 5.00 METROS.

**EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:**

**NOTA:** PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

**PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO**

NOMBRE: \_\_\_\_\_ TELÉFONO 1): \_\_\_\_\_  
CONTACTO 2): \_\_\_\_\_ TELÉFONO 2): \_\_\_\_\_

**ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR**

*[Handwritten signature]*  
TECNORAMPA

*[Handwritten signature]*  
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
