

TecnoRampa

LEVANTAMIENTO DE ELEVADORES

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO
Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO
TEC080710M22
Tels.: 01(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecnorampa.com.mx
0142772728119
LADA SIN COSTO:
018006230332

NOMBRE DEL CLIENTE: ING. ROBERTO ALEJOS TEJANATIA FECHA: 24 JULIO 2020
 RAZÓN SOCIAL: NATYGED SA DE CV
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: AV. PARQUE TECNOLOGIA PALMERA 10862-1, PARQUE CIENTIFICO
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: TECNOLOGIA MCP. VOLCANTIEPAC, MORELOS, CP. 62790
 TELÉFONO: 777 257 30 90 CORREO: _____

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: TEJANATIA - INE 7 @HOTMAIL.COM

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO
 COLUMNAS LARGAS CORTAS
 EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
 ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
 OTRO CABLETAS CONES, EIP COMPLETO, MMS.

No. PARTES 32 PARTES.
 CONDICIONES PARA INGRESAR: ANUAL AL CHEFIE. ALTURA DE ACCESO CARRILLO 2.76 mtd

DOCUMENTOS: _____
 AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 30% %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: CALCA
 CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA
 CARGA CAMILLAS MEDIDA 1.10M ELEVACIÓN 8.65
 DISCAPACITADOS TIJERAS SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10M) ESTACIONES 3
 AUTOS UNDER RAMP COMPLETA 2.10M CAPACIDAD DE CARGA 1000 Kg.
 UNIDAD HIDRÁULICA 5th.

DIMENSIÓN DE FOSO: ELEVADORES DE TIJERA, 45CM
 LARGO 3.30 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM
 ANCHO 2.20 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS 45 CM .60m
 PROFUNDIDAD .60 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 2.50 ANCHO 2.00

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA _____

TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:

CLIENTE: SI NO
 FOSO
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS
 TECNORAMPA
 GUÍA MECÁNICA
 SOLICITUDES ADICIONALES _____

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 TUBERÍA PARED
 SI TUBERÍA DELGADA
 NO CANALETA GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 INSTALADA NO INSTALADA
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: _____

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

 NOMBRE Y FIRMA FECHA DE TÉRMINO FIRMA

ACABADO DE ELEVADOR

COLORES
 BLANCO SILVER METALLIC
 AZUL/GRIS PANTONE CÓDIGO _____
 AZUL/BLANCO ALUCOBOND COLOR
 SOLICITUD ADICIONAL: _____
 METAL DESPLEGADO CRISTAL COMUNA
 LÁMINA PINTOR CLARO
 OTRO _____ TINTEX
 ESMERILADO

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERISTICA Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

TECNORAMPA

 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOTA

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIR LOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.



NOTA

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: -TRAER EXTINTOR PARA TRABAJO SUBTERRANEO
-VER SI MOTOR DE 7.5 HP. FUERA EN ESTE PROYECTO (BÁSICO)
-BOTONERA EN INTERIOR
-CON ILUMINACIÓN EN INTERIOR

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN


110 V 220 V GENERADOR NO HAY UPS EN SITIO

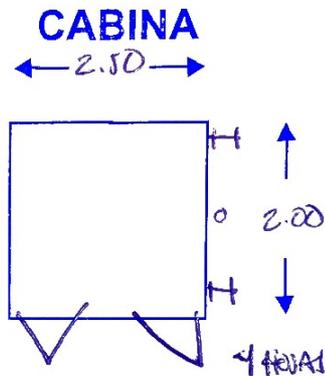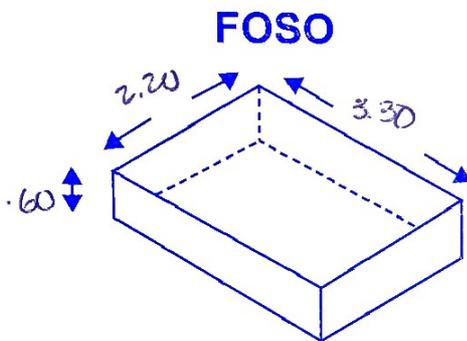

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

BOTONERAS

PEDESTAL EMPOTRADAS
SOBREPUESTAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA
DISTANCIA APROXIMADA 3.00 m
ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA _____



EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:


NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: _____ TELÉFONO 1): _____
CONTACTO 2): _____ TELÉFONO 2): _____

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR


TECNORAMPA


NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
