

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO  
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO  
 TEC080710M22  
 Tels.: 01(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecorampa.com.mx  
 0142772728119  
 LADA SIN COSTO:  
 018006230332

NOMBRE DEL CLIENTE: GOBIERNO DEL EDOUEX PODER JUDICIAL FECHA: 17-10-20  
 RAZÓN SOCIAL: Arturo Posadas (Mas-Arquitectonico SA de CV  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Jenustano Carranza 17, San Luis Tlatilco 53630 Naucalpan J.  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: palacio de Justicia Naucalpan de Juarez  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_ CORREO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: \_\_\_\_\_

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO  ARMADO   
 COLUMNAS LARGAS  CORTAS   
 No. PARTES  EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL  
 ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO   
 OTRO \_\_\_\_\_

CONDICIONES PARA INGRESAR: \_\_\_\_\_

DOCUMENTOS: \_\_\_\_\_

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 50 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: C DEW EVOLUTION

**CLASIFICACIÓN**

CARGA  CAMILLAS   
 DISCAPACITADOS  TIJERAS   
 AUTOS  UNDER RAMP

**TIPO DE CABINA**

MEDIDA 1.10M   
 SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10M)   
 COMPLETA 2.10M

ELEVACIÓN 7.98m  
 ESTACIONES 3  
 CAPACIDAD DE CARGA 500 kg  
 UNIDAD HIDRÁULICA 3 HP

**DIMENSIÓN DE FOSO:**

LARGO 1.75  
 ANCHO 1.50  
 PROFUNDIDAD 20

ELEVADORES DE TIJERA, 45CM   
 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM   
 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM

DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.25 ANCHO 1.25

**NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA**

COMPONENTES EXTRA (C) ELECTROIMANES EN CADA ESTACION

**TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:**

CLIENTE: SI NO  
 FOSO    
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA    
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

TECNORAMPA  
 GUÍA MECÁNICA   
 SOLICITUDES ADICIONALES \_\_\_\_\_

**ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA**

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

TUBERÍA PARED  
 SI  TUBERÍA  DELGADA   
 NO  CANALETA  GRUESA

**ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

INSTALADA  NO INSTALADA   
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO   
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: \_\_\_\_\_

**RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA**

NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_ FECHA DE TÉRMINO \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**COLORES**

BLANCO  SILVER METALLIC   
 AZUL/GRIS  PANTONE   
 AZUL/BLANCO  ALUCOBOND COLOR

**ACABADO DE ELEVADOR**

METAL DESPLEGADO   
 LÁMINA PINTOR   
 OTRO \_\_\_\_\_

**CRISTAL**

CLARO   
 TINTEX   
 ESMERILADO  NIECABISMO

SOLICITUD ADICIONAL: \_\_\_\_\_

**ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR**

Mauricio Company  
 TECNORAMPA

ING EUSEBIO MARTINEZ NAUJIX  
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOTA

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIR LOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.



NOTA

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN

110 V  220 V  GENERADOR

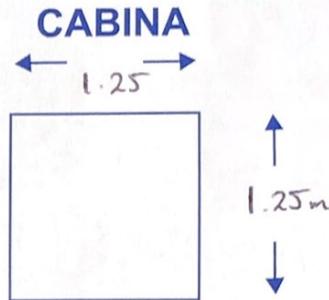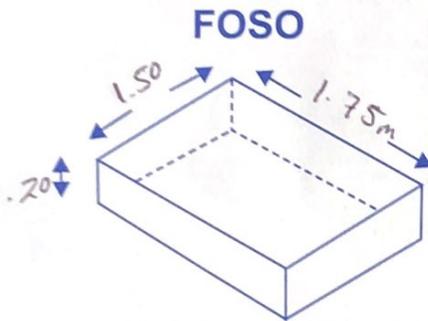

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA


BOTONERAS

PEDESTAL   
SOBREPUESTAS

EMPOTRADAS  
 CANALIZADAS POR TECNORAMPA

DISTANCIA APROXIMADA \_\_\_\_\_

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA \_\_\_\_\_

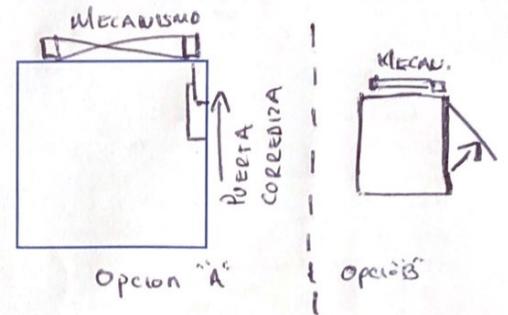

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDE RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: Arg. Bruce Fabian Vella Rubio  
CONTACTO 2): \_\_\_\_\_

TELÉFONO 1): 56 11 78 06 57  
TELÉFONO 2): \_\_\_\_\_

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

Mauricio Compegnny  
TECNORAMPA

Jorge Alberto Martínez Naveira  
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
