

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO
 TEC080710M22
 Tels.: 01(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecnorampa.com.mx
 0142772728119
 LADA SIN COSTO:
 018006230332

NOMBRE DEL CLIENTE: Mx. JOSÉ SOTO BARRERA FECHA: 28 JUNIO 2010
 RAZÓN SOCIAL: TRUJADERA DE DURANGO SA DE CV
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CALLETERA TORREÓN Km. 7.5, EJIDO LAS CUEVAS, CD. LEÓN, DURANGO
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: CARRETERA 22173 / SOL. 1276 TELÉFONO: 618-155-7893 CORREO: _____

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: UNIVERSIDAD EDIFICIO "CARLOS HELGUA"

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO
 COLUMNAS LARGAS CORTAS EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
 No. PARTES 1 MPA. ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
 OTRAS COPIA
 CONDICIONES PARA INGRESAR: SIN IMPEDIMENTO, NI CON IMPEDIMENTO.
 DOCUMENTOS: AVISAL A GUARDIA DE EDIFICIO
 AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 0 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA

CARGA CAMILLAS MEDIDA 1.10M ELEVACIÓN 3.83 m.
 DISCAPACITADOS TIJERAS SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10M) ESTACIONES 2
 AUTOS UNDER RAMP COMPLETA 2.10M CAPACIDAD DE CARGA 500 Kg.
 UNIDAD HIDRÁULICA 2 HP.

DIMENSIÓN DE FOSO: ELEVADORES DE TIJERA, 45CM
 LARGO 1.75 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM
 ANCHO 1.50 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM
 PROFUNDIDAD .20 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.30 ANCHO 1.30

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA _____

TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:

CLIENTE: SI NO

FOSO

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

TECNORAMPA

GUÍA MECÁNICA

SOLICITUDES ADICIONALES _____

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

TUBERÍA PARED

SI TUBERÍA DELGADA

NO CANALETA GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA NO INSTALADA

ACCESORIOS EXTRAS COSTO

ACEPTO COSTO ADICIONAL: _____

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA _____

NOMBRE Y FIRMA _____ FECHA DE TÉRMINO _____ FIRMA _____

COLORES **ACABADO DE ELEVADOR**

BLANCO SILVER METALLIC METAL DESPLEGADO CRISTAL

AZUL/GRIS PANTONE CÓDIGO _____ LÁMINA PINTOR CLARO

AZUL/BLANCO ALUCOBOND COLOR OTRO _____ TINTEX

SOLICITUD ADICIONAL: _____ ESMERILADO

ACABA TRUJADERA
 CON
 PUNTA
 SUBRAYADO

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

TECNORAMPA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE _____

NOTA

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIR LOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: - TRAZAR PUNOS Y CARRENDOS PARA REFORZAR ESTRUCTURA DE FUEMOSOL EN ALBA DE PUENTE.



- TRAZAR CAJONES PARA PROTECCIÓN DE PISOS

- TRAZAR EXTENSIÓN DE 15 METROS PARA CONEXIÓN DE PUNTA DE SOLDAD Y PASTILLA ITM.

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN - TRAZAR CABLES TRANSPORTADORES DISTANCIA DE ESTACIONAMIENTO A EDIFICIO DE 70.00 MTS.

110 V 220 V GENERADOR

- FLECTRAMAS EN REDA DE PLANTA ALTA. (PREGUNTAR A CADA SI LO NECESITA)

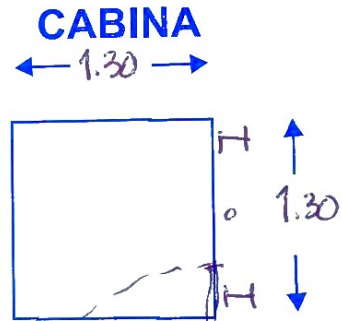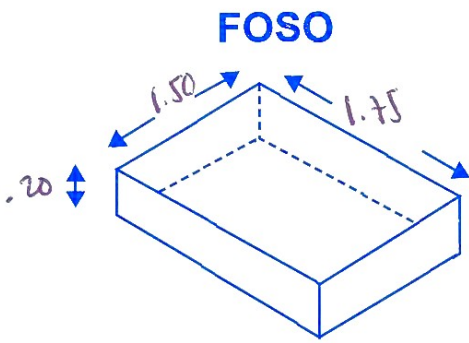


INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

BOTONERAS

- PEDESTAL
- SOBREPUESTAS

- EMPOTRADAS
- CANALIZADAS POR TECNORAMPA

DISTANCIA APROXIMADA ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 3.00

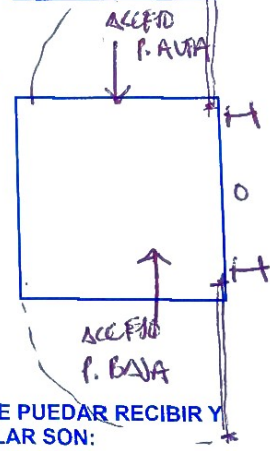

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

NOTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: _____ TELÉFONO 1): _____
CONTACTO 2): _____ TELÉFONO 2): _____

TECNORAMPA

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
