

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO
 TEC080710M22
 Teles.: 01(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecnorampa.com.mx
 0142772728119
 LADA SIN COSTO:
 018006230332

NOMBRE DEL CLIENTE: Ing. Miguel Caserio FECHA: 5 AGO 10 2010
 RAZÓN SOCIAL: DESARROLLADORA INGENIERIA GAMA
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: AV. DE LAS UNIDADES #25, PARQUE TECNOLÓGICO INDUSTRIAL, QRO
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: CERCA DE FUENTE VIZAR
 TELÉFONO: 412-412-50-75 CORREO: _____

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: PLANTA DE MUEBLES FABRICACION

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO
 COLUMNAS LARGAS CORTAS EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
 ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
 No. PARTES OTRO WAS - SWA.
 CONDICIONES PARA INGRESAR: AVANZA A CUOTE

DOCUMENTOS: _____

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 30 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: OTRO EVOLUTION PTA AUTOMÁTICA

CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA
 CARGA CAMILLAS MEDIDA 1.10M ELEVACIÓN 4.50 mt.
 DISCAPACITADOS TIJERAS SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10M) ESTACIONES 2
 AUTOS UNDER RAMP COMPLETA 2.10M CAPACIDAD DE CARGA 500 kg.
 UNIDAD HIDRÁULICA 7.5 HP.

DIMENSIÓN DE FOSO:
 LARGO 2.255 ELEVADORES DE TIJERA, 45CM
 ANCHO 1.80 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20CM 35 cm
 PROFUNDIDAD 35 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM
 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.25 ANCHO 1.25

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA _____

TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:

CLIENTE: SI NO
 FOSO
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS
 TECNORAMPA
 GUÍA MECÁNICA
 SOLICITUDES ADICIONALES _____

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 TUBERÍA PARED
 SI TUBERÍA DELGADA
 NO CANALETA GRUESA

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 INSTALADA NO INSTALADA
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: _____

NOMBRE Y FIRMA ACABADO DE ELEVADOR FECHA DE TÉRMINO FIRMA
TECNORAMPA NEGRO CÓDIGO # con observaciones CRISTAL CLARO ✓ CONFIRMA
 COLORES BLANCO SILVER METALLIC
 AZUL/GRIS PANTONE
 AZUL/BLANCO ALUCOBOND COLOR
 SOLICITUD ADICIONAL: _____
 ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOTA

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIR LOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.


NOTA

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.


OBSERVACIONES GENERALES: TRABAJER ANDAMIOS (2 CRU).
- EL EQUIPO PUEDE VENIR MUNDADO EN SU TOTALIDAD, HAY ACCESO HASTA PD INSTALACION
- MOTOR 7.5 HP. PARA MITIGAR RUIDO DE ZOMBIDOS.
- BOTONERAS CON DISPLAY / PANTAS AUTOMATICAS.

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN - EL EQUIPO SE ANCLARA A ESTRUCTURA METALICA (CERRIAL DE TUBERIA).
- LA U.H. SE COLOCARA EN PLANTA ALTA


110 V 220 V GENERADOR

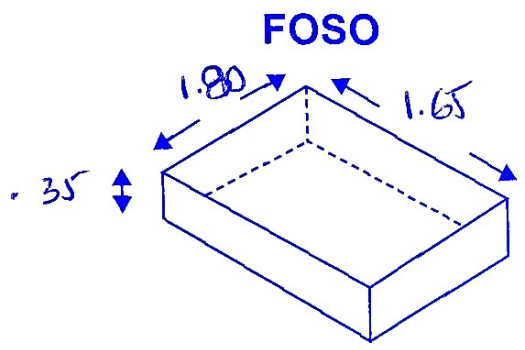

CABINA
- TODO ES HIDRAULICO EXCEPTO MECANICO, FLOWALS TIPO ESPEJO.
← 1.25 →

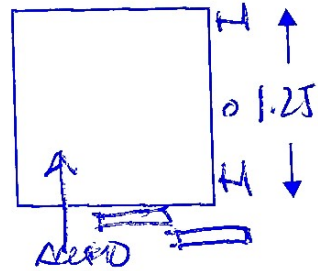

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA



BOTONERAS

- PEDESTAL
- SOBREPUESTAS
- DISTANCIA APROXIMADA ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 3.00 METROS
- EMPOTRADAS
- CANALIZADAS POR TECNORAMPA

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES. SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: _____ TELÉFONO 1): _____
CONTACTO 2): _____ TELÉFONO 2): _____

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

[Signature]
TECNORAMPA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
