

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO
 TEC080710M22
 Tels.: (427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecnorampa.com.mx
 4272728119
 LADA SIN COSTO:
 800 623 0332

Nº 20247

25447

NOMBRE DEL CLIENTE: DRS CARLOS AVALES FECHA: 29 Julio 2022
 RAZÓN SOCIAL: FORTEM CAPITAL
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: AVD. ANTONIO MILALES #30 CENTRO 23400
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: SAN JOSÉ DEL ORO, BLS. ENTRADA POR LEUFENARIO.
 TELÉFONO: 818653655 CORREO: _____

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: HOTEL EN REMODELACION TRAZAR MATERIAL PARA PROTECTOR. ACABADOS.

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
 COLUMNAS LARGAS CORTAS ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
 No. PARTES OTRO CAFETE
 CONDICIONES PARA INGRESAR: NO DMSS. HORARIO LIBRE
 DOCUMENTOS: NO DMSS.

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 50 %
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: ELEVADOR TIPO TIJERA.

CLASIFICACIÓN		TIPO DE CABINA	
CARGA <input type="checkbox"/>	CAMILLAS <input type="checkbox"/>	MEDIDA 1.10 M <input type="checkbox"/>	ELEVACIÓN <u>1.20</u>
DISCAPACITADOS <input type="checkbox"/>	TIJERAS <input checked="" type="checkbox"/>	SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M) <input type="checkbox"/>	ESTACIONES <u>2</u>
AUTOS <input type="checkbox"/>	UNDER RAMP <input type="checkbox"/>	COMPLETA 2.10 M <input type="checkbox"/>	CAPACIDAD DE CARGA <u>500 kg</u>
			UNIDAD HIDRÁULICA <u>2 HP.</u>

DIMENSIÓN DE FOSO:
 LARGO 1.75
 ANCHO 1.55
 PROFUNDIDAD 3/1020

ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM
 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM
 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM
 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.70 ANCHO 0.90

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM². ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA _____

TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:

CLIENTE:	SI NO	TECNORAMPA
FOSO	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	GUÍA MECÁNICA <input checked="" type="checkbox"/> <u>EN PROGRESO.</u>
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	SOLICITUDES ADICIONALES _____
CANALIZACIÓN DE BOTONERAS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

TUBERÍA SI TUBERÍA DELGADA
 NO CANALETA GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA NO INSTALADA
 ACCESORIOS EXTRAS COSTOS
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: _____

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

 NOMBRE Y FIRMA FECHA DE TÉRMINO FIRMA

ACABADO DE ELEVADOR

COLORES BLANCO SILVER METALLIC
 AZUL/GRIS PANTONE CÓDIGO _____
 AZUL/BLANCO ALUCOBOND COLOR

CRISTAL METAL DESPLEGADO CLARO
 LÁMINA PINTOR TINTEX
 OTRO _____ ESMERILADO

SOLICITUD ADICIONAL: NEGRO DE LÍNEA.
 ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR
ARQ. JESÚS ANTONIO BENÍTEZ. ARQ. FRANCISCO JAVIER OLIVERAS VELASCO
 TECNORAMPA NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

FORTEM | CAPITAL
 PLANO AUTORIZADO PARA CONSTRUCCION

NOTA

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA



REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

- OBRA EN PROCESO / SI EL TIEMPO PERMITE

OBSERVACIONES GENERALES: NO ESTA EN OBRA SE PUEDE DIMENSIONAR, DE LO CONTRARIO HAY UNA DISTANCIA COMO DE 30 MTS DEL LUGAR DE DEBIDA A LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO // GENERAL DETALLE DE BOTONERAS.

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN 10 MTS.

110 V 220 V GENERADOR

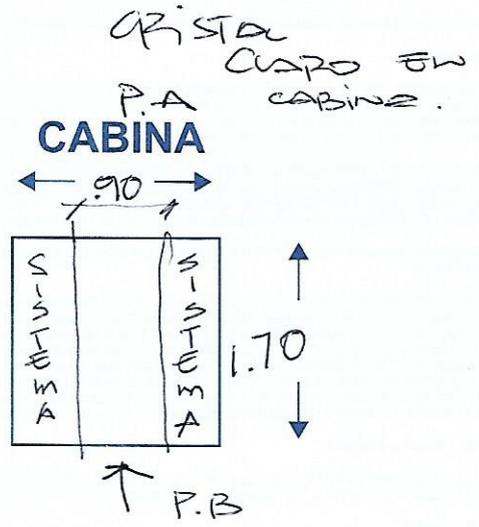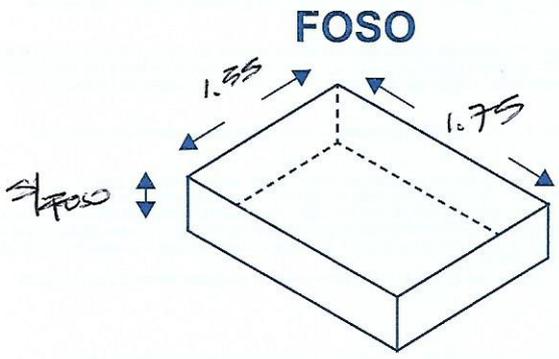


INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

BOTONERAS

PEDESTAL SOBREPUESTAS EMPOTRADAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

DISTANCIA APROXIMADA ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 4.5 mts.



EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

ARG. JOSE LUIS PEREZ PAVON ARROYO

ING. ARG. FRANCISCO JAVIER CABANAS VELASCO

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CABANAS VELASCO CONTACTO 2): JOSE LUIS PEREZ PAVON ARROYO

TELÉFONO 1): 5543731708 TELÉFONO 2): 6241222016

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

APD JESUS DOMÍNGUEZ CRUZ TECNORAMPA

ING. DRD. FRANCISCO JAVIER CABANAS VELASCO NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FORTEM CAPITAL PLANO AUTORIZADO PARA CONSTRUCCION
