

BLVD. HIDALGO #117-A, COL. CENTRO  
C.P. 76800 SAN JUAN DEL RÍO, QRO.

LADA SIN COSTO:  
01 800 6330 332, 01 800 8380 850  
atencionacientes@tecnorampa.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: CARLOS ARMANDO DEL BOSQUE FECHA: 05/08/2022  
 RAZÓN SOCIAL: NO APLICA  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: PAVIMENTO A CARMEN 53 AMPLIACIÓN PABELLON 53  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: PABELLON DE HIDALGO, EL MILAGRO, AVASCAIQUILLOS.  
 TELÉFONO: 449 274 3707 CORREO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: VIVIENDA EN OBRA DENTRO DE RESERVA

### EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL

ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO  OTRO \_\_\_\_\_

CONDICIONES PARA INGRESAR: \_\_\_\_\_ HORARIO: 8:30 A 6:00 pm

DOCUMENTOS: INE IMSS OTROS: \_\_\_\_\_

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 90 %

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO: RAMPA Duplicadora de ESTACIONAMIENTO

### TIPO DE RAMPA

CLÁSICA COMPACTA   
 TR EVOLUTION   
 HEAVY DUTY

### DIMENSIONES DE PLATAFORMA

1.90 X 3.75 M  2.00 X 3.75 M   
<sup>2.30</sup> 2.10 X 3.75 M  1.90 X 3.50 M   
 2.00 X 3.50 M  2.10 X 3.50 M

### CONDICIONES

LIBRE  ALTURA LIBRE 4.00 ms  
 EMPATADAS  CAPACIDAD DE CARGA 7000 lbs  
SE PAISA UNIDAD HIDRÁULICA 3 HP.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL: SE REVISARÁ SI LA UNIDAD QUEDA LIBRE O EMPATADA.

CONDICIONES Y DIMENSIONES DE ACCESO: COCHERA ABIERTA RESERVA EN OBRA.

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA \_\_\_\_\_

### TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR

CLIENTE:	SI	NO	TECNORAMPA
FIRME DE CONCRETO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GUÍA MECÁNICA <u>EN PROCESO</u> <input type="checkbox"/>
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SOLICITUDES ADICIONALES _____
ELEMENTOS ESPECIALES DE FIJACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____

### ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC  CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 110 VAC  CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

### ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA  NO INSTALADA  OTRO

ACCESORIOS EXTRAS COSTO \_\_\_\_\_

ACEPTO COSTO ADICIONAL \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

FECHA DE TÉRMINO

FIRMA

### ACABADO DEL ELEVADOR

COLORES AZUL  GRIS  A PARTIR DE 10 EQUIPOS \_\_\_\_\_

PLATAFORMA  \_\_\_\_\_

COLUMNAS  \_\_\_\_\_

OTRO DE LÍNEA.

### OBSERVACIONES

SE REVISARÁN PROPOSITAS DE 2.30 O 2.10 PARA QUITAR UN PASILLO.

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIÓN AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS. EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.


**NOTA:**

REVISÉ Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.


**OBSERVACIONES GENERALES:**

**CROQUIS Y DIMENSIONES**

S.47

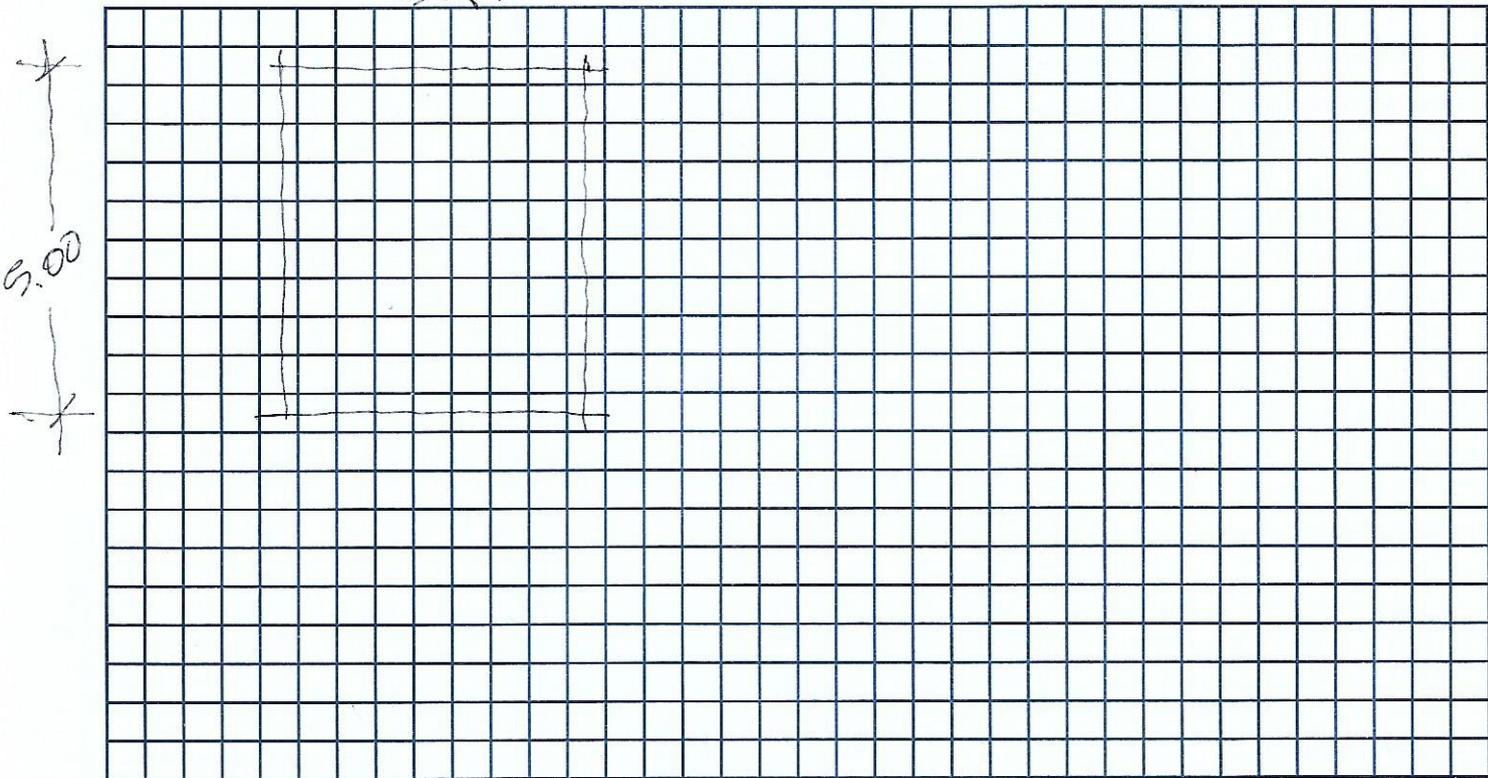

**CONEXIÓN UNIDAD HIDRÁULICA**

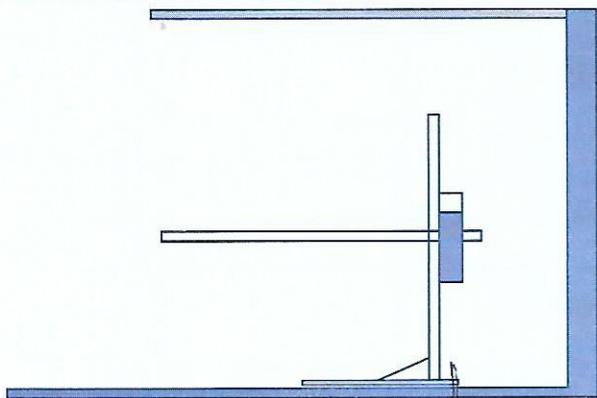

CONEXIÓN

**UBICACIÓN**

SOBRE PISO

ÁREA

EN MURO

**TIPO DE CONEXIÓN**

(RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE)

DISPARO ELÉCTRICO

CLAVIJA MEDIO GIRO

DISTANCIA DE CABLE DE 4 X 12 LOS 3 mts  
DE WANDA.

**EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO, LAS PERSONAS QUE PUEDEN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN SON:**

**NOTA:**

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES SEGÚN LA PROGRAMACIÓN EN ESE MOMENTO.

NOMBRE

Jorge Zúñiga Obando

FIRMA

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A INSTALAR

APD Juan A. Benítez Cruz.

TECNORAMPA

Carlos Armando Del Bosque

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
