

NOMBRE DEL CLIENTE: Alberto Morales Ros FECHA: 17-08-17
 RAZÓN SOCIAL: Compañía Mexicana de Inyecciones Turísticas
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Autopista Tijuana-Ensenada 2501 col.
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: Zona Playtes, Ensenada B.C.
 # 12179 Hotel Lucerna TELÉFONO: _____ CORREO: 50perquisor.en3@lucerna.com.mx

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: _____
 ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO LARGAS CORTAS
 COLUMNAS NO. PARTES
 CONDICIONES PARA INGRESAR: 1H, 2H, 3H
 DOCUMENTOS: _____
 AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 50 %
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: _____

CLASIFICACIÓN CARGA DISCAPACITADOS AUTOS
 CAMILLAS TIJERA UNDER RAMP
 MEDIA 1.10 M SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M) COMPLETA 2.10 M
 TIPO DE CABINA ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM
 DIMENSIÓN DE FOSO: LARGO 1.75 ANCHO 1.50 PROFUNDIDAD 0.20
 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.30 ANCHO 1.30

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
 COMPONENTES EXTRA _____
 TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR: _____
 CLIENTE: SI NO
 FOSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA CANALIZACIÓN DE BOTONERAS
 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA INSTALADA NO INSTALADA OTRO
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO _____
 ACEPTO COSTO ADICIONAL _____
 NOMBRE Y FIRMA _____ FECHA DE TÉRMINO _____ FIRMA _____

ACABADO DEL ELEVADOR METAL DESPLEGADO LÁMINA PINTRO OTRO _____
 SILVER METALLIC PANTONE ALUCOBOND COLOR
 COLORES BLANCO AZUL / GRIS AZUL / BLANCO
 SOLICITUD ADICIONAL: _____
 RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA TUBERÍA SI NO CANALETA GRUESA DELGADA PARED
 CRISTAL CLARO TINTEX ESMERILADO

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR _____
 TECNORAMPA Arg. Salvador Silva S.
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE 6161839259

NOTA: SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCION AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERA BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGUN RECLAMO FUTURO.


NOTA: REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGUN RECLAMO O CONDICION QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICION DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: Panel de Seguridad, botonera en el interior.

cliente coloca porteria en segunda estacion de 180 de altura

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACION



110V 220V GENERADOR

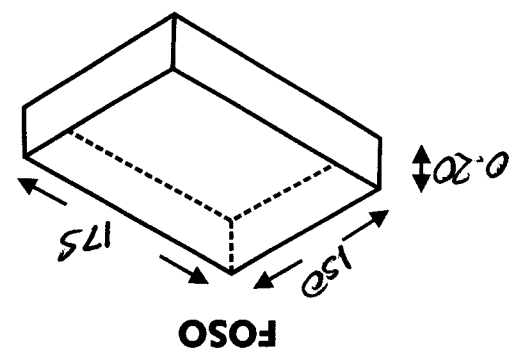

INFORMACION DE UNIDAD HIDRAULICA

- BOTONERAS
- PEDESTAL
- SOBREPUESTAS
- DISTANCIA APROXIMADA
- ELEVADOR Y UNIDAD HIDRAULICA
- EMPOTRADAS
- CANALIZADAS POR TECNORAMPA

5 mts

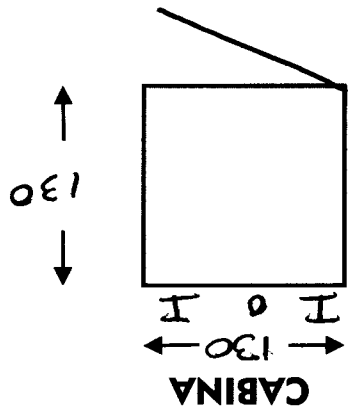

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISION DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

NOTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACION, LA OBRA CIVIL Y ELECTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASI COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL AREA DE INSTALACION. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARA OTRA FECHA DE INSTALACION DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGUN LA PROGRAMACION DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCION.

NOMBRE:

FIRMA:

TECNORAMPA
Arg. Salvador Silvas

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERISTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
