

NOMBRE DEL CLIENTE: Kevin Christopher Fierro Zavata FECHA: 14-sep-2018
 RAZÓN SOCIAL: Coppel S.A. de C.V.
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Bli. Pedro Infante #1615 Pte. Int. 26 N.9 Puercas Desarrollo Urbano
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: Plaza Piramitas a un costado de Tecnológico 2010 de Monterrey
 TELÉFONO: 667229299 CORREO: lmejor@coppel.com
 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: Plaza Comercial - Cooperativo
Acceso libre

EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL

ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO OTRO Gautes

CONDICIONES PARA INGRESAR: Aviso del personal a ingresar HORARIO: Len-Vie 8am-7pm

DOCUMENTOS: Identificación Empresa, Alta IMSS OTROS _____

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 100 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Rampa TR Evolution de Linea

TIPO DE RAMPA

CLÁSICA COMPACTA
 TR EVOLUTION
 HEAVY DUTY

DIMENSIONES DE PLATAFORMA

1.90 X 3.75 M 2.00 X 3.75 M
 2.10 X 3.75 M 1.90 X 3.50 M
 2.00 X 3.50 M 2.10 X 3.50 M

CONDICIONES

LIBRE ALTURA LIBRE Libre
 EMPATADAS CAPACIDAD DE CARGA 7000lbs
 UNIDAD HIDRÁULICA 3HP

CARACTERÍSTICA ESPECIAL No aplica

CONDICIONES Y DIMENSIONES DE ACCESO Acceso amplia reensor repente fotográfico

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA No aplica * Puntos cantidad de llaves por rampa

TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR:

CLIENTE:	SI	NO	TECNORAMPA
FIRME DE CONCRETO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GUÍA MECÁNICA <input checked="" type="checkbox"/>
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SOLICITUDES ADICIONALES _____
ELEMENTOS ESPECIALES DE FIJACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA NO INSTALADA OTRO

ACCESORIOS EXTRAS COSTO No aplica

ACEPTO COSTO ADICIONAL _____

NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

Roa Luis Mejra
Ya instalada
 FECHA DE TÉRMINO _____ FIRMA _____

ACABADO DEL ELEVADOR

COLORES AZUL GRIS A PARTIR DE 10 EQUIPOS
 PLATAFORMA No aplica
 COLUMNAS
 OTRO Negro

OBSERVACIONES

MARTIN GARCIA

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIÓN AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.


NOTA:
 REVISÉ Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES:

CROQUIS Y DIMENSIONES

* *Revisar Plano Anexo →*

CONEXIÓN UNIDAD HIDRÁULICA

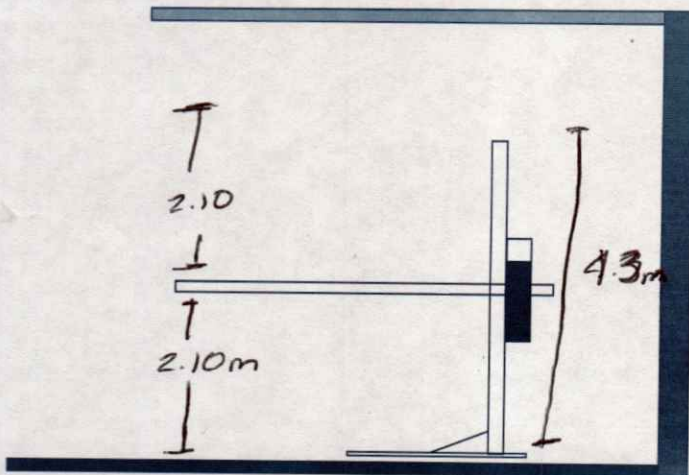

UBICACIÓN

- SOBRE PISO
- ÁREA
- EN MURO

TIPO DE CONEXIÓN
 (RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE)

- DISPARO ELÉCTRICO
- CLAVIJA MEDIO GIRO

DISTANCIA DE CABLE DE 4 X 12 3m

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO, LAS PERSONAS QUE PUEDEN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN SON:

NOTA:
 PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES SEGÚN LA PROGRAMACIÓN EN ESTE MOMENTO.

NOMBRE Carolina Hernández FIRMA [Signature]

ACEPTO Y CONOZCO LA CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A INSTALAR

[Signature]
 TECNORAMPA

[Signature]
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

VERIFICACION DE MEDIDAS EN FÍSICO

XO BO.
A SEPT/18
MARTIN PEREZ

1650
Luis A. Lopez

