

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO
Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO
TEC080710M22
Tels.: 01(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecnorampa.com.mx
0142772728119
LADA SIN COSTO:
018006230332

NOMBRE DEL CLIENTE: Hoyd Alejandro Jimenez FECHA: 8 SEP. 2020
 RAZÓN SOCIAL: MONTE DE PIEDRO
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: AV. ALCAZAR #808, COLONIA ALCAZAR BARRANCUJAS, GUADALAJARA, 44290
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____ CORREO: _____

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: WAL DE EMPEDIDO

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
 COLUMNAS LARGAS CORTAS ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
 No. PARTES OTRO COVID.

CONDICIONES PARA INGRESAR: EL ACCESO TIENE 1.25 METROS, VALIDAR SI ACCEDA EQUIPO ALIADO

DOCUMENTOS: MEJORA A LAS 7:00 AM.

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 100% HOYD 8:30 - 5:30

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: CABINA MEDIA L.V.

CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA
 CARGA CAMILLAS MEDIDA 1.10M ELEVACIÓN 1.25 mts.
 DISCAPACITADOS TIJERAS SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10M) ESTACIONES 2
 AUTOS UNDER RAMP COMPLETA 2.10M CAPACIDAD DE CARGA 500 Kg.
 UNIDAD HIDRÁULICA 2 HI.

DIMENSIÓN DE FOSO: ELEVADORES DE TIJERA, 45CM
 LARGO 1.75 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM
 ANCHO 1.50 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM
 PROFUNDIDAD .20 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.30 ANCHO 1.30

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA _____ TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR: _____

CLIENTE: SI NO
 FOSO
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS
 TECNORAMPA
 GUÍA MECÁNICA
 SOLICITUDES ADICIONALES _____

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 TUBERÍA PARED
 SI TUBERÍA DELGADA
 NO CANALETA GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 INSTALADA NO INSTALADA
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: _____
 RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA _____

NOMBRE Y FIRMA _____ FECHA DE TÉRMINO _____ FIRMA _____

ACABADO DE ELEVADOR
 COLORES: BLANCO SILVER METALLIC
 AZUL/GRIS PANTONE CÓDIGO _____
 AZUL/BLANCO ALUCOBOND COLOR
 SOLICITUD ADICIONAL: _____
 METAL DESPLEGADO CRISTAL CLARO
 LÁMINA PINTOR TINTEX
 OTRO _____ ESMERILADO

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

[Handwritten signature and stamp]
 TECNORAMPA
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOTA

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIR LOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: EL EQUIPO SE SOSTENDRÁ A ESTRUCTURA METÁLICA
EL ACCESO ES DE 1.25 METROS
MEZCLA A UN FIBRADO PARA PUNTO DE VISTA
FO PARA PUNTO DE VISTA FIBRO 10 CM. Y ALTURA 1 MORA, ACCESO 1.20 METROS.

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN


110 V

220 V
TARJETA
PASTILLA


GENERADOR



FOSO

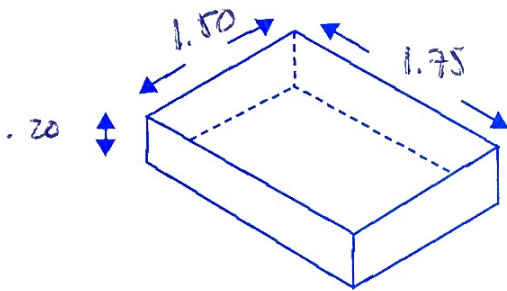

CABINA

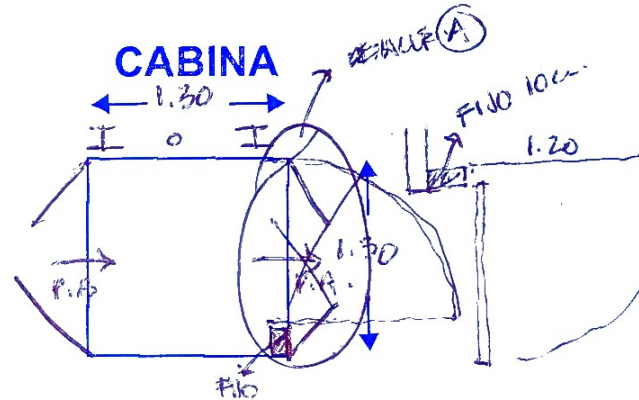

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

BOTONERAS

PEDESTAL


SOBREPUESTAS

DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 3.00 m

EMPOTRADAS

CANALIZADAS POR TECNORAMPA

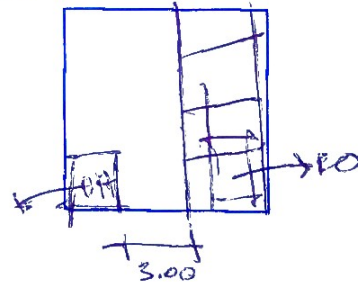

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: _____ TELÉFONO 1): _____

CONTACTO 2): _____ TELÉFONO 2): _____

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

[Signature]
TECNORAMPA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
