

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO
 TEC080710M22
 Tels.:(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecorampa.com.mx
 4272728119
 LADA SIN COSTO:
 800 623 0332

Nº 20210

NOMBRE DEL CLIENTE: BLUEBOOK FECHA: 15 Julio
 RAZÓN SOCIAL: SEIKO
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: El Realito Tuxtlá S/N.
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: Parque No.
 TELÉFONO: 663-126-16-16 CORREO: abla.cerantec@seiko.com.mx
 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: NUE CAS S/REF.

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
 COLUMNAS LARGAS CORTAS ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
 No. PARTES 2 OTRO _____
 CONDICIONES PARA INGRESAR: NM. 009.
 DOCUMENTOS: SUB. ALTA IMSS
 AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 30 %
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: _____

CLASIFICACIÓN **TIPO DE CABINA**
 CARGA CAMILLAS MEDIDA 1.10 M ELEVACIÓN 9.10m
 DISCAPACITADOS TIJERAS SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M) ESTACIONES 2
 AUTOS UNDER RAMP COMPLETA 2.10 M CAPACIDAD DE CARGA 1500 Kg
 UNIDAD HIDRÁULICA DHP
 DIMENSIÓN DE FOSO: ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM
 LARGO 270 - 220 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM
 ANCHO 270 - 280 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM
 PROFUNDIDAD 60 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO ANCHO 2.00 2.00
 NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM². ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
 COMPONENTES EXTRA NIQUELADO

TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:

CLIENTE: SI NO **TECNORAMPA**
 FOSO GUÍA MECÁNICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA SOLICITUDES ADICIONALES REVISAR
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS CABINA DIMENSIONES Y ESTRUCTURA
SOPORTE.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA **TUBERÍA** **PARED**
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA SI TUBERÍA DELGADA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA NO CANALETA GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA NO INSTALADA **RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA**
 ACCESORIOS EXTRAS COSTOS costos extra en mano de obra ADRIAN CERANTEZ
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: _____ SE DEFINIRÁ _____
 NOMBRE Y FIRMA FECHA DE TÉRMINO FIRMA

ACABADO DE ELEVADOR

COLORES POR DEFINIR. **CRISTAL**
 BLANCO SILVER METALLIC METAL DESPLEGADO CLARO
 AZUL/GRIS PANTONE LÁMINA PINTOR TINTEX
 AZUL/BLANCO ALUCOBOND COLOR OTRO ESMERILADO
 SOLICITUD ADICIONAL: lamina perforada

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

TECNORAMPA NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOTA

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.



NOTA

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: SE DEFINIRÁ el soporte estructural del diente.
POR DEFINIR LA ESTRUCTURA POR FUERA DEL FOSO
Color de EJE. POR DEFINIR Color de CABINA A REF. FOSO mancañ señales para chapa magnética y único en cuartos de cliente
POR DEFINIR DIMENSIONES

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN
110 V 220 V GENERADOR

*PTE SANIDA Alto Actualizado POR SEICA

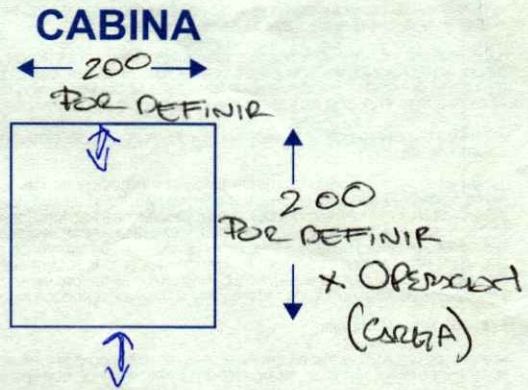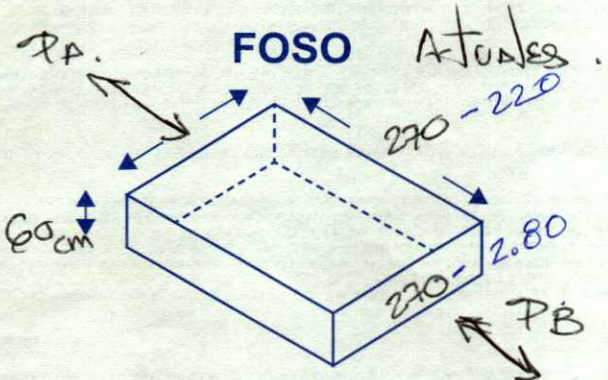

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

BOTONERAS

- PEDESTAL
- SOBREPUESTAS
- DISTANCIA APROXIMADA
- ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 4mts.
- EMPOTRADAS
- CANALIZADAS POR TECNORAMPA

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

Proyecto ADOLF CERDAS

NOTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: _____ TELÉFONO 1): _____
CONTACTO 2): _____ TELÉFONO 2): _____

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

[Signature]
TECNORAMPA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
