



DIRECCION:
AUTOPISTA
MEXICO-QUERETARO
KM 175+494 COLONIA
EL SAUZ BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

EQUIPO: ARMADO

COLUMNAS: COMPLETAS

DIMENSIONES DE VANO:

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

ELEVADOR CARGA - SEMICOMPLETA

CARGA 500 KG

RECORRIDO: 3.80M

ESTACIONES: 2

UNIDAD HIDRÁULICA: 2HP

COLOR DEL EQUIPO

EQUIPO: SILVER METALLIC

ACABADOS ALOCUBOND (DOBLE VISTA)
LAMINA ANTIDERRAPANTE

TIPO DE ALIMENTACION

MONOFASICA 110 VAC

TUBERÍA - GRUESA

COMPLEMENTOS

- BOTONERAS EMPOTRADAS
- DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y U.H. 5.00M
- PROPUESTA DE MOTOR Y TABLERO EN HORIZONTAL
- CONTEMPLAR MANGUERA 2.00M PARA PASO EN ELEVADOR
- GENERADOR
- BOTONERA DENTRO DE CABINA LATERAL IZQ.
(TOMANDO REFERENCIA EL ACCESO)


VENDEDOR: ARQ. ANTONIO BENITEZ CRUZ


RAZON SOCIAL: ECO PARAÍSO S.A. DE C.V.

NO. DE CLIENTE: 23043-19628

FECHA: 04/08/2022

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

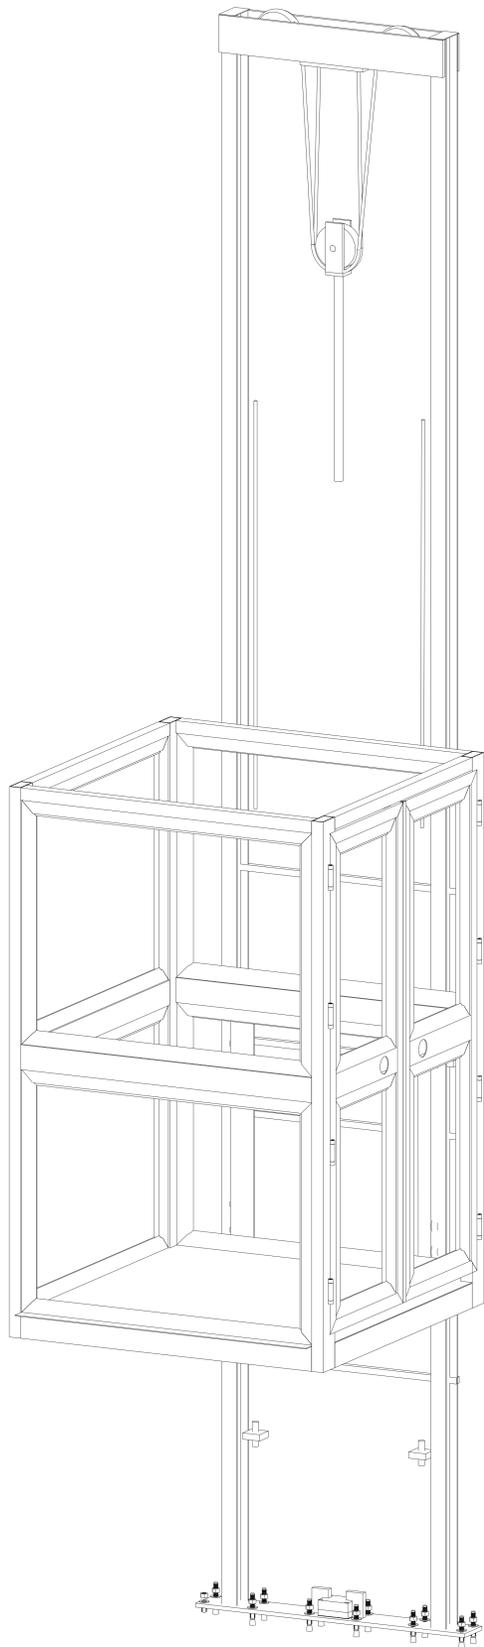

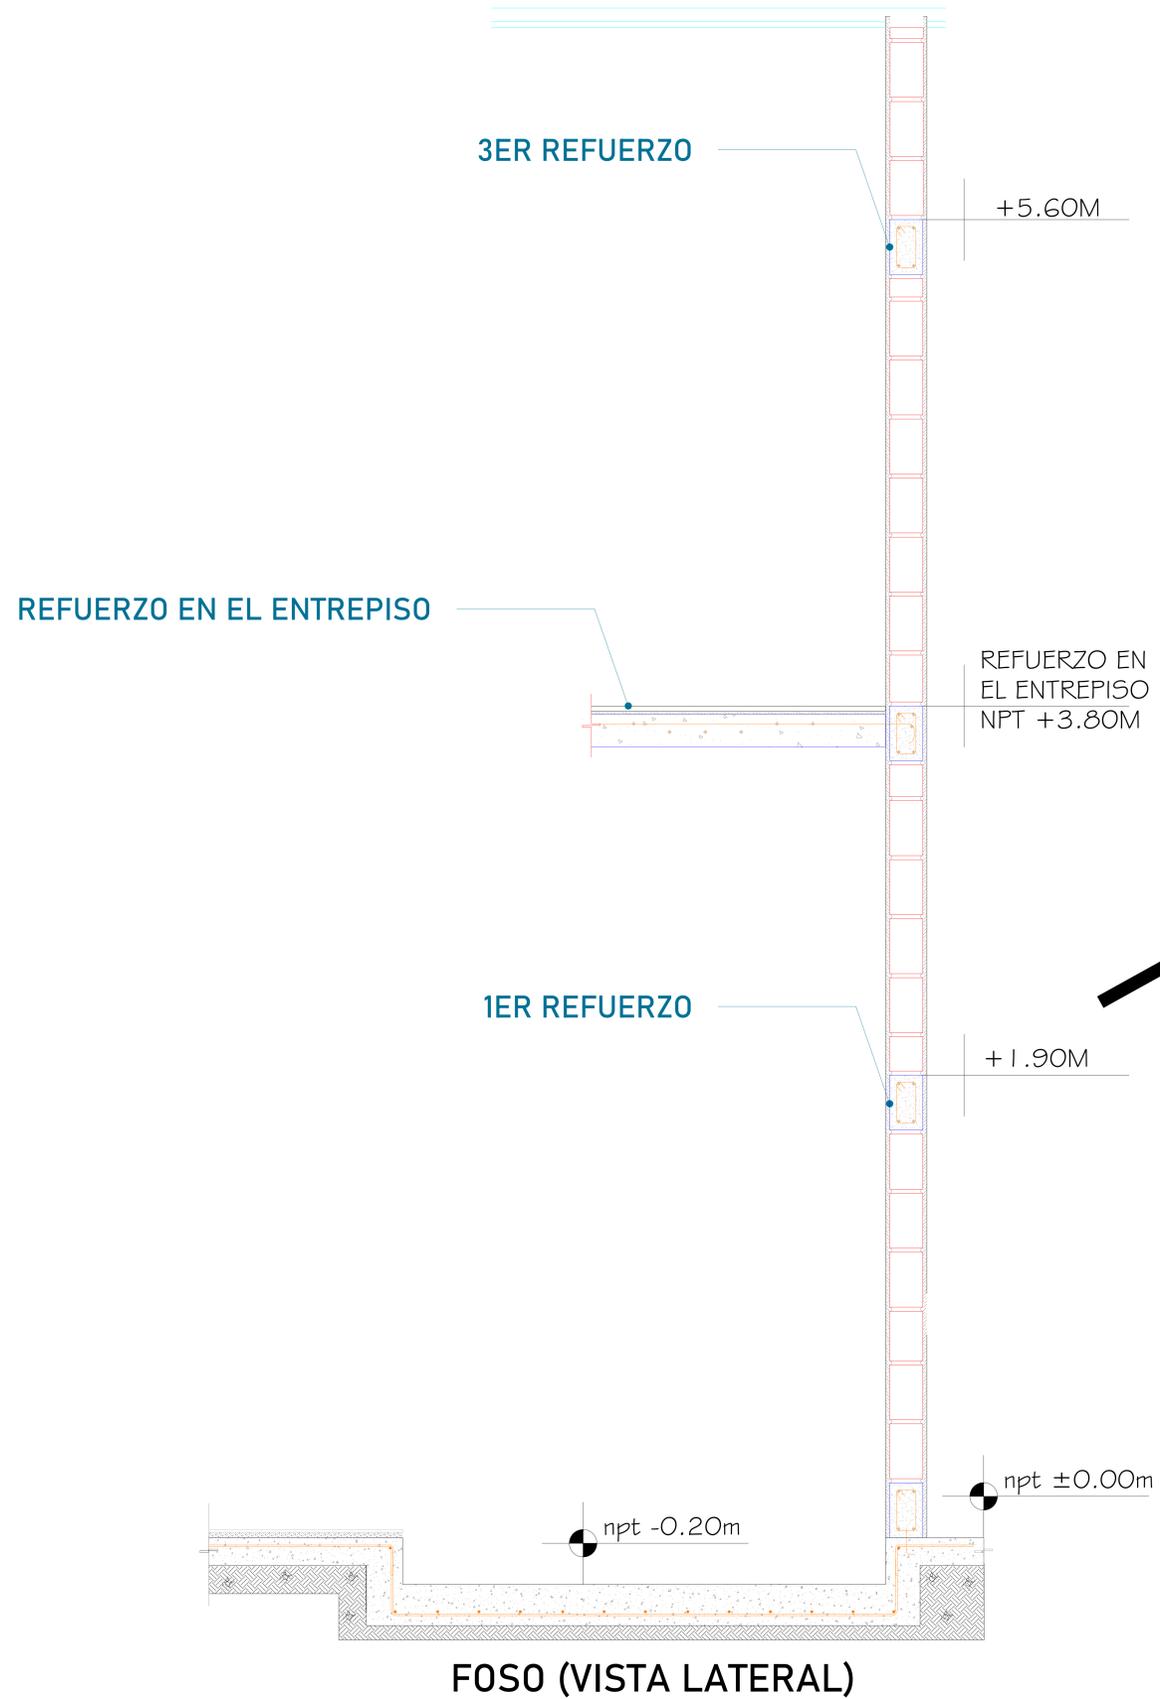

Para la estabilidad del equipo Tecnorampa debera ser anclado aun cierto numero de refuerzos estos serán de acuerdo al recorrido del equipo y a los distintos niveles que se tengan.

Para anclar se solicita una cadena de concreto ($f'c=250 \text{ kg/cm}^2$) o una viga de acero, ambas minimo de 15 cm.

En la ultima estación nuestras columnas tienen un sobrepaso de 1.80m por lo tanto se solicita un refuerzo a esa altura.

Las columnas del equipo Tecnorampa se ligan a distintas alturas por eso se solicitan los refuerzos, estos son puestos por el cliente.


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:



UBICACION

Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	FECHA	FECHA

EMPRESA: **TecnoRampa**

RAZÓN SOCIAL: **NOMBRE DEL CLIENTE**

VOBO: VENDEDOR:

FECHA: ELEVADOR:

PLANO: **ANLAJE DEL ELEVADOR** CLAVEL: **A-4**

